




Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

4º BIMESTRE DE 2022

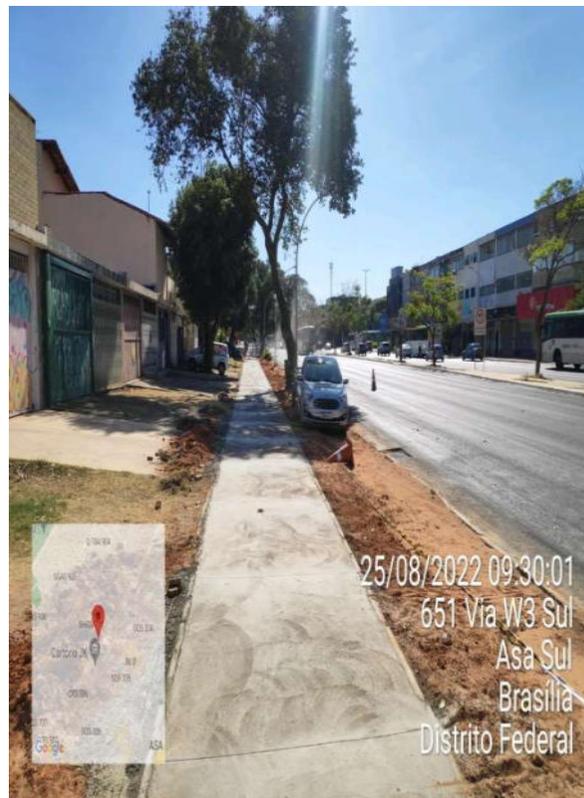

Fonte: Relatório de Desempenho Físico Financeiro por Programa de Trabalho – Anexo I, págs. 395 a 415, publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG_4oBim.pdf).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		14.872.475	0	13.504.369	13.504.369	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.888.307	14.872.475	71	13.504.369	13.504.369	91			
04.122.8209.8502.0092		B		14.872.475	0	13.504.369	13.504.369	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.888.307	14.872.475	71	13.504.369	13.504.369	91			▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00; mar: 183,00; abr: 181,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 182,00; ago: 176,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190											
04.122.8209.8504	F	B		647.803	0	590.549	590.549	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	909.835	647.803	71	590.549	590.549	91			
04.122.8209.8504.7003		B		647.803	0	590.549	590.549	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	909.835	647.803	71	590.549	590.549	91			▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00; mar: 163,00; abr: 159,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 157,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190											
04.122.8209.8517	F	B		1.687.886	0	878.256	477.634	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.600.282	1.687.886	105	878.256	477.634	28			
04.122.8209.8517.0091		B		1.687.886	0	878.256	477.634	28			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.600.282	1.687.886	105	878.256	477.634	28	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00110-000000137/2021-13, 00110-000000485/2022-71, 00110-0000003872/2017-01, 00110-000000920/2022-68, 00112-0000001248/2022-71, 00110-000000840/2022-11, 00112-0000001241/2022-50, 00110-0000001543/2022-84 e 00110-0000001543/2022-84.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.126.8209.1471	F	B		500.000	0	493.050	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	500.000	100	493.050	0	0			
04.126.8209.1471.0033		B		500.000	0	493.050	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	493.050	0	0	▶ 0040-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Bens adquiridos: Aquisição de 95 (noventa e cinco) Microcomputadores . Processo nº 00110-0000002344/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.126.8209.2557	F	B		191.775	0	81.562	37.398	20			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	250.000	191.775	77	81.562	37.398	20			
04.126.8209.2557.2570		B		191.775	0	81.562	37.398	20			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	191.775	77	81.562	37.398	20	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, Prestação de serviços com suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva e atualização do software, Aquisição de 40 (quarenta) SSD de 2,5 polegadas, aquisição de Memória RAM de 4GB. Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84, 00110-0000000698/2022-01 e 00110-00002270/2022-95. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
04.128.8209.4088	F	B		37.638	0	30.750	30.750	82			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	37.638	75	30.750	30.750	82			
04.128.8209.4088.0066		B		37.638	0	30.750	30.750	82			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	37.638	75	30.750	30.750	82	▶ 0041-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Capacitação de 09 (nove) servidores no Curso On-Line sobre "Planejamento e Gestão de Obras", Inscrição de 11 (onze) servidores no curso "Plataforma + Brasil um Novo Paradigma nas Transferências Voluntárias da União". [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo: nº 00110-0000001092/2022-85, 00110-00000923/2022-00.		
15.451.6206.1950	F	B		777.292	0	770.354	326.408	42			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	10.000	777.292	7.773	770.354	326.408	42			
15.451.6206.1950.1040		B		777.292	0	770.354	326.408	42			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	777.292	7.773	770.354	326.408	42	▶ 0005-Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas. ▶ ▶ Realizado no período: grama (3.318m²), calçadas de concreto armado (1.964m²), pergolado metálico (2unid.), bancos de concreto (24 unid.), plantio de árvore ornamental (46unid.), paraciclo tubular em aço (12unid.), alambrando com tubo de aço (100m²) e lixeira dupla em aço (16unid.). Acumulado: limpeza do terreno (5.054m²), demarcação das calçadas (1.400m²) e compactação do solo (1.964m²). Executado: 100% dos serviços. CT.: 002/2022 (LOS AG) - Proc.: 00110-00002646/2021-81. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7.000,00] m².		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 13											
15.451.6208.1968	F	B		2.316.306	0	1.903.700	592.020	26			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.300.000	2.316.306	44	1.903.700	592.020	26			
15.451.6208.1968.0018		B		2.316.306	0	1.903.700	592.020	26			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.300.000	2.316.306	44	1.903.700	592.020	26	▶ 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: Concluído tendo em vista a celebração de novo Contrato (nº 010/2022) que contempla a prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK) dentre outros serviços. 89853602 89888207. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade. ▶ 0007-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0008/2021). ▶ ▶ Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 2											



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		62.043.858	0	28.171.028	7.534.352	12			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	54.824.743	62.043.858	113	28.171.028	7.534.352	12			
15.451.6209.1110.0147		B		62.043.858	0	28.171.028	7.534.352	12			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 118515		A	54.824.743	62.043.858	113	28.171.028	7.534.352	12	<p>▶ 0008-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (23.540m²), pavimentação concreto/estacionamento (3.200m²), paisagismo (55unid.), restauração pavimento flexível (1.718m²) e drenagem (750m). Acumulado: demolições/ retiradas/ remanejamentos (69.734m²), pavimentação concreto/estacionamento (50.702m²), paisagismo (105unid.), restauração pavimento flexível (1.718m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (1.050m). Executado: 51,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0070-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.</p> <p>▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 49, de 14/03/2022, p. 63; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58 e no DODF nº 84, de 06/05/2022, pp. 86 e 87. Despesa do Contrato nº 011/2019 (obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA). Processos: 00110-000000498/2022-41, 00110-0000003391/2021-73, 00110-0000003464/2021-27, 00110-0000003426/2019-50 e 110.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0077-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: instalação de canteiro de obras. CT.: 020/2022 (CM) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0078-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: demolição de calçadas (27m³) e demolição de meios-fios (10m³). Executado: 5,07% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1948	F	B		37.472.036	0	2.777.276	936.649	2			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	38.783.987	37.472.036	97	2.777.276	936.649	2			
15.451.6209.1948.0004		B		37.472.036	0	2.777.276	936.649	2			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA		A	38.783.987	37.472.036	97	2.777.276	936.649	2	▶ 0009-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote1).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Realizado no período: Estudos Preliminares (10%). Acumulado: Plano de Trabalho (100%). Executado: 20% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6209.3023	F	B		188.318.387	0	45.793.286	21.783.953	2			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	189.230.452	188.318.387	100	45.793.286	21.783.953	2			
15.451.6209.3023.0073		B		50.895.992	0	4.659.308	1.244.984	2	▶ 0010-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote2).		
									▶ ▶ Realizado no período: Estudos Preliminares (10%). Acumulado: Plano de Trabalho (100%). Executado: 20% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	51.028.000	50.895.992	100	4.659.308	1.244.984	2	▶ 0050-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS). ▶ ▶ Realizado no período - bacia de detenção 10: manta geotêxtil (4.050m²); bacia de detenção 11: escavação (4.650m³). Acumulado: bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta geotêxtil (10.655m²) e geogrelha bidirecional (6.604m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid.). Executado: 25,80% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83 69303230 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6209.3023.0077		B		137.422.395	0	41.133.978	20.538.969	15			
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	138.202.452	137.422.395	99	41.133.978	20.538.969	15	▶ 0011-Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid.), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade. ▶ 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado em 2022: sinalização (308m²). Executado até 2022: 49,50% dos serviços. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-fios (4.038m), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

15.451.6209.3058	F	B	17.077.979	0	400.000	267.445	2	<p>► 0013-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: pavimentação (6.049m²), passeios e rampas (866m²), escavações (2.637m³), drenagem (96m) e meios-fios (1.465m). Acumulado até 2022: pavimentação (212.788m²), passeios e rampas (57.340m²), escavações (265.464m³), drenagem (20.017m) e meios-fios (44.398m). Executado até 2022: 86,00% dos serviços. Realizado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), drenagem (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0014-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0082/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: terraplenagem (12.000m²), demolição de pavimento (1.980m³), pavimentação (13.192m²), meios-fios (4.190m) e drenagem (3.610m). Acumulado até 2022: terraplenagem (26.097m²), demolição de pavimento (32.284m³), pavimentação (55.904m²), passeios (12.703m²), meios-fios (15.122m), drenagem (9.572m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 58,00% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (1.997m²), demolição de pavimento (13.976m³), pavimentação (24.390m²), passeios (1.172m²), meios-fios (7.149m) e drenagem (790m). Executado em 2021: 12,50% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0037-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51; no DODF nº 37, de 22/02/2022, p. 81; no DODF nº 52, de 17/03/2022, p. 63; no DODF nº 134, de 19/07/2022, p. 37 e no DODF nº 165, de 31/08/2022, p. 67. Despesas dos Contratos: nº 020/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires), nº 021/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires), nº 014/2020 (Prestação de serviços geotécnicos) e nº 019/2021 (Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires); e pagamento de Devolução de Recurso referente ao Convênio nº 042/2019 (complementação de urbanização em Vicente Pires). Processos: 00110-000000051/2022-71, 00110-000000301/2022-73, 110.000.206/2014, 00110-00001511/2018-01, 00110-00000327/2022-11, 00110-0000053/2021-80 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
------------------	---	---	------------	---	---------	---------	---	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	17.281.000	17.077.979	99	400.000	267.445	2			
15.451.6209.3058.0002		B		17.077.979	0	400.000	267.445	2			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	17.281.000	17.077.979	99	400.000	267.445	2			▶ 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472											▶▶ Realizado no período: 20% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 10% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 40% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Executado até 2022: 60% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110- 0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.451.6209.3089	F	B		15.928.175	0	12.987.718	1.090.977	7			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	2.400.000	15.928.175	664	12.987.718	1.090.977	7			
15.451.6209.3089.0002		B		15.928.175	0	12.987.718	1.090.977	7			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5041		A	2.400.000	15.928.175	664	12.987.718	1.090.977	7	<p>▶ 0019-Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: piso placas 40x40 (160m²), piso de concreto armado (3.70m²) e passeios (3.957m²). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m²), piso de concreto armado (80m²) e passeios (5.773m²). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m²), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (4.432m²), passeios (1.816m²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m²</p> <p>▶ 0068-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: calçadas não armadas (3.225m²). Acumulado: meios-fios (73m) e calçadas não armadas (6.112m²). Executado: 53,93% dos serviços. CT.: 007/2022 (WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0069-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul.</p> <p>▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55. Despesas do Contrato nº 011/2021 (Revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul) e do Contrato nº 022/2020 (Revitalização das quadras 513 e 514 da W3 Sul). Processos: 00110-0000000323/2022-33 e 00110-0000003368/2021-89. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0079-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul.</p> <p>▶ ▶ Executado no período: início da mobilização de equipe. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	
15.451.6209.3856	F	B		7.469.010	0	7.465.282	3.627.032	49		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	5.551.143	7.469.010	135	7.465.282	3.627.032	49			
15.451.6209.3856.0001		B		7.469.010	0	7.465.282	3.627.032	49			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL		A	5.551.143	7.469.010	135	7.465.282	3.627.032	49	▶ 0020-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Realizado no período: Relatório 19 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2022: 19 Relatórios (atividades executadas no mês). Executado até 2022: 76% dos serviços. Realizado até 2021: 14 Relatórios (atividades executadas no mês) e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
									▶ 0021-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).		
									▶ ▶ Realizado no período: relatório de andamento 12. Acumulado até 2022: 12 relatórios de andamento. Executado até 2022: 80,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial e relatórios de andamento 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-000002215/2019-08. Obs.: o percentual de execução dos serviços foi reduziu de 92% para 80% devido celebração de aditivo contratual, 94737394. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
									▶ 0022-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).		
									▶ ▶ Realizado no período: relatórios 07 e 08 de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 08 relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2022: 53,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
									▶ 0073-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.		
									▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 86, de 10/05/2022, p. 114; no DODF		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

15.752.6209.1836	F	B		8.122.731	0	8.000.000	106.652	1	<p>nº 100, de 30/05/2022, pp. 79 e 80; no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53 e no DODF nº 132, de 15/07/2022, p. 93. Despesas dos Contratos: nº 004/2010 (Gerenciamento e supervisão para construção da Torre de TV Digital); nº 018/2021 (Supervisão para implantação do Viaduto EPIG), nº 018/2020 (Supervisão e Acompanhamento para implantação da Obra do Túnel de Taguatinga) e nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00000-0112003494/2009-00, 00110-000000253/2022-13, 00110-000000318/2022-21, 00110-0000003352/2021-7, 00110-000000500/2022-81, 00110-0000003352/2021-76 e 00110-00001860/2022-09. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0076-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).</p> <p>► ► Realizado no período: elaboração de relatório inicial. CT.: 019/2022 (CM) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.716.886	8.122.731	473	8.000.000	106.652	1	
15.752.6209.1836.0023		B		8.122.731	0	8.000.000	106.652	1	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	1.716.886	8.122.731	473	8.000.000	106.652	1	<p>▶ 0023-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.:003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82607697. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0024-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0028/2021).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Convênio nº 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do convênio devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (convênio atingindo 60 meses de execução). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82609139. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>▶ 0083-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 06 projetos da Etapa 1. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	
15.752.6209.8507	F	B		91.912.158	0	80.791.285	71.935.387	78		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	16.886	91.912.158	544.326	80.791.285	71.935.387	78		
15.752.6209.8507.6471		B		91.912.158	0	80.791.285	71.935.387	78		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.886	91.912.158	544.326	80.791.285	71.935.387	78	▶ 0058-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 308.087,00; mai: 308.088,00; jun: 308.107,00; jul: 308.119,00; ago: 308.179,00] e efficientização de 9.292 luminárias (sendo 5.071 no período) - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. ▶ 0059-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.644.737,00; abr: 27.724.999,00; mai: 33.598.781,00; jun: 32.641.051,00; jul: 33.721.155,00; ago: 33.777.733,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.		
15.782.6216.3054	F	B		199.164.874	0	112.728.512	70.297.345	35			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	91.287.880	199.164.874	218	112.728.512	70.297.345	35			
15.782.6216.3054.0002		B		199.164.874	0	112.728.512	70.297.345	35			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	R E G
(**) (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	91.287.880	199.164.874	218	112.728.512	70.297.345	35	<p>► 0025-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0032/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) finalizado. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: O Produto Final referente ao EIV foi aprovado pela CPA/EIV, por meio do Parecer Técnico n.º 51/2022 - SEDUH/GAB/CPA-EIV (87230808), 89506646. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p> <p>► 0026-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021).</p> <p>► ► Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (1.117m³), aço CA50 (149.779kg), forma (1.859m²), cimbramento (8.875m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (416m³) e Fck 30Mpa (2.040m³), aço CA50 (172.715kg), pavimento rígido (345kg); barreira New Jersey: concreto Fck 30Mpa (192m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (40m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (21m³). Realizado até 2022: vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.247m³), aço CA50 (2.325.429kg), forma (49.531m²), cimbramento (147.707m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (2.194m³) e Fck 30Mpa (10.377m³), aço CA50 (618.427kg), pavim. rígido (2.247kg); barreira New Jersey: concreto Fck 30Mpa (597m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (161m³); superestrutura-lajes: concreto FCK 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg). Executado até 2022: 68,00% dos serviços. CT.: 004/2016 (AC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0038-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67; no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48; no DODF nº 49, de 14/03/2022, pp. 63 e 64; no DODF nº 57, de 24/03/2022, p. 69; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58; no DODF nº 69, de 11/04/2020, p. 73; no DODF nº 100, de 30/05/2022, p. 79 e no DODF nº 119, de 28/06/2022, p. 65. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00001676/2020-99, 00110-00002424/2020-87, 00110-0000000351/2022-51, 00110-0000003320/2021-71, 00110-0000002776/2020-32, 00110-000000101/2021-30 e 00110-0000000898/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.812.6206.1079	F	B		1.850.166	0	1.308	1.308	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.870.078	1.850.166	99	1.308	1.308	0			
15.812.6206.1079.0004		B		1.850.166	0	1.308	1.308	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.870.078	1.850.166	99	1.308	1.308	0			▶ 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de campo de grama sintética.
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8404											▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesas do Contrato nº 016/2021 (Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto). Processos: 00110-000003519/2021-07 e 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.812.6206.3048	F	B		2.367.018	0	1.060.326	390.518	16			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.500.000	2.367.018	158	1.060.326	390.518	16			
15.812.6206.3048.0012		B		2.367.018	0	1.060.326	390.518	16			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.367.018	158	1.060.326	390.518	16	▶ 0032-Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021). ▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-0000000391/2018-16. Obs.: Concluído com 82,52% dos serviços devido a impossibilidade orçamentaria e limitação do percentual do aditivo financeiro. Espaço esportivo reformado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27.000,00] m². ▶ 0072-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reforma de espaços esportivos. ▶ ▶ Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72 e no DODF nº 80, de 02/05/2022, p. 73. Despesas do Contrato nº 020/2020 (reforma de espaços poliesportivos no parque Dona Sara Kubitschek). Processos: 00110-0000000242/2022-33 e 00110-0000000391/2018-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 271											
17.512.6209.3855	F	B		155.262	0	40.877	40.877	26			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	155.262	78	40.877	40.877	26			
17.512.6209.3855.0001		B		155.262	0	40.877	40.877	26			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	155.262	78	40.877	40.877	26	▶ 0033-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Realizado no período - pagamentos de 4 taxas de análise de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para obras no Parque do Cortado, na Avenida Hélio Prates e no Sol Nascente. Realizações anteriores - pagamentos de taxas/tarifas para: obtenção de 3 Autorizações de Supressão Vegetal (ASV) para a bacia de drenagem do Trecho 16 - Corredor Eixo Oeste, para o Trecho Eixos 2 e 8 da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), para instalação do viaduto da EPIG e 1 Análise de processo visando ASV para a obra viária ESPM; obtenção de 2 Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) para a duplicação da Via DF460 - Boca da Mata e para a pavimentação da Via de ligação CAUB I - II; obtenção de 2 Compensações Ambientais referentes à supressão vegetal da obra da Estrada Setor policial Militar (ESPM). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		247.774	0	247.773	247.773	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	300.000	247.774	83	247.773	247.773	100			
28.846.0001.9041.0021		B		247.774	0	247.773	247.773	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	247.774	83	247.773	247.773	100	▶ 0034-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 7,00; ago: 8,00]. Processo nº 00110-0000000731/2022-95.00110-00000414/2022-79 e 00110-00001067/2022-00 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		585.976	0	120.719	120.719	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	823.000	585.976	71	120.719	120.719	21			
28.846.0001.9050.0073		B		585.976	0	120.719	120.719	21			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	823.000	585.976	71	120.719	120.719	21	▶ 0067-Pagar indenizações/ restituições.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 3,00; mai: 9,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 0,00]. Processo: nº 00110-000000681/2022-46, 00110-00001066/2022-57 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		424.801	0	150.432	150.432	35			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	185.499	424.801	229	150.432	150.432	35			
28.846.0001.9093.0032		B		424.801	0	150.432	150.432	35			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	185.499	424.801	229	150.432	150.432	35	▶ 0035-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 13,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 18,00; jul: 21,00; ago: 21,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.		
