




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

4º BIMESTRE 2023

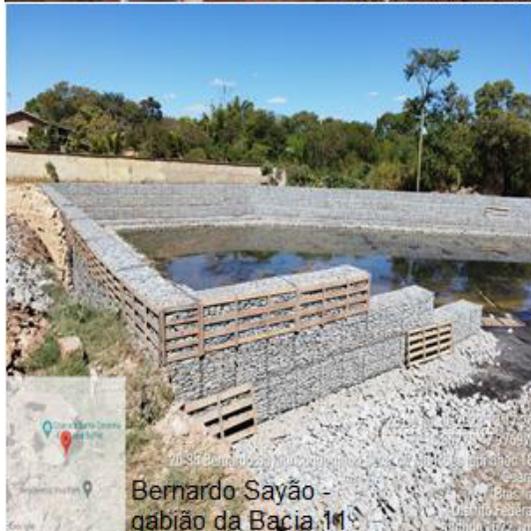



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		14.980.669	0	14.424.236	14.424.236	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	14.980.669	73	14.424.236	14.424.236	96			
04.122.8209.8502.0092		B		14.980.669	0	14.424.236	14.424.236	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.634.024	14.980.669	73	14.424.236	14.424.236	96	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00; jul: 175,00; ago: 178,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		869.902	0	753.309	753.309	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	869.902	71	753.309	753.309	87			
04.122.8209.8504.7003		B		869.902	0	753.309	753.309	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.233.210	869.902	71	753.309	753.309	87	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00; jul: 168,00; ago: 160,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		1.173.002	0	441.379	291.950	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	1.173.002	52	441.379	291.950	25			
04.122.8209.8517.0091		B		1.173.002	0	441.379	291.950	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.245.836	1.173.002	52	441.379	291.950	25	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos nºs: 00110- 00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110- 00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110- 00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110- 00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99, 00110- 00000996/2023-74 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		195.358	0	84.210	38.162	20			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	195.358	53	84.210	38.162	20			
04.126.8209.2557.2570		B		195.358	0	84.210	38.162	20			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	366.851	195.358	53	84.210	38.162	20	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016, 00110-000733/2023-65 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.128.8209.4088	F	B		81.657	0	1.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	81.657	68	1.500	0	0			
04.128.8209.4088.0066		B		81.657	0	1.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	81.657	68	1.500	0	0			► 0045-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2											► ► Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00110-00001170/2023-22.
15.451.6206.1950	F	B		118.089	0	106.783	106.783	90			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.500	118.089	814	106.783	106.783	90			
15.451.6206.1950.1040		B		118.089	0	106.783	106.783	90			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	14.500	118.089	814	106.783	106.783	90			► 0048-Construir praças públicas e parques.
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 18											► ► Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
15.451.6208.1968	F	B		1.654.631	0	1.227.000	340.394	21			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	1.654.631	56	1.227.000	340.394	21			
15.451.6208.1968.0018		B		1.654.631	0	1.227.000	340.394	21			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	1.654.631	56	1.227.000	340.394	21	<p>▶ 0005-Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.</p> <p>▶ 0078-Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 30% dos serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 100% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 100% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0087-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período - Lote 1: mobilização/desmobilização/deslocamento, sondagens (Trato e Percussão), janelas de inspeção (JI), ensaios de caracterização dos solos e ensaio de classificação MCT/HRB; Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de dosagens solo-cal, ensaio de dosagem solo-cimento e Laudo Técnico/ART. Executado: 20,01% dos serviços. CT.: 016/2023 (PFO MGR) - Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		59.599.320	0	30.090.765	9.342.915	16			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	60.571.458	59.599.320	98	30.090.765	9.342.915	16			
15.451.6209.1110.0147		B		59.599.320	0	30.090.765	9.342.915	16			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	60.571.458	59.599.320	98	30.090.765	9.342.915	16			
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 220772											<p>▶ 0006-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: demolições/ retiradas/ remanejamentos (5.976m²), restauração pavimento flexível (6.874m²) e sinalização viária (1.075m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m²), restauração pavimento flexível (33.466m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (2.587m²). Executado até 2023: 85,00% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0007-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: regularização de subleito/ lastro de brita (202m²), assentamento meios-fios (42m), assentamento de cordão de concreto (196m) e concretagem de calçada (1.484m²). Acumulado até 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (5.184m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.359m), assentamento de cordão de concreto (1.383m) e concretagem de calçada (5.805m²). Executado até 2023: 56,70% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (RJH) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0008-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: calçadas (118m²), rampa de acesso</p>



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S T	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	68.234.326	68.148.918	100	45.920.892	3.265.035	5	<p>▶ 0014-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período - bacia de detenção 11: dispositivo de saída (1unid.), lastro de fundo da lagoa (730m³), gabião (1.119m³) e proteção de canal em gabião (425m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipador de entrada (1unid.), dispositivo de saída (1unid.), gabião (944m³), proteção de canal em gabião (916m²) e alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²) e manta (5.267m²). Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção de canal em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador de entrada (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0015-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: finalização da instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0055-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: drenagem (192m). Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (375m). Executado: 3,21% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0076-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3023.0077		B		119.833.750	0	42.104.843	11.969.484	10			



<p>(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1</p>	A	134.982.497	119.833.750	89	42.104.843	11.969.484	10	<p>► 0016-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0013/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: terraplenagem (2.450m²), pavimentação (1.899m²), escavações (2.004m³), drenagem (251m) e meios-fios (519m). Acumulado até 2023: terraplenagem (222.974m²), pavimentação (227.068m²), escavações (277.317m³), drenagem (21.127m) e meios-fios (45.833m). Executado até 2023: 96,95% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0017-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: terraplenagem (5.500m²), demolição de pavimento (3.134m³), pavimentação (14.420m²), passeios (345m²), meios-fios (821m), drenagem (2.450m) e sinalização (1.850m²). Acumulado até 2023: terraplenagem (40.819m²), demolição de pavimento (46.430m³), pavimentação (110.205m²), passeios (36.059m²), meios-fios (34.987m), drenagem (28.026m) e sinalização (2.857m²). Executado até 2023: 89,90% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0074-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/23, p. 98; no DODF nº 58 de 24/03/23, pp. 61 e 62; no DODF nº 118, de 26/06/23, p. 76; no DODF nº 145, de 02/08/23, p. 61 e no DODF nº 155, de 16/08/2023, p. 60. Despesas dos Contratos nºs: 019/2016, 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires). Processos: 00110-00001964/2020-43, 00110-00002726/2021-36, 00110-00002723/2021-01, 00110-000002728/2021-25, 00112-00023252/2018-12, 00112-00025951/2018-99 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0080-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.</p> <p>► ► Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (AC FAM). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>
---	---	-------------	-------------	----	------------	------------	----	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3058	F	B		102.845.710	0	44.347.580	19.054.195	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	102.845.710	100	44.347.580	19.054.195	0			
15.451.6209.3058.0002		B		17.626.277	0	220.933	50.933	0			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	17.639.347	17.626.277	100	220.933	50.933	0			▶ 0018-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472											▶ ▶ Realizado no período: 10% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 60% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 90% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
15.451.6209.3058.0003		B		85.219.432	0	44.126.647	19.003.262	22			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	71.671.107	85.219.432	119	44.126.647	19.003.262	22			▶ 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283											▶ ▶ Não houve medição, obra em fase de recebimento provisório. Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
											▶ 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3089	F	B		18.349.419	0	6.958.097	2.964.767	16			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	6.958.097	2.964.767	16			
15.451.6209.3089.0002		B		18.349.419	0	6.958.097	2.964.767	16			
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 23495		A	18.349.419	18.349.419	100	6.958.097	2.964.767	16	▶ 0023-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022). ▶ ▶ Realizado no período: piso intertravado (2.382m²). Executado até 2023: 82,08% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obs.: As quantidades informadas são estimadas e poderão ser ajustadas no bimestre seguinte, 122341543. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. ▶ 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022). ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido (5.827m²), pavimento flexível (1.880m²) e meios-fios (1.200m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (11.194m²), pavimento flexível (2.540m²) e meios-fios (1.775m). Executado até 2023: 15% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
15.451.6209.3856	F	B		8.317.090	0	7.717.322	1.669.096	20			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	8.317.090	111	7.717.322	1.669.096	20			
15.451.6209.3856.0001		B		8.317.090	0	7.717.322	1.669.096	20			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)		A	7.500.000	8.317.090	111	7.717.322	1.669.096	20	▶ 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022). ▶ ▶ Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Quantidade: 6

no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0026-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).

► ► Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.

► 0027-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).

► ► Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0028-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).

► ► Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2023: 12 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 11 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 24,87% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].

► 0058-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).

► ► Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (44diárias), equipe 2 (44diárias), equipe 3 (44diárias) e equipe 4 (44diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (98diárias), equipe 2 (123diárias), equipe 3 (93diárias) e equipe 4 (54diárias). Executado: 30,66% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan:



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

									0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
									► 0077-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.
									► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
									► 0083-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.
									► ► Realizado no período: sondagem (50m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (40 unid.), viga benkelman (280m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (70unid.). Acumulado: sondagem (335m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (86unid.). Executado: 2,00% dos serviços. CT.: 008/2023 (DLM MCV) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
15.752.6209.1836	F	B		11.947.675	0	9.193.128	1.875.599	16	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	11.947.675	398	9.193.128	1.875.599	16	
15.752.6209.1836.0023		B		11.947.675	0	9.193.128	1.875.599	16	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	11.947.675	398	9.193.128	1.875.599	16	► 0029-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Realizado no período: 14 projetos (sendo: 10 da etapa 1 e 4 da etapa 2), implantação de 333 pontos de iluminação e instalação de 538 luminárias. Acumulado em 2023: 22 projetos (sendo: 14 da etapa 1 e 8 da etapa 2), implantação de 478 pontos de iluminação e instalação de 784 luminárias. Total até 2023: 54 projetos (sendo: 32 da etapa 1 e 22 da etapa 2), implantação de 1.046 pontos de iluminação e instalação de 1.411 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00; jul: 187,00; ago: 146,00] unidades.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.3205	F	B		267.655	0	250.000	0	0			
REMANEJAMENTO DE REDE		A	10.000	267.655	2.677	250.000	0	0			
15.752.6209.3205.0001		B		267.655	0	250.000	0	0			
REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	10.000	267.655	2.677	250.000	0	0	▶ 0063-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. ▶▶ Realizado no período: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.) e lançamento de cabos (250m). Executado: 40% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
15.752.6209.8507	F	B		177.772.493	0	156.472.491	146.831.700	83			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	177.772.493	107	156.472.491	146.831.700	83			
15.752.6209.8507.6471		B		177.772.493	0	156.472.491	146.831.700	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	165.394.691	177.772.493	107	156.472.491	146.831.700	83	<p>► 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.</p> <p>► ► Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00] e eficientização de 3.182 luminárias no período. Acumulado: 16.245 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.</p> <p>► 0031-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p> <p>► ► Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.</p> <p>► 0032-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110- 00000054/2023-96, 00110- 00000458/2023-80, 00110- 00000141/2023-43, 00110- 00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0079-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p> <p>► ► Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00; jul: 32.769.228,00; ago: 32.662.731,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.</p>	
15.782.6216.3054	F	B		121.325.529	0	60.751.974	40.880.448	34		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	84.292.721	121.325.529	144	60.751.974	40.880.448	34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.782.6216.3054.0002		B		121.325.529	0	60.751.974	40.880.448	34			
(*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	84.292.721	121.325.529	144	60.751.974	40.880.448	34	▶ 0033-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0026/2022). ▶ ▶ Realizado - instalações elétricas, ventilação/exaustão, combate a incêndio; vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 88,17% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Serviços estimados c/base em projeto básico, as quantidades não utilizadas serão suprimidas em aditivo contratual. 121602358. Túnel [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade. ▶ 0075-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga. ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74; no DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58; no DODF nº 133, de 17/07/2023, pp. 145 e 146; no DODF nº 134, de 18/07/2023, pp. 43 a 45 e no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e do Contrato nº 005/2020 (Estudo Impacto Vizinhança para o Túnel de Taguatinga). Processos: 00110- 00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110- 00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110- 00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110- 00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01, 00110- 00001319/2020-21 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. ▶ 0082-Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. ▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado:		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

										<p>87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-0000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0085-Fornecer e instalar sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado no período - fornecimento e instalação: do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/ 100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 013/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00000999/2023-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0086-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado no período: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (80%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (90%) e instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (5%). Executado: 3% dos serviços. CT.: 015/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00001021/2023-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0088-Fornecer e instalar alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.</p> <p>► 0089-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado no período: instalação de canteiro de obras e execução de calçadas (2.232m²). Executado: 20% dos serviços. CT.: 018/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>
15.782.6216.3119	F	B		170.177.937	0	100.138.722	44.794.932	26		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	170.177.937	105	100.138.722	44.794.932	26		
15.782.6216.3119.0004		B		170.177.937	0	100.138.722	44.794.932	26		
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	162.335.470	170.177.937	105	100.138.722	44.794.932	26	<p>► 0034-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixa (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios</p>	
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11										



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

15.812.6206.3048	F	B	622.269	0	1.654	1.654	0	<p>► 0038-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: meios-fios (1.054m), pavimento rígido (2.271m²), ciclovia (117m²), tubo (282m), galeria (130m), escavação de vala (9.043m³), escavação de bacia (1.002m³) e muro gabião (101m³). Acumulado até 2023: meios-fios (1.461m), pavimento rígido (6.278m²), revestimento asfáltico (5.215m²), ciclovia (1.067m²), tubo (1.431m), galeria (855m), escavação de vala (31.028m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (9.896m³). Executado até 2023: 42,52% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0039-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).</p> <p>► ► Realizado no período - Trecho 1: execução de desvio provisório e de parte da infraestrutura (tubulões) dos viadutos 1 e 3. Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos; trecho 1: início da limpeza de camada vegetal, das escavações e da infraestrutura (tubulões) do viaduto 1. Executado até 2023: 6% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR DH) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0081-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103; no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79; no DODF nº 110, de 14/06/2023, p. 58; no DODF nº 129, de 11/07/2023, p. 54 e no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates), do Contrato nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário ESPM), do Contrato nº 001/2017 (Alargamento do Viaduto da interseção EPTG-EPCT) e do Contrato nº 021/2022 (Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste). Processos: 00110- 00000084/2023-01, 00110-00000795/2023-77, 00110- 00001448/2023-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>
------------------	---	---	---------	---	-------	-------	---	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	622.269	124	1.654	1.654	0			
15.812.6206.3048.0012		B		622.269	0	1.654	1.654	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	622.269	124	1.654	1.654	0		▶ 0070-Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 76										▶ ▶ Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Convênio nº 859.116/ 2017/ ME/CAIXA. Objeto: Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020 concluído em 2022. Processo nº 00110-00001082/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	
17.512.6209.3855	F	B		200.000	0	138.404	60.450	30			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	200.000	100	138.404	60.450	30			
17.512.6209.3855.0001		B		200.000	0	138.404	60.450	30			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	200.000	200.000	100	138.404	60.450	30	▶ 0072-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. ▶ ▶ Realizado no Período - Pagamentos de: 2 taxas de compensação ambiental referentes a obra de recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates; 1 taxa de análise do pedido de renovação de autorização de supressão vegetal na localidade da obra da Av. Hélio Prates e 1 taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. Realizações anteriores: Pagamentos de: 03 taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT e para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e 01; e 01 taxa de Compensação Ambiental da obra do Viaduto EPIG Trecho 1. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. ▶ 0084-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. ▶ ▶ Realizado no período: 15 pontos de ruídos monitorados. Executado: 10,71% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. Obs.: Desconsiderar as informações prestadas no bimestre anterior (9 pontos de ruídos, 117336964), tendo em vista que os serviços não atenderam ao que foi especificado no Termo de Referência. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	
28.846.0001.9041	F	B		890.566	0	177.292	177.292	20		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.300.000	890.566	69	177.292	177.292	20		
28.846.0001.9041.0021		B		890.566	0	177.292	177.292	20		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53		A	1.300.000	890.566	69	177.292	177.292	20	▶ 0043-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		593.222	0	335.640	335.640	57			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	625.068	593.222	95	335.640	335.640	57			
28.846.0001.9050.0073		B		593.222	0	335.640	335.640	57			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	625.068	593.222	95	335.640	335.640	57	▶ 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo n°s: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		764.765	0	472.420	472.420	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	364.250	764.765	210	472.420	472.420	62			
28.846.0001.9093.0032		B		764.765	0	472.420	472.420	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	364.250	764.765	210	472.420	472.420	62	▶ 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00] de indenizações de transporte. Processos n°s: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.		
