




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

## 3º BIMESTRE 2023

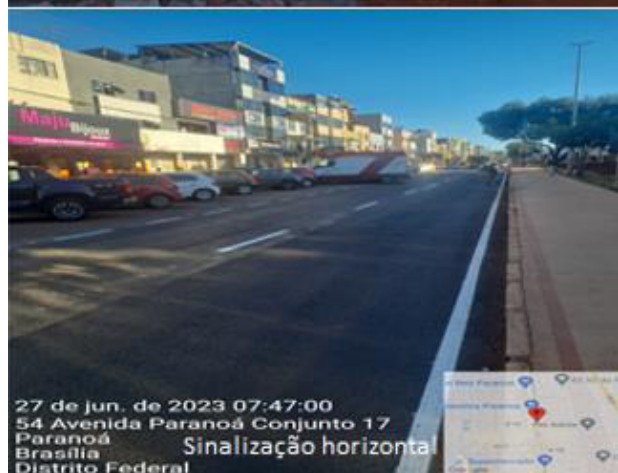

Fonte: Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho – Anexo I, páginas 368 a 384, publicado no site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (<https://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2023-SAG-3o-bim.pdf>)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		11.942.820	0	10.621.527	10.621.527	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	11.942.820	58	10.621.527	10.621.527	89			
04.122.8209.8502.0092		B		11.942.820	0	10.621.527	10.621.527	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.634.024	11.942.820	58	10.621.527	10.621.527	89	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		716.154	0	568.159	568.159	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	716.154	58	568.159	568.159	79			
04.122.8209.8504.7003		B		716.154	0	568.159	568.159	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.233.210	716.154	58	568.159	568.159	79	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		931.782	0	306.792	121.948	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	931.782	41	306.792	121.948	13			
04.122.8209.8517.0091		B		931.782	0	306.792	121.948	13			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.245.836	931.782	41	306.792	121.948	13	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Serviços de telefonia e de chaveiro; pagamento de consumo de água e de taxa de esgoto para a SODF e para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelho de ar-condicionado e de televisão; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processos nºs: 00110-00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110-00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110-00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110-00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99, 00110-00000996/2023-74 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		184.274	0	50.337	31.931	17			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	184.274	50	50.337	31.931	17			
04.126.8209.2557.2570		B		184.274	0	50.337	31.931	17			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	366.851	184.274	50	50.337	31.931	17	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016, 00110-000733/2023-65 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.128.8209.4088	F	B		65.510	0	1.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	65.510	55	1.500	0	0			
04.128.8209.4088.0066		B		65.510	0	1.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	65.510	55	1.500	0	0			► 0045-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2											► ► Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00]. Processo nº 00110-00001170/2023-22
15.451.6206.1950	F	B		116.743	0	106.783	106.783	91			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.500	116.743	805	106.783	106.783	91			
15.451.6206.1950.1040		B		116.743	0	106.783	106.783	91			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	14.500	116.743	805	106.783	106.783	91			► 0048-Construir praças públicas e parques.
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 18											► ► Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
15.451.6208.1968	F	B		1.606.050	0	1.227.000	287.230	18			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	1.606.050	54	1.227.000	287.230	18			
15.451.6208.1968.0018		B		1.606.050	0	1.227.000	287.230	18			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL  PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	1.606.050	54	1.227.000	287.230	18	<p>▶ 0005-Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.:010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-0002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.</p> <p>▶ 0078-Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 50% dos serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 70% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 70% dos serviços. CT.:004/2023 (ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>		
15.451.6209.1110	F	B		52.963.414	0	28.502.871	4.167.721	8			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	60.571.458	52.963.414	87	28.502.871	4.167.721	8			
15.451.6209.1110.0147		B		52.963.414	0	28.502.871	4.167.721	8			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 220772		A	60.571.458	52.963.414	87	28.502.871	4.167.721	8	<p>▶ 0006-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: demolições/ retiradas/ remanejamentos (4.525m²), restauração pavimento flexível (14.504m²), árvore ornamental (50unid.) e sinalização viária (608m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (101.910m²), restauração pavimento flexível (26.591m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (1.511m²). Executado até 2023: 79,00% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/</p>		



remanejamentos (95.962m<sup>2</sup>), grama (8.448m<sup>2</sup>), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m<sup>2</sup>), estacionamento em intertravado (17.216m<sup>2</sup>), restauração pavimento flexível (10.665m<sup>2</sup>), sinalização viária (902m<sup>2</sup>) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

- ▶ 0007-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).

- ▶ ▶ Realizado no período: regularização de subleito/ lastro de brita (889m<sup>2</sup>), demolição de meios-fios (358m), assentamento meios-fios (244m), assentamento de cordão de concreto (412m) e concretagem de calçada (521m<sup>2</sup>). Acumulado até 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (4.982m<sup>2</sup>), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.317m), assentamento de cordão de concreto (1.186m) e concretagem de calçada (4.321m<sup>2</sup>). Executado até 2023: 41,45% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m<sup>3</sup>), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m<sup>2</sup>), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m<sup>2</sup>). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (CM BSL) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

- ▶ 0008-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).

- ▶ ▶ Realizado no período: piso tátil (35m<sup>2</sup>) e balizadores (15unid.). Acumulado até 2023: calçadas (2.671m<sup>2</sup>) e piso tátil (166m<sup>2</sup>). Executado até 2023: 52,97% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m<sup>3</sup>), pavimentos (974m<sup>2</sup>) e meios-fios (38m<sup>3</sup>); execução de: meios-fios (882m), calçadas (2.534m<sup>2</sup>), piso fulget (142m<sup>2</sup>), piso tátil (32m<sup>2</sup>). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

- ▶ 0009-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).

- ▶ ▶ Realizado no período: demolição (16m<sup>2</sup>), remoção de pedra portuguesa (43m<sup>2</sup>), assentamento de meios-fios (565m), calçadas (594m<sup>2</sup>) e compactação de subleito (489m<sup>2</sup>). Acumulado até 2023: demolição (184m<sup>2</sup>), remoção de pedra portuguesa (263m<sup>2</sup>), assentamento de meios-fios (1.113m), calçadas (928m<sup>2</sup>) e compactação de subleito (1.223m<sup>2</sup>). Executado até 2023: 47,85% dos serviços. Realizado em 2022: demolição (103m<sup>2</sup>), remoção de pedra portuguesa (195m<sup>2</sup>) e assentamento de meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. Obs.: A Meta Física foi alterada de 1.717m<sup>2</sup> para 3.116m<sup>2</sup>, o acréscimo consta do 1º Termo Aditivo do Contrato. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

- ▶ 0010-Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2023

15.451.6209.1948	F	B		9.975.497	0	893.199	201.814	2	<p>► ► Realizado no período: escavação/ corte (4.123m³), limpeza (4.890m²), meios-fios (1.000m) e pavimento flexível (10.350m²). Acumulado até 2023: escavação/ corte (9.226m³) e limpeza (14.690m²). Executado até 2023: 45,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0011-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.</p> <p>► ► Realizado no período: mobilização de equipe para início das obras e instalação do canteiro de obras. CT.: 024/2022 (CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	17.108.538	9.975.497	58	893.199	201.814	2	
15.451.6209.1948.0004		B		9.975.497	0	893.199	201.814	2	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA		A	17.108.538	9.975.497	58	893.199	201.814	2	<p>► 0012-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote1) (procedente da etapa nº 0009/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: 1% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 86% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 68% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0013-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote2) (procedente da etapa nº 0010/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 55% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 48% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p>
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									
15.451.6209.3023	F	B		68.182.293	0	44.803.371	1.544.849	2	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	68.234.326	68.182.293	100	44.803.371	1.544.849	2	
15.451.6209.3023.0073		B		68.182.293	0	44.803.371	1.544.849	2	



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL ADJACENTE II  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	68.234.326	68.182.293	100	44.803.371	1.544.849	2	<p>▶ 0014-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período - bacia de detenção 10: alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (5.390m³), manta (5.267m²) e geogrelha (3.548m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipadores de entrada e de saída (2unid.), gabião (944m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (916m²); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³) e geogrelha (3.548m²). Executado até 2023: 65,67% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Obs.: item geogrelha da bacia 11 foi corrigido de 3.059m² para 3.548m²; 116764242. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>▶ 0015-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: finalização da instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>▶ 0055-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (182m). Executado: 1% do serviço. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p> <p>▶ 0076-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p>		





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3058	F	B		91.795.973	0	23.410.742	11.998.861	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	91.795.973	100	23.410.742	11.998.861	0			
15.451.6209.3058.0002		B		17.611.600	0	220.933	50.933	0			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA  ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472		A	17.639.347	17.611.600	100	220.933	50.933	0	▶ 0018-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: 10% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 50% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 89% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].		
15.451.6209.3058.0003		B		74.184.373	0	23.189.810	11.947.929	16			



3º Bimestre de 2023

<p>(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</p> <p>ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283</p>		A	71.671.107	74.184.373	104	23.189.810	11.947.929	16	<p>► 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: passeios (4.371m<sup>2</sup>) e meios-fios (471m). Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m<sup>2</sup>) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m<sup>2</sup>), terraplenagem (26.193m<sup>3</sup>), pavimentação (46.374m<sup>2</sup>), corte de aterro (40.088m<sup>3</sup>), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m<sup>3</sup>), intertravado (17.629m<sup>2</sup>), passeios (24.718m<sup>2</sup>), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).</p> <p>► ► Realização no período: escavações das lagoas (22.551m<sup>3</sup>) e estaca raiz (104m). Acumulado até 2023: escavações da lagoa (30.283m<sup>3</sup>) e estaca raiz (961m). Executado até 2023: 11,08% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m<sup>3</sup>) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0021-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: escavações (772m<sup>3</sup>), galeria (39m), piso intertravado (3.396m<sup>2</sup>) e meios-fios (6.460m). Acumulado até 2023: escavações (45.810m<sup>3</sup>), tubo (2.444m), piso intertravado (10.735m<sup>2</sup>) e meios-fios (8.888m). Executado até 2023: 8,73% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m<sup>3</sup>), tubo (325m) e piso intertravado (327m<sup>2</sup>). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. Obs.: As quantidades de escavações e de drenagem (tubo e galeria) foram retificadas, 117642568. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0022-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: escavação (87.416m<sup>2</sup>) e tubo (1.107m). Acumulado até 2023: escavação (207.481m<sup>2</sup>) e tubo (1.668m). Executado até 2023: 13,05% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m<sup>2</sup>) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. Obs.: As quantidades de escavações e de drenagem (tubo) foram retificadas, 117645171. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p>
---	--	---	------------	------------	-----	------------	------------	----	--



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.451.6209.3089	F	B		18.349.419	0	5.000.000	689.954	4			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	5.000.000	689.954	4			
15.451.6209.3089.0002		B		18.349.419	0	5.000.000	689.954	4			
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .  OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 23495		A	18.349.419	18.349.419	100	5.000.000	689.954	4	► 0023-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022).  ► ► Não houve medição. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.:007/2022 (WS AG) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obs.: Obra retomada, medição será apresentada no próximo bimestre, 17411117. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].  ► 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).  ► ► Realizado no período: pavimento rígido (2.200m²) e meios-fios (215m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (5.367m²), pavimento flexível (660m²) e meios-fios (575m). Executado até 2023: 6,67% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.:016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].		
15.451.6209.3856	F	B		8.317.090	0	7.607.918	842.822	10			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	8.317.090	111	7.607.918	842.822	10			
15.451.6209.3856.0001		B		8.317.090	0	7.607.918	842.822	10			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL  FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	7.500.000	8.317.090	111	7.607.918	842.822	10	► 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).  ► ► Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0026-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).

► ► Realizado no período: a elaboração do relatório final e o parecer jurídico estão em andamento. Executado até 2023: 93,40% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

► 0027-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).

► ► Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0028-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).

► ► Realizado no período: entrega de 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2023: 10 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 9 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 22,39% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

► 0058-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).

► ► Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (43diárias), equipe 2 (44diárias), equipe 3 (43diárias) e equipe 4 (10diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (54diárias), equipe 2 (79diárias), equipe 3 (49diárias) e equipe 4 (10diárias). Executado: 16% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]

► 0077-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2023

15.752.6209.1836	F	B		9.247.675	0	6.247.675	1.126.630	12	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	9.247.675	308	6.247.675	1.126.630	12	
15.752.6209.1836.0023		B		9.247.675	0	6.247.675	1.126.630	12	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	9.247.675	308	6.247.675	1.126.630	12	
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									
15.752.6209.8507	F	B		143.211.290	0	114.211.289	103.337.031	72	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	143.211.290	87	114.211.289	103.337.031	72	
15.752.6209.8507.6471		B		143.211.290	0	114.211.289	103.337.031	72	

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

► 0083-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.

► ► Realizado no período - sondagem (285m) e serviços de laboratório e controle tecnológico (16unid.). CT.: 008/2023 (MCV) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]

► 0029-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).

► ► Realizado no período: 4 projetos (sendo: 1 da etapa 1 e 3 da etapa 2), implantação de 119 pontos de iluminação e instalação de 192 luminárias. Acumulado em 2023: 8 projetos (sendo: 4 da etapa 1 e 4 da etapa 2), implantação de 145 pontos de iluminação e instalação de 246 luminárias. Total até 2023: 40 projetos (sendo: 22 da etapa 1 e 18 da etapa 2), implantação de 713 pontos de iluminação e instalação de 873 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00] unidades.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	165.394.691	143.211.290	87	114.211.289	103.337.031	72	▶ 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.  ▶ ▶ Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00] e eficientização de 4.206 luminárias no período. Acumulado: 13.063 luminárias. CT.:004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.  ▶ 0031-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  ▶ ▶ Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.  ▶ 0032-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.  ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110-00000054/2023-96, 00110-00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].  ▶ 0079-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  ▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.		
15.782.6216.3119	F	B		159.998.923	0	55.277.652	27.897.935	17			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	159.998.923	99	55.277.652	27.897.935	17			
15.782.6216.3119.0004		B		159.998.923	0	55.277.652	27.897.935	17			
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE		A	162.335.470	159.998.923	99	55.277.652	27.897.935	17	▶ 0034-Executar obras de complementação do sistema viário da		



3º Bimestre de 2023

COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE

CORREDOR IMPLANTADO  
(KILOMETRO)  
Quantidade: 11

Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).

► ► Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m<sup>2</sup>), concreto (1.699m<sup>3</sup>), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m<sup>2</sup>), cimbramento (20.097m<sup>2</sup>), forma tipo caixão (991m<sup>3</sup>), pavimento flexível (2.558m<sup>2</sup>), pavimento rígido - subleito (10.976m<sup>2</sup>) e pavimento rígido - base (1.061m<sup>3</sup>), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m<sup>2</sup>), base com brita graduada do desvio (244m<sup>3</sup>), pavimentação asfáltica do desvio (73m<sup>2</sup>) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-0000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.

► 0035-Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).

► ► Realizado no período: pavimentação (454m<sup>2</sup>), intertravado (427m<sup>2</sup>), piso concreto pigmentado (206m<sup>2</sup>), drenagem (52m), banco de concreto (13unid.), pintura pavimento e pictogram (80m<sup>2</sup> e 56unid.). Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (185m<sup>2</sup>), pavimentação (27.199m<sup>2</sup>), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m<sup>2</sup>), intertravado (7.960m<sup>2</sup>), piso concreto pigmentado (7.227m<sup>2</sup>), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (260m<sup>2</sup> e 87unid.) e placas (178unid.). Executado até 2023: 96% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m<sup>2</sup>), pavimentação (24.130m<sup>2</sup>), meios-fios (8.047m), calçada (6.435m<sup>2</sup>), intertravado (5.267m<sup>2</sup>), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m<sup>2</sup> e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

► 0036-Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).

► ► Realizado no período: drenagem (414m), poços de visita (9unid.), pavimento flexível (8.841m<sup>2</sup>), meios-fios (1.123m) e grama (30.135m<sup>2</sup>). Acumulado até 2023: drenagem (3.162m), poços de visitas (53unid.), pavimento flexível (25.291m<sup>2</sup>), pavimento rígido (6.909m<sup>2</sup>), meios-fios (4.403m) e grama (38.014m<sup>2</sup>). Executado até 2023: 70,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m<sup>2</sup>), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m<sup>2</sup>), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m<sup>3</sup>) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].

► 0037-Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2023

														<p>(ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: pavimentação (12.174m²) e drenagem (3.384m). Acumulado até 2023: pavimentação (20.957m²) e drenagem (12.112m). Executado até 2023: 45,56% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (MS VA) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0038-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: meios-fios (407m), pavimento rígido (3.901m²), revestimento asfáltico (2.579m²), ciclovia (950m²), tubo (623m), galeria (111m), escavação de vala (5.365m³), escavação de bacia (1.086m³) e muro gabião (2.292m³). Acumulado até 2023: pavimento rígido (4.006m²), revestimento asfáltico (5.215m²), tubo (1.148m), galeria (725m), escavação de vala (21.984m³), escavação de bacia (76.153m³) e muro gabião (9.795m³). Executado até 2023: 37,17% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0039-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).</p> <p>► ► Realizado no período - em andamento os levantamentos preliminares e a elaboração dos projetos executivos; trecho 1: início da limpeza de camada vegetal, das escavações e da infraestrutura (tubulões) do viaduto 1. Acumulado até 2023: andamento dos levantamentos preliminares e dos projetos executivos. Executado até 2023: 5% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR DH) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>► 0081-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates). Processos: 00110-00000084/2023-01 e 00110-00000795/2023-77. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
17.512.6209.3855	F	B		200.000	0	123.493	54.921	27			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	200.000	100	123.493	54.921	27			
17.512.6209.3855.0001		B		200.000	0	123.493	54.921	27			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	123.493	54.921	27			▶ 0072-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2											▶ ▶ Realizado no período - Pagamentos de: 01 taxa de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e 01 taxa de Compensação Ambiental da obra do Viaduto EPIG Trecho 1. Realizações anteriores: Pagamentos de 02 taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul e para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].
28.846.0001.9041	F	B		718.154	0	114.534	114.534	16			▶ 0084-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.300.000	718.154	55	114.534	114.534	16			▶ ▶ Realizado no período: 09 pontos de ruídos monitorados. Executado: 6,43% dos serviços. CT.:011/2023 (CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
28.846.0001.9041.0021		B		718.154	0	114.534	114.534	16			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	718.154	55	114.534	114.534	16			▶ 0043-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53											▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**3º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		331.227	0	120.237	120.237	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	625.068	331.227	53	120.237	120.237	36			
28.846.0001.9050.0073		B		331.227	0	120.237	120.237	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	625.068	331.227	53	120.237	120.237	36	► 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		722.872	0	339.480	339.480	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	364.250	722.872	198	339.480	339.480	47			
28.846.0001.9093.0032		B		722.872	0	339.480	339.480	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	364.250	722.872	198	339.480	339.480	47	► 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.		
