

Comitê Interno de Governança

REUNIÃO ORDINÁRIA

Dezembro/2024



Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal

PAUTA

Planejamento Estratégico SUPOP e SUAF

Gestão DF

Planos de Melhoria

GOVERNANÇA 2024

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2026

Replanejamento Projetos - Atualização 12/2024

PROJETOS	QUADRO RESUMO				TOTAL
	2023	2024	2025	2026	
Realizados	22	-	-	-	22
Replanejados	-	17	16	11	44
					66

PROJETOS PLANEJADOS

2024		2025		2026	
	Hélio Prates - Etapa III		Infraestrutura - DRENAR Ceilândia		
	Infraestrutura - Mestre D'Armas - Lotes 1 e 2		OAEs Ceilândia - Via N3 com a Elmo Serejo		
	Infraestrutura - DRENAR Taguatinga - Lote 1		Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão - Lote 05		
	Rede de Energia - Sistema viário (Próximo ao 26 de Setembro)		Requalificação urbana das avenidas SAMDU e Comercial		
	Urbanização do SCS - Quadras 06		Drenagem QSD, QSE e QSF		
	Passagem sob o Metrô no Setor Policial Sul		Infraestrutura - Vicente Pires - Remanescente (Chácaras)		
	Contratação do Plano de Saneamento do Distrito Federal		Infraestrutura - Sistema viário complementar - CAUB I e II		
	Remanejamento de rede na Elmo Serejo - acesso ao Túnel Rei Pelé		W3 Norte - Requalificação		
	Contratação do RIPA dos postos de gasolina		W3 Norte - Pavimento Rígido		
	Pavimentação - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Lago Norte		Urbanização - Sol Nascente - Área atrás da feira		
	Revitalização no entorno do Túnel - Condicionante EIV		Revitalização - SCS Quadras 1 e 2		
	OAE 03 - Vicente Pires		Requalificação - Núcleo Bandeirante - 3ª Avenida		
	Infraestrutura - Condomínio Nova Colina e Dorothy		Requalificação - SBS Quadras 1 e 2		
	Infraestrutura - Setor Habitacional Morro da Cruz		Revitalização - SHLN - Setor Hospitalar Local Norte		
	Revitalização - Setor Hoteleiro Sul e Norte (SHLS/SHLN)		Infraestrutura - DRENAR Taguatinga - Demais lotes		
	Contratação de Gerenciamento do Fonplata		Infraestrutura - Mestre D'Armas - Lote 3		
	Contratação do mecanismo interno do Relógio - Praça do Relógio		Infraestrutura - Pôr do Sol		
			OAE Boca da Mata		
			OAEs do Gama - Viadutos - Entrada do Gama e Setor Central		
			OAE Taguatinga - Viadutos - Av. Hélio Prates / Pistão Norte		
			Infraestrutura - Porto Rico - Quadras 10, 11, 12, 13 e 14		
			Projetos Executivos Ciclovias		
			Projetos para as estações de Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT na W3 Sul e Norte		
			Plano de Controle Ambiental - PCA do Setor Habitacional Mestre D'Armas		
			Contratação de projetos para a quarta ponte do Lago Sul		
			Projetos para a Implantação de Rodovia Ecológica		
			Projetos para a Requalificação do Viaduto EPTG-Guará- RA Guará.		

GOVERNANÇA 2024

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2026

Planejamento Obras – Atualização 12/2024

OBRAS	QUADRO RESUMO				TOTAL
	2023	2024	2025	2026	
Concluídas	12	7	-	-	19
Replanejadas	-	8	5	1	14
					33

OBRAS	
2024	Infraestrutura - Reformulação do Sistema Viário ESPM - BRT (T-16)
	Revitalização - Hélio Prates - Etapa II
	Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 01
	Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 04
	Infraestrutura - Duplicação da Via de Ligação Guará/NB
	Implantação - Pôr do Sol - Campo de Grama
	Infraestrutura - Boulevard Taguatinga
	Infraestrutura - Túnel de Taguatinga - Reservatório de Detenção de Águas Pluviais
	Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente
	Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 10
	Requalificação - SCS Quadra 04
	Requalificação - SCS Quadra 05
	Revitalização - W3 Sul - Pavimento rígido
	Requalificação - Praça do Relógio - LOTE 01
	Requalificação - Praça do Relógio - LOTE 02

OBRAS	
2025	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 03 / LOTE 01
	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 03 / LOTE 02
	Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 1 e parte do Trecho 3
	Revitalização - SOF Sul
	Infraestrutura - EPIG RDCI - BRT
2026	Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 02

GOVERNANÇA 2024


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2026

Replanejamento - Obras (Revisão 12/2024)

QUADRO RESUMO					
OBRAS	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Concluídas	12	7	-	-	19
Replanejadas	-	8	5	1	14
					33

OBRAS CONCLUÍDAS
Infraestrutura – Boulevard Taguatinga
Requalificação – SCS Quadra 04
Requalificação – SCS Quadra 05
Implantação – Pôr do Sol – Campo de Grama
Infraestrutura – Túnel de Taguatinga – Reservatório de Detenção de Águas Pluviais
Requalificação – Praça do Relógio – Lote 01
Requalificação – Praça do Relógio – Lote 02

OBRAS COM PREVISÃO DE REPLANEJAMENTO
Infraestrutura – Reformulação do Sistema Viário ESPM – BRT (T-16)
Revitalização – Hélio Prates – Etapa II
Infraestrutura – Bernardo Sayão – Lote 01
Infraestrutura – Bernardo Sayão – Lote 04
Infraestrutura – Duplicação da Via de Ligação Guará/NB
Infraestrutura – Vicente Pires – Lote 08 e Remanescente
Infraestrutura – Vicente Pires – Lote 10
Revitalização – W3 Sul – Pavimento Rígido

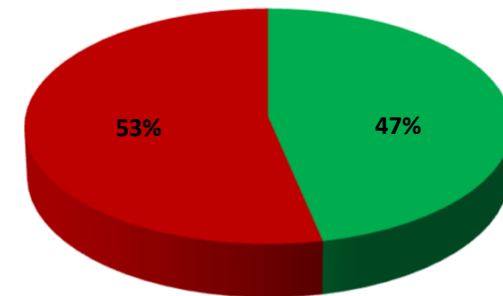

■ Obras Concluídas/2024

■ Obras Replanejadas/2025

GOVERNANÇA 2024

GESTÃO DF

- **REPORTE DE SITUAÇÃO – OBRAS COM PREVISÃO DE REPLANEJAMENTO/2025**

- **Infraestrutura – Reformulação do Sistema Viário ESPM – BRT (T-16).**

25/11/2024



- CT 022/2021 - Infraestrutura Reformulação do Sistema Viário ESPM - BRT (T-16): Obra Em Andamento. Execução: 78,25%
- CT 025/2021 - Supervisão das Obras (T-16): Obra Concluída.
- ESPM (T-15) - Reformulação do Sistema Viário (Remanescentes): Em Andamento

- **Revitalização – Hélio Prates – Etapa II.**

25/11/2024



- CT 014/2021 - Hélio Prates - Etapa I: Obra Concluída
- CT 009/2022 - Hélio Prates - Etapa II: Obra Em Andamento. Previsão de entrega: setembro/2024. Execução Física – 55,54%
- Hélio Prates - Etapa III: EM PROJETO

GOVERNANÇA 2024

• REPORTE DE SITUAÇÃO – OBRAS COM PREVISÃO DE REPLANEJAMENTO/2025

➤ Infraestrutura – Bernardo Sayão – Lote 01 e 04.

25/11/2024



- CT 001/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 04): Obra Em Andamento. Previsão de entrega: abril/2025. Execução 16,78%
- CT 005/2023 - Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 01): Obra Em Andamento. Execução 8,60%
- Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão (Lote 05): EM PROJETO

➤ Infraestrutura – Duplicação da Via de Ligação Guarά/NB.

VIGENTE	023/2023	CONSÓRCIO ACGL	Execução da Obra de Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guarά - Núcleo Bandeirante, RA-GUAR E RA-PW, incluindo elaboração de proposta executiva para os projetos relativos à estrutura de contenção do encabeçamento da ponte existente, dispositivos e estruturas de drenagem, assim como para a estrutura de OAE sobre o córrego Vicente Pires, construção das referidas estruturas, além de execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas e sinalização horizontal e vertical, conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as exigências e demais condições e especificações, memoriais descritivos, quantitativos expressos no projeto, consoante especifica o Edital de Concorrência nº. 005/2022 - SODF (id. 110175951).	40,86%
---------	----------	----------------	---	--------

GOVERNANÇA 2024

• REPORTE DE SITUAÇÃO – OBRAS COM PREVISÃO DE REPLANEJAMENTO/2025

➤ Infraestrutura – Vicente Pires – Lote 08 e Remanescente.

25/11/2024



- CT 019/2016 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 05: Obra Concluída.
- CT 021/2016 - Pavimentação e drenagem em Vicente Pires - Lote 10: Obra Concluída
- CT 019/2021 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente: Obra Em Andamento; Execução: 78,50%
- CT 014/2023 - OAE 03 - Vicente Pires: Execução: 6,98%
- CT 029/2023 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 02: Execução 12,95%

➤ Infraestrutura – Vicente Pires – Lote 10.

25/11/2024



- CT 019/2016 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 05: Obra Concluída.
- CT 021/2016 - Pavimentação e drenagem em Vicente Pires - Lote 10: Obra Em Andamento – Execução 80,53%
- CT 019/2021 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente: Obra Em Andamento; – Execução 78%
- CT 014/2023 - OAE 03 - Vicente Pires: Execução: 6,98%
- CT 029/2023 - Infraestrutura em Vicente Pires - Lote 02: Execução : 12,95%

GOVERNANÇA 2024

- **REPORTE DE SITUAÇÃO – OBRAS COM PREVISÃO DE REPLANEJAMENTO/2025**
 - **Revitalização – W3 Sul – Pavimento Rígido.**

25/11/2024



- **CT 016/2022 - Continuidade da Revitalização da W3 sul - Pavimento Rígido: Obra Em Andamento. . Execução -60,81%**

GOVERNANÇA 2024

PLANOS DE MELHORIA

- Capacitação e treinamento dos servidores;
- Mapeamento de Processos (identificar gargalos e pontos de melhoria);
- Auditoria e Gestão de Riscos em parceria com a Controladoria Geral do Distrito Federal;
- Implementação de Controles e Ações;
- Monitoramento e acompanhamento pela Assessoria de Governança;
- Reportes ao Comitê Interno de Governança para tomada de decisões.

Comitê Interno de Governança



Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal

Até a próxima reunião.
