



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO


4º BIMESTRE 2023



Via de ligação CAUB I e II 8 de ago de 2023 09:41:03



Via de ligação CAUB I e II 8 de ago de 2023 10:22:05

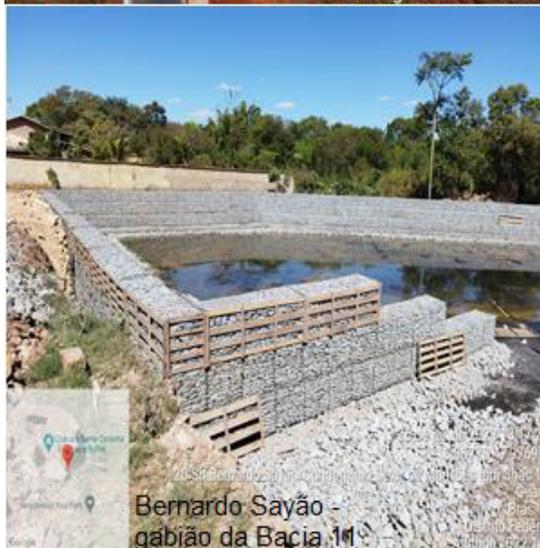

Bernardo Sayão -
gabião da Baía 11



19 de ago. de 2023 13:34:46
23L 185258 8249351
ESPM - Estrada Setor Policial Militar
pavimento rígido Brasília
Distrito Federal
Número do índice: 17



Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<p>04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	<p>Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00; jul: 175,00; ago: 178,00]. Processos n°s: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.</p>	8502	Atividade
<p>04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	<p>Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00; jul: 168,00; ago: 160,00]. Processos n°s: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.</p>	8504	Atividade
<p>04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	<p>Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos n°s: 00110-00000336/2023-93, 00110-</p>	8517	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

											00003797/2017-70, 00110- 00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110- 00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110- 00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99, 00110- 00000996/2023-74 e outros.		
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	Institucional												
0044 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2023	31/12/2023				A Ser Iniciada		1471	Projeto
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	Institucional												
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2023	31/12/2023				Andamento Normal	Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016, 00110-000733/2023-65 e outros.	2557	Atividade
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	Institucional												
0045 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	2	99	01/11/2023	31/12/2023				Andamento Normal	Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00110-00001170/2023-22.	4088	Atividade
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0051 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	4	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3247	Projeto
15.451.6208.1968.0018 (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0005 - Prestar serviços de Topografia/Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2		99	01/05/2022	30/06/2023			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.	1968	Projeto
Institucional													
0078 - Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/04/2023	31/12/2026			Concluída	Realizado no período: 30% dos serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 100% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 100% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1968	Projeto
Institucional													
0087 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/08/2023	31/12/2026			Andamento Normal	Realizado no período - Lote 1: mobilização/desmobilização/deslocamento, sondagens (Trato e Percussão), janelas de inspeção (JI), ensaios de caracterização dos solos e ensaio de classificação MCT/HRB; Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de dosagens solo-cal, ensaio de dosagem solo-cimento e Laudo Técnico/ART.	1968	Projeto



Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

													Executado: 20,01% dos serviços. CT.: 016/2023 (PFO MGR) - Proc.: 00110-0000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].			
15.451.6209.1110.0147 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL																
Institucional																
0006 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023			Andamento Normal	Realizado no período: demolições/ retiradas/ remanejamentos (5.976m²), restauração pavimento flexível (6.874m²) e sinalização viária (1.075m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m²), restauração pavimento flexível (33.466m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (2.587m²). Executado até 2023: 85,00% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-0000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1110	Projeto			
Institucional																
0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	15.637	3	01	10/08/2022	30/04/2024			Andamento Normal	Realizado no período: regularização de subleito/ lastro de brita (202m²), assentamento meios-fios (42m), assentamento de cordão de concreto (196m) e concretagem de calçada (1.484m²). Acumulado até 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (5.184m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.359m), assentamento de cordão de concreto (1.383m) e concretagem de calçada (5.805m²). Executado até 2023: 56,70% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m²), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (RJH) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1110	Projeto			
Institucional																
0008 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.501	3	01	01/07/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: calçadas (118m²), rampa de acesso (72m²) e drenagem (44m). Acumulado até 2023: calçadas (2.790m²), piso tátil (166m²) e	1110	Projeto			



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

etapa nº 0078/2022).											balizadores (15unid.). Executado até 2023: 71,25% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m²), pavimentos (974m²) e meios-fios (38m²); execução de: meios-fios (882m), calçadas (2.534m²), piso fulget (142m²), piso tátil (32m²). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
Institucional													
0009 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	3.116	3	01	20/10/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: piso em granitina (198m²), meios-fios (232m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.010m²), compactação de subleito (1.046m²), pavimento flexível (67m²), grama (1.462m²). Acumulado até 2023: remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), calçadas (1.938m²) e compactação de subleito (2.270m²). Executado até 2023: 79% dos serviços. Realizado em 2022: remoção de pedra portuguesa (195m²) e meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. Obs.: Correção do quantitativo do meios-fios, acumulado foi de 1.113m para 784m. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													
0010 - Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	25.638	3	21	15/10/2022	30/12/2023			Concluída	Realizado no período: escavação/ corte (2.464m³), limpeza (1.039m²), meios-fios (3.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (4.831m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Acumulado até 2023: escavação/ corte (11.690m³), limpeza (15.729m²), meios-fios (4.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (15.182m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 25.638,00] m².	1110	Projeto
Institucional													
0011 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	395.000	3	10	01/04/2023	30/08/2024			Andamento Normal	Realizado no período: escavação da lagoa (34.303m³). Acumulado: mobilização de equipe para início das obras e instalação do canteiro de obras. Executado: 5% dos serviços. CT.: 024/2022 (CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0090 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/07/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 143, de 31/07/2023, p. 68. Despesas do Contrato nº 020/2022 (Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul - SCS) e do Contrato nº 001/2022 (Revitalização Avenida Paranoá). Processos: 00110-00000650/2023-76 e 00110-00001685/2023-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1110	Projeto
<hr/>													
15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL Institucional													
0052 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.582	3	32	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1110	Projeto
<hr/>													
15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0053 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.822	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1110	Projeto
<hr/>													
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional													
0054 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	01	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1948	Projeto
<hr/>													
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

<p>TAGUATINGA</p> <p>Institucional</p> <p>0012 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	03	10/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 1% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 87% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 69% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1948	Projeto
<p>Institucional</p> <p>0013 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	03	10/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 60% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 49% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (CEG RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1948	Projeto
<p>15.451.6209.3023.0073 (*)(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II</p> <p>Institucional</p> <p>*</p>												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0014 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	22/03/2022	30/06/2023		Andamento Normal	Realizado no período - bacia de detenção 11: dispositivo de saída (1unid.), lastro de fundo da lagoa (730m²), gabião (1.119m³) e proteção de canal em gabião (425m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipador de entrada (1unid.), dispositivo de saída (1unid.), gabião (944m³), proteção de canal em gabião (916m²) e alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²) e manta (5.267m²). Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção de canal em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador de entrada (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3023	Projeto
Institucional *												
0015 - Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2024		Atrasada	Sem realização no período. Acumulado: finalização da instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3023	Projeto
Institucional *												
0055 - Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2023		Atrasada	Realizado no período: drenagem (192m). Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (375m). Executado: 3,21% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3023	Projeto
Institucional *												
0076 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		82	01/03/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3023	Projeto
15.451.6209.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º Bimestre de 2023

Institucional													
0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		26	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3023	Projeto
15.451.6209.3023.0077													
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES													
Institucional													
* 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0013/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (2.450m²), pavimentação (1.899m²), escavações (2.004m³), drenagem (251m) e meios-fios (519m). Acumulado até 2023: terraplenagem (222.974m²), pavimentação (227.068m²), escavações (277.317m³), drenagem (21.127m) e meios-fios (45.833m). Executado até 2023: 96,95% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3023	Projeto
Institucional													
* 0017 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (5.500m²), demolição de pavimento (3.134m²), pavimentação (14.420m²), passeios (345m²), meios-fios (821m), drenagem (2.450m) e sinalização (1.850m²). Acumulado até 2023: terraplenagem (40.819m²), demolição de pavimento (46.430m²), pavimentação (110.205m²), passeios (36.059m²), meios-fios (34.987m), drenagem (28.026m) e sinalização (2.857m²). Executado até 2023: 89,90% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m²), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3023	Projeto
Institucional													
* 0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		30	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

relativos a obras e serviços de engenharia.											41, de 01/03/23, p. 98; no DODF nº 58 de 24/03/23, pp. 61 e 62; no DODF nº 118, de 26/06/23, p. 76; no DODF nº 145, de 02/08/23, p. 61 e no DODF nº 155, de 16/08/2023, p. 60. Despesas dos Contratos nºs: 019/2016, 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires). Processos: 00110-00001964/2020-43, 00110-00002726/2021-36, 00110-00002723/2021-01, 00110-000002728/2021-25, 00112-00023252/2018-12, 00112-00025951/2018-99 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
Institucional													
* 0080 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2023	31/12/2024			Atrasada	Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (AC FAM). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3023	Projeto
15.451.6209.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA													
Institucional													
0057 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	36	3	06	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0002 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA													
Institucional													
* 0018 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	06	01/12/2021	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 10% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 60% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 90% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

<p>15.451.6209.3058.0003 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</p> <p>Institucional *</p> <p>0019 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>2.903.907</p>	<p>3</p>	<p>32</p>	<p>15/06/2021</p>	<p>30/10/2023</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Não houve medição, obra em fase de recebimento provisório. Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>	<p>3058</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional *</p> <p>0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>2.949.088</p>	<p>3</p>	<p>32</p>	<p>20/07/2022</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realização no período: escavações das lagoas (1.608m³), rede (322m) e estaca raiz (104m). Acumulado até 2023: escavações das lagoas (31.892m³), rede (1.067m) e estaca raiz (1.065m). Executado até 2023: 13,47% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC), Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>	<p>3058</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional *</p> <p>0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>2.021.566</p>	<p>3</p>	<p>32</p>	<p>01/09/2022</p>	<p>30/12/2024</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: escavações (23.890m³), tubo (947m), galeria (339m), pavimento flexível (6.608m²), piso intertravado (3.962m²) e meios-fios (2.696m). Acumulado até 2023: escavações (69.701m³), tubo (3.391m), galeria (378m), pavimento flexível (6.608m²), piso intertravado (14.697m²) e meios-fios (11.584m). Executado até 2023: 17,06% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), tubo (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. Obs.: As quantidades de drenagem (tubo e galeria) foram individualizadas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>	<p>3058</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional</p>											



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

* 0022 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.572.415	3	32	15/09/2022	30/06/2024		Andamento Normal	Realizado no período: escavação (53.433m²) e tubo (926m). Acumulado até 2023: escavação (250.260m²) e tubo (2.595m). Executado até 2023: 16,28% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m²) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. Obs.: As quantidades de escavações foram retificadas, 122035442. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3058	Projeto
Institucional * 0091 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização no Sol Nascente.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		32	01/08/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114 e no DODF nº 163, de 28/08/2023, p. 66. Despesas do Contrato nº 023/2022 (Infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente), do Contrato nº 022/2022 (Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente) e do Contrato 015/2020 (Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE, no trecho 03 do Sol Nascente). Processos: 00110- 00001761/2023-08, 00110-00001930/2023-00 e 00110- 00002368/2022-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3058	Projeto
15.451.6209.3089.0002 (* *) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0023 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023		Andamento Normal	Realizado no período: piso intertravado (2.382m²). Executado até 2023: 82,08% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obs.: As quantidades informadas são estimadas e poderão ser ajustadas no bimestre seguinte, 122341543. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3089	Projeto
Institucional 0024 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	126.000	3	01	20/07/2022	30/12/2023		Atrasada	Realizado no período: pavimento rígido (5.827m²), pavimento flexível (1.880m²) e meios-fios (1.200m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (11.194m²), pavimento flexível (2.540m²) e meios-fios (1.775m).	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

											Executado até 2023: 15% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
15.451.6209.3856.0001 (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0025 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	03	01/11/2020	31/12/2023				Concluída	Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3856	Projeto
Institucional													
0026 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	80	01/07/2021	31/12/2023				Concluída	Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.	3856	Projeto
Institucional													
0027 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	01/12/2021	31/12/2023				Concluída	Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0029 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	5.400	2	99	01/08/2022	30/12/2027		Andamento Normal	Realizado no período: 14 projetos (sendo: 10 da etapa 1 e 4 da etapa 2), implantação de 333 pontos de iluminação e instalação de 538 luminárias. Acumulado em 2023: 22 projetos (sendo: 14 da etapa 1 e 8 da etapa 2), implantação de 478 pontos de iluminação e instalação de 784 luminárias. Total até 2023: 54 projetos (sendo: 32 da etapa 1 e 22 da etapa 2), implantação de 1.046 pontos de iluminação e instalação de 1.411 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00; jul: 187,00; ago: 146,00] unidades.	1836	Projeto
15.752.6209.3205.0001 REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0063 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.	REDE REMANEJADA	UNIDADE	5		99	01/11/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Realizado no período: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.) e lançamento de cabos (250m). Executado: 40% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3205	Projeto
15.752.6209.8507.6471 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0030 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00] e eficientização de 3.182 luminárias no período. Acumulado: 16.245 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507	Atividade
Institucional												
0031 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023		Concluída	Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

Institucional														
0032 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110- 00000054/2023-96, 00110- 00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110- 00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	8507	Atividade	
0079 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00; jul: 32.769.228,00; ago: 32.662.731,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.	8507	Atividade	
15.752.6209.9128.0001 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0064 - Prestar serviços de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada.	-	-			99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		9128	Operação Especial	
15.782.6216.3054.0002 (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA														
Institucional *	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	11	03	02/05/2016	30/10/2023			Concluída	Realizado - instalações elétricas, ventilação/exaustão, combate a incêndio; vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m²), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e	3054	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

										Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 88,17% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Serviços estimados c/base em projeto básico, as quantidades não utilizadas serão suprimidas em aditivo contratual, 121602358. Túnel [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.			
Institucional													
* 0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		03	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74; no DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58; no DODF nº 133, de 17/07/2023, pp. 145 e 146; no DODF nº 134, de 18/07/2023, pp. 43 a 45 e no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e do Contrato nº 005/2020 (Estudo Impacto Vizinhança para o Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110-00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01, 00110-00001319/2020-21 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3054	Projeto
Institucional													
* 0082 - Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	01/05/2023	30/08/2023			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado: 87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3054	Projeto
Institucional													
* 0085 - Fornecer e instalar sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	01/07/2023	30/08/2023			Concluída	Realizado no período - fornecimento e instalação: do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/ 100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 013/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00000999/2023-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3054	Projeto
Institucional													
*													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0086 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	01/07/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (80%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (90%) e instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (5%). Executado: 3% dos serviços. CT.: 015/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00001021/2023-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3054	Projeto
Institucional *													
0088 - Fornecer e instalar alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	15/09/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3054	Projeto
Institucional *													
0089 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	15/07/2023	30/04/2024			Andamento Normal	Realizado no período: instalação de canteiro de obras e execução de calçadas (2.232m²). Executado: 20% dos serviços. CT.: 018/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3054	Projeto
15.782.6216.3119.0004 (*)(***) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE													
Institucional *													
0034 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/06/2020	31/10/2023			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-00000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.	3119	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

* 0035 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	30/08/2023			Andamento Normal	Realizado no período: pintura pavimento (20m²) e sinalização (10m²). Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (195m²), pavimentação (27.199m²), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.960m²), piso concreto pigmentado (7.227m²), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (280m² e 87unid.) e placas (178unid.). Executado até 2023: 97% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3119	Projeto
Institucional * 0036 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/08/2021	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (611m), poços de visita (13unid.), pavimento flexível (9.038m²) e meios-fios (4.236m). Acumulado até 2023: drenagem (3.773m), poços de visitas (66unid.), pavimento flexível (34.330m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (8.640m) e grama (38.014m²). Executado até 2023: 85,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m²), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3119	Projeto
Institucional * 0037 - Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	80	15/10/2021	21/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (1.568m³), pavimentação (350m²), pavimento rígido (1.600m²), meios-fios (1.400m) e drenagem (6.685m). Acumulado até 2023: terraplenagem (51.178m³), pavimentação (21.307m²), meios-fios (1.903m) e drenagem (18.797m). Executado até 2023: 63,00% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m³), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3119	Projeto
Institucional * 0038 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/05/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: meios-fios (1.054m), pavimento rígido (2.271m²), ciclovia (1.177m²), tubo (282m), galeria	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).											(130m), escavação de vala (9.043m³), escavação de bacia (1.002m³) e muro gabião (101m³). Acumulado até 2023: meios-fios (1.461m), pavimento rígido (6.278m²), revestimento asfáltico (5.215m²), ciclovia (1.067m²), tubo (1.431m), galeria (855m), escavação de vala (31.028m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (9.896m³). Executado até 2023: 42,52% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
Institucional													
* 0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	13	11	80	01/09/2022	30/12/2025			Andamento Normal	Realizado no período - Trecho 1: execução de desvio provisório e de parte da infraestrutura (tubulões) dos viadutos 1 e 3. Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos; trecho 1: início da limpeza de camada vegetal, das escavações e da infraestrutura (tubulões) do viaduto 1. Executado até 2023: 6% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR DH) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3119	Projeto
Institucional													
* 0081 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		83	01/05/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103; no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79; no DODF nº 110, de 14/06/2023, p. 58; no DODF nº 129, de 11/07/2023, p. 54 e no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates), do Contrato nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário ESPM), do Contrato nº 001/2017 (Alargamento do Viaduto da interseção EPTG-EPCT) e do Contrato nº 021/2022 (Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste). Processos: 00110-00000084/2023-01, 00110-00000795/2023-77, 00110-00001448/2023-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3119	Projeto
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

Institucional													
0065 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3361	Projeto
15.782.6216.4026.0001 (* * *) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0066 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarelas e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		4026	Atividade
15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0067 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		5902	Projeto
15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0068 - Construir campo de futebol de grama sintética.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	12.035	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1079	Projeto
15.812.6206.1079.0009 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0069 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	116	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1079	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0070 - Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	76	5	99	01/11/2023	31/12/2023		Concluída	Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Convênio nº 859.116/ 2017/ ME/CAIXA. Objeto: Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020 concluído em 2022. Processo nº 00110-00001082/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3048	Projeto
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0071 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	8	5	99	01/11/2023	31/12/2023		A Ser Iniciada		3596	Projeto
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0072 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/03/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Realizado no Período - Pagamentos de: 2 taxas de compensação ambiental referentes a obra de recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates; 1 taxa de análise do pedido de renovação de autorização de supressão vegetal na localidade da obra da Av. Hélio Prates e 1 taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. Realizações anteriores: Pagamentos de: 03 taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT e para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e 01; e 01 taxa de Compensação Ambiental da obra do Viaduto EPIG Trecho 1. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3855	Projeto
Institucional												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0084 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/06/2023	30/12/2024			Atrasada	Realizado no período: 15 pontos de ruídos monitorados. Executado: 10,71% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. Obs.: Desconsiderar as informações prestadas no bimestre anterior (9 pontos de ruídos, 117336964), tendo em vista que os serviços não atenderam ao que foi especificado no Termo de Referência. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3855	Projeto
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0043 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	53		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00]. Processos n°s: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.	9041	Operação Especial
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0041 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo n°s: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.	9050	Operação Especial
28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0042 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00] de indenizações de transporte. Processos n°s: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.	9093	Operação Especial
28.846.0001.9127.0043 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR -													

