



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia



RELATÓRIO DE GESTÃO - 2021

Prestação de Contas Anual do Governador
ANEXO IV



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Ibaneis Rocha

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Paco Britto

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

José Itamar Feitosa

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ORÇAMENTO

Thiago Rogério Conde

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Joseilda Mendes de Mello

- 2021 -



APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão integra a Prestação de Contas Anual do Governador e tem por objetivo dar cumprimento ao que estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o inciso V do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos artigos 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF e o artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

O Relatório de Gestão, anteriormente denominado Relatório de Atividades, teve sua denominação alterada no exercício de 2020, conforme consta no inciso V do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF que estabelece normas de organização e apresentação das prestações de contas anuais do Governo do Distrito Federal.

Elaborado em conjunto com os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF e estruturado pela Secretaria de Estado de Economia por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SEEC/SEORC/SUPLAN, o Relatório demonstra as realizações efetivadas no exercício de 2021 e apresenta os resultados alcançados em cada área de atuação do Governo.

A SUPLAN, na qualidade de Órgão Central de Planejamento Governamental, objetivando manter a coerência, compatibilidade e uniformidade das informações do Relatório Consolidado do Governo, adotou os seguintes procedimentos:

(I) Desenvolvimento do Sistema RGE_RAT - Prestação de Contas Anual do Governador, que consiste na versão sistematizada do Relatório de Gestão via Web;

(II) Em razão da impossibilidade de realização de reunião técnica presencial devido à pandemia de COVID-19, a Subsecretaria de Planejamento Governamental - SUPLAN/SEORC/SEEC realizou, em 18/11/2021, no canal do *YouTube* pertencente à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, *live* destinada ao alinhamento de conceitos e entendimentos pertinentes à elaboração do RGE, a qual permanece disponível no *link* <https://www.youtube.com/watch?v=nCFfr6r764s>;

(III) Disponibilização de apresentação e manual de instruções relativas ao tema no site da SEEC (<http://www.economia.df.gov.br>);

(IV) Divulgação dos contatos da equipe técnica responsável por orientar e auxiliar as unidades durante o processo de elaboração dos Relatórios Setoriais, em tabela remetida diretamente às Unidades Orçamentárias via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

A estrutura do Relatório no Sistema REG_RAT compõe-se de: Síntese das Competências; Força de Trabalho; Realizações por Programa; Informações Complementares; Diagnóstico da Unidade (análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para 2022).

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, as informações relacionadas aos resultados alcançados devem ser acompanhadas do diagnóstico da Unidade,



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**

visando contextualizar a análise de suas realizações à luz das dificuldades encontradas ou dos fatores favoráveis ao seu desempenho e, ainda, as perspectivas para 2022.

No contexto do processo de aprimoramento contínuo dos instrumentos de planejamento promovido pela SUPLAN, buscou-se conscientizar os gestores quanto à importância do Relatório de Gestão para sua Pasta, visto que este se configura em uma oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade, de apresentar o compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a transparência da gestão dos recursos públicos.

Ressalta-se que tal Relatório, por apresentar de forma detalhada e consolidada as realizações de todas as áreas do Governo, constitui-se, juntamente com os demais documentos que integram a Prestação de Contas Anual do Governador, um importante instrumento de transparência da atuação governamental na gestão dos recursos públicos no âmbito do Distrito Federal.

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP	1065
20203 - BIOTIC S/A	1080
20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	1093
20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE.....	1117
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.....	1119
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	1146
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO	1187
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	1209
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.....	1236
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO D. FEDERAL	1265
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.....	1275
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -	1370
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.....	1411
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB	1421
22209 - CEB LAJEADO S/A.....	1429
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS.....	1435
22212 - CEB GERAÇÃO S/A	1439
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A	1444
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	1448
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	1466
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE.....	1498
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.....	1523
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	1574
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.....	1605
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.....	1619
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....	1653
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	1697
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.....	1736
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1743
24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO.....	1749
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO.....	1751
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO.....	1757
24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF	1765
24909 - FUNDO DE SEG. PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - FUSPDF	1769
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF.....	1774
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO	1787
25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	1795
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE	1797

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF/GDF, conforme estabelece o Decreto nº 39.610, de 01/01/2019, é órgão integrante da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, e, tem as competências elencadas no artigo 1º, de seu Regimento Interno (Decreto nº 40.158, de 08/10/2019), para atuar e executar, em consonância com os princípios administrativos, nas ações de planejamento, de supervisão, de coordenação, de controle e de normatização, com relação a:

- I - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas;
- II - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana;
- III - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e
- IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal.

A atual estrutura administrativa da SODF, alterada pelo Decreto nº 42.062/2021, compreende o Gabinete (SODF/GAB) e as Assessorias: Especial (ASSESP); de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP); Jurídico-Legislativa (AJL); de Comunicação (ASCOM); de Correição (ASCOR); a Unidade de Controle Interno (UCI) e a Ouvidoria (OUV). E, as seguintes Subsecretarias: de Administração Geral (SUAG); de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras (SUPOP); de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF); de Gerenciamento de Recursos Externos (SUGRE); de Acompanhamento Orçamentário de Obras (SUAO); de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos (SUITEC) e de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento (SUAPS).

Vinculam-se à SODF a:

- I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap);
- II - Companhia Energética de Brasília (CEB); e
- III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (CAESB).

E, quanto à vinculação administrativa do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (Corsap-DF/GO) a esta Secretaria de Estado, conforme estabelecido pelo Decreto nº 37.405, de 13/06/2016, que alterou o art. 1º, do Decreto nº 36.871, de 12/11/2015, cabe informar que o Titular desta Pasta manifestou o interesse do Governo do Distrito Federal em se retirar do Consórcio, tendo em vista a delegação atribuída pelo Governador do Distrito Federal (GDF), por meio do Decreto nº 42.189, de 10/06/2021, (art. 1º), em função de não se atingirem os objetivos para os quais a instância foi criada, mas ressaltou que o GDF manterá o diálogo e o espaço para parcerias com os municípios do Entorno, mediante Convênios e outros instrumentos cabíveis. Essa manifestação do ato de saída foi formalizada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23/06/2021, conforme registrado em Ata – CORSAP.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	6	15	17	6	44
Comissionados sem vínculo efetivo	63	47	0	0	110
Requisitados de órgãos do GDF	13	15	1	0	29
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	2	7	9

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	82	77	20	13	192
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	11	4	15
Total Geral	82	77	9	9	177

Depreende-se da situação verificada, no Quadro acima, referente à Força de Trabalho que, conforme anos anteriores, o Quadro de Pessoal Efetivo continua deficitário, mas o ano de 2021, também foi um ano atípico, e, conforme vedação imposta pela Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, em seu art. 8º, inciso V, ficaram proibidos de realizar concurso público, até 31 de dezembro de 2021, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV, desta mesma lei complementar.

Ressalta-se que esta Secretaria encaminhou o processo nº 0110-00386/2016, à então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), atual Secretaria de Estado de Economia (SEEC), solicitando a abertura de procedimento para autorizar concurso público para os cargos das Carreiras de Políticas Públicas e Gestão Governamental, de Auditor de Atividades Urbanas e de Analista de Planejamento e Gestão Urbana, nas seguintes especialidades e número de vagas, de nível superior: Ciências da Computação (04), Administração de Empresas (10), Contabilidade (02), Arquivologia (02), Economia (02), Direito (05), Biologia (02), Engenharia Civil (20), Engenharia Elétrica (03), Engenharia Mecânica (03), Engenharia Florestal (03), Engenharia Ambiental (02), Arquitetura e Urbanismo (10); e nível médio (15), com o objetivo de amenizar o déficit da força de trabalho. A demanda por novos servidores deverá ser parcialmente contemplada, tendo em vista a edição da Portaria nº 295, de 08/11/2021, da SEEC, que instituiu Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos, objetivando a contratação de Instituição para o planejamento, organização e execução de concurso público para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialidades: Obras, Edificações e Urbanismo, objeto do processo 0110-000386/2016, conforme publicado no DODF 231, de 13/12/2021. Destaca-se, ainda, que reiteradamente, o Controle Interno e o Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF vem apontando a necessidade de se cumprir o percentual de pelo menos 50% por cento dos cargos em comissão, serem preenchidos por servidores de carreira, conforme determinação constante do inciso V, do art. 19, da Lei Orgânica do DF (LODF).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	593114,0	373114,00	301987,71	301987,71
0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	593114,0	373114,00	301987,71	301987,71
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	352000,0	252000,0	162559,91	162559,91

0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	352000,0	252000,0	162559,91	162559,91
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101500,0	170500,00	150614,83	150614,83
0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	101500,0	170500,00	150614,83	150614,83
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	1046614,00	795614,00	615162,45	615162,45

Ação/Subtítulo 9041.0021 - Indenizou-se 6 servidores com a conversão de licença-prêmio em pecúnia e atualização monetária (Decreto nº 40.208, de 30/10/19).

Ação/Subtítulo 9050.0073 - Indenizou-se 36 servidores com o pagamento de: diferença de 1/3 Férias (rescisão), diferença de férias indenizadas proporcionais e diferença de férias vencidas/indenizadas, referente ao acerto de contas de competência do exercício.

Ação/Subtítulo 9093.0032 - Executou-se pagamentos de 155 Indenizações de Transporte para 18 servidores que desempenham funções na área fim, integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas (Decreto nº 24.217, de 13/11/2003), servidores ocupantes de cargos integrantes das carreiras da Administração Direta e Autárquica do DF e servidores comissionados (Decreto nº 13.447, de 17/09/1991). E, ressarcimento de IPTU/TLP do imóvel de propriedade da Novacap, ocupado pela SODF (Termo de Cessão de Uso 006/2019-DJ/PRES/Novacap).

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	350000,0	0,0	0	0
9656 - Construção do Galpão do Produtor no Assentamento Oziel Alvez III	350000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	350000,00	0,00	0,00	0,00

Ação/Subtítulo 3534.9656 - Construção de Galpão - Construção do Galpão do Produtor no Assentamento Oziel Alvez III - Recursos provenientes de Emenda Parlamentar Distrital, cujos créditos orçamentários restaram cancelados por iniciativa do Parlamentar (Lei nº 6.827, de 12/04/2021).

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	288306,0	2139871,00	1852564,02	1662033,35
1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	288306,0	2139871,00	1852564,02	1662033,35
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	492229,0	477500,00	0	0
9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	492229,0	477500,00	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	3107769,0	4285792,00	1234152,29	1227438,76
0004 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	3097769,0	4285792,00	1234152,29	1227438,76
0005 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA	10000,0	0,0	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1913800,0	2313290,00	1468958,50	486467,81
0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	1913800,0	2313290,00	1468958,50	486467,81
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	10000,0	331257,0	331255,56	331255,56
8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	10000,0	331257,0	331255,56	331255,56
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	5812104,00	9547710,00	4886930,37	3707195,48

Posição do 6º Bimestre/2021

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6206
Revitalização da Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília (CT 006/2021) P. Piloto
Reforma de Espaço Poliesportivo no Parque da Cidade Sarah Kubistchek (CT 020/2020) P. Piloto
Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto (CT 016/2021) P. Piloto
Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (CT 020/2020) P. Piloto

No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas e lazer. O aporte de recursos para as realizações deste programa, em parte, vinculava-se à previsão de celebração de contratos de repasse, a partir de liberação de Emendas Federais que, em sua maioria, se encontram em tramitação ou não foram efetivados até o final do exercício.

Em 2021 as ações que puderam ser empreendidas à conta dos referidos recursos foram contratadas nos Subtítulos 0004, 1040, 0012, e, seus andamentos constam a seguir:

Ação/Subtítulo 1079.0004 - Campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto - Contrato nº 016/2021- Intervenção concluída. Houve também no exercício, a devolução de recursos referentes ao Contrato de Repasse nº 843.692/2017, diante da conclusão em 2020 da Implantação de campo de futebol de grama sintética na EQ 418/518 em Santa Maria - Contrato nº 012/2019.

Contrato nº 016/2021 - Campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto.



Ação/Subtítulo: 1079.0005 - Ginásio Poliesportivo do Gama - A programação dessa intervenção requer a revalidação de visto dos projetos de arquitetura, que encerra o exercício, em análise na Seduh/CAP (75788360 e 00110-00000470/2021-22).

Ação/Subtítulo 1950.1040 - Revitalização da Praça do Povo, Quadra 03 do Setor Comercial Sul – SCS – Contrato nº 006/2021: Intervenção concluída em outubro de 2021. Ressalta-se que a Praça do Povo enfrentava há anos degradação pela falta de manutenção, de acessibilidade, insegurança, poluição visual e invasões de espaços públicos. A partir da conclusão das obras, o local tornou-se convidativo ao uso pela população do DF.

Contrato nº 006/2021 - Revitalização da Praça do Povo – SCS.



Ação/Subtítulo: 3048.0012 - Reforma de Espaços Esportivos no Parque da Cidade Sarah Kubitschek – Contrato nº 020/2020 - Obra em andamento normal, com 51,49% dos serviços executados. Efetuado também, o pagamento de despesa, referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).

Contrato nº 020/2020 - Reforma de Espaço Poliesportivo no Parque da Cidade Sarah Kubitschek.



Ação/Subtítulo: 3596.8514 - Implantação de Infraestrutura Esportiva - As movimentações financeiras efetivadas por intermédio dessa ação, referem-se ao pagamento de despesas de exercícios anteriores decorrentes das obras de Construção da Pista de Cooper na Vila Planalto Contrato nº 005/2016 (DODF nº 47, de 11/03/2021) concluída em 2019 e, ao pagamento de devoluções de recursos pertinentes ao Contrato de Repasse nº 800.395/2013 à Caixa, cujo objeto era a Implantação de Infraestrutura Esportiva no Polo de Modas do Guará, Contrato

nº 007/2015, não iniciado e rescindido conforme termo publicado no DODF nº 242, de 20/12/2017.

Ação/Subtítulo: 3902.9472 - Reforma de Praças Públicas e Parques - As intervenções previstas vinculavam-se a contratos de repasse não efetivados ou que se encontram em tramitação para apresentação de documentações pendentes junto à Caixa.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	10000,0	0,0	0	0
0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
3247 - REFORMA DE FEIRAS	10000,0	0,0	0	0
6715 - REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20000,00	0,00	0,00	0,00

A intervenção prevista a ser executada neste Programa, compreende a Construção e Implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniquireiras/DF, classificada na **Ação/Subtítulo: 1302.0799** - Construção de Feiras, que apresenta Contrato de Repasse "Sob Liminar Judicial e Cláusula Suspensiva" (Fonte: <https://siconv.com.br/>), portanto com pendências técnicas a serem sanadas pelo GDF, dentre as quais, a apresentação de projetos pela Administração Regional de Arniquireira para o respectivo envio ao órgão financiador.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	6700000,0	563845,00	563844,49	513088,77
0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	6700000,0	563845,00	563844,49	513088,77
4041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	50000,0	0,0	0	0
0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6750000,00	563845,00	563844,49	513088,77

Posição do 6º Bimestre/2021

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208	Situação
Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para acompanhamento da execução das Obras de urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas pela Novacap, no Sol Nascente/Ceilândia (CT 062/2018 Novacap). Ceilândia	Paralisada
Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para acompanhamento da execução das obras de urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas pela Novacap, em Vicente Pires (CT 063/2018 Novacap). V. Pires	Normal

Ação/Subtítulo 1968.0018 - Os contratos vigentes custeados por recursos desta Ação/Subtítulo referem-se aos Serviços de Topografia no Sol Nascente - Contrato nº 062/2018-Novacap e em Vicente Pires - Contrato nº 063/2018-Novacap, ambos sub-rogados a esta Secretaria por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços.

No Contrato nº 062/2018 não houve prestação de serviços em 2021 devido aos encerramentos, em 2020, dos Contratos nºs 001/2015; 002/2015 e 003/2015, referentes às obras de urbanização do Sol Nascente. No entanto, manteve-se vigente em 2021, considerando possível necessidade de apoio topográfico à fiscalização das obras remanescentes, objeto do Contrato nº 15/2021, celebrado nesta gestão governamental. Com relação ao Contrato nº 063/2018, cujo objeto compreende a execução de serviços técnicos de topografia em Vicente Pires, encerrou 2021 em andamento normal, com percentual acumulado de 93,68% dos serviços executados.

Ação/Subtítulo: 4041.0001 - Manutenção e Conservação Urbanística - Não houve consignação de recursos em montante adequado para programação de intervenções pertinentes a essa Ação. Não obstante a situação relatada, a Novacap tem atuado, mediante recursos alocados no seu orçamento em diversas ações relacionadas à Manutenção e Conservação Urbanística no DF.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	12003285,0	17428781,00	10654603,56	9908666,94
0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	7188285,0	16228781,00	10654603,56	9908666,94
0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	10000,0	0,0	0	0
1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	1205000,0	1200000,0	0	0
9929 - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NO SETOR SUL DO GAMA - RA II	600000,0	0,0	0	0
9939 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS CIDADES	3000000,0	0,0	0	0
1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	20000,0	1219748,0	0	0
0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .	10000,0	0,0	0	0
0004 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA	10000,0	1219748,0	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2000000,0	0,0	0	0
3229 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DO CAMINHONEIRO	2000000,0	0,0	0	0
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	190412925,0	175727414,00	37547029,17	25551924,86

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	29796030,0	30258849,00	2962595,49	1475539,05
0075 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	4740784,0	8592104,0	1192597,02	990197,55
0076 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	767081,0	766081,0	0	0
0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	155109030,0	136110380,00	33391836,66	23086188,26
3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	8878972,0	30391343,00	9269706,25	8074615,51
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	10000,0	0,00	0	0
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	1600000,0	1200000,00	1080075,66	0
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	7268972,0	29191343,00	8189630,59	8074615,51
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	16600001,0	16697141,00	14742885,31	13337971,62
0002 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .	16600001,0	16697141,00	14742885,31	13337971,62
3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	10683897,0	4035279,00	3794602,00	1942588,12
0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	10683897,0	4035279,00	3794602,00	1942588,12
9115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .	200000,0	0,0	0	0
0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .-- DF ENTORNO	200000,0	0,0	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16857903,0	6168633,00	5161324,13	4728247,96

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	6269903,0	4008029,00	4008027,02	3651408,57
7027 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500000,0	200000,0	0	0
7028 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	1000000,0	200000,0	0	0
7032 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	500000,0	100000,0	0	0
7033 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O DF (EM 2021)	195000,0	0,0	0	0
7037 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DF	200000,0	200000,0	199844,87	182473,18
7042 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL - 2021	1000000,0	0,0	0	0
7044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS CIDADES	1093000,0	0,0	0	0
7045 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1000000,0	0,0	0	0
7046 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO FEDERAL	1500000,0	0,0	0	0
7026 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS CIDADES DO DF 2021	500000,0	500000,0	0	0
7034 - AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O DF (EM 2021)	200000,0	0,0	0	0
7038 - Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal	2100000,0	960604,0	953452,24	894366,21
7040 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	800000,0	0,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221077414,0	155094794,00	154970111,29	126416648,99
6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	212877414,0	154694794,00	154570423,52	126016961,22
6494 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	2000000,0	400000,0	399687,77	399687,77
6495 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DF	800000,0	0,0	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
6497 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED	900000,0	0,0	0	0
6501 - MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL -2021	500000,0	0,0	0	0
6502 - Modernização e Eficientização de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2021	1000000,0	0,0	0	0
6503 - MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1500000,0	0,0	0	0
6504 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDEAL-DF	1500000,0	0,0	0	0
3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	200000,0	20826,00	20825,84	20825,84
0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	200000,0	20826,00	20825,84	20825,84
7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10000,0	10000,0	0	0
6035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	10000,0	10000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	478944397,00	406793959,00	236161087,55	189981489,84

Posição do 6º Bimestre/2021

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa no SAG	Situação
Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul (CT 012/2020)	P. Piloto	0009	Concluída
Obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Segurança" (CT 011/2019)	SIA	0010	Concluída
PAC Arnuqueiras/Bernardo Sayão, Lote 03 (CT 004/2017)	DF	0011	Concluída
PAC Arnuqueiras/Bernardo Sayão, Lote 02 (CT 001/2018)	DF	0012	Concluída
Construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290 (CT 001/2020)	Sta.Maria	0013	Concluída
Serviços técnicos (geotecnia), em Vicente Pires (CT 014/2020)	V. Pires	0014	Normal
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 06 (CT 004/2015)	V. Pires	0015	Concluída
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 07 (CT 005/2015)	V. Pires	0016	Concluída
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 01 (CT 008/2015)	V. Pires	0017	Concluída
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 11 (CT 006/2016)	V. Pires	0018	Paralisada
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 04 (CT 008/2016)	V. Pires	0019	Concluída
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 05 (CT 019/2016)	V. Pires	0020	Concluída
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 09 (CT 020/2016)	V. Pires	0021	Concluída
PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 10 (CT 021/2016)	V. Pires	0022	Normal
Obras de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires (CT 017/2020 - Contrato Rescindido)	V. Pires	0023	Não Iniciada
Projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 (CT 015/2020)	S. Nasc	0024	Normal

Projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (CT 016/2020)	S. Nasc	0025	Normal
Supervisão e acompanhamento das obras do Túnel de Taguatinga (CT 018/2020)	DF	0026	Normal
Revitalização da W3 Sul - Quadras 504, 505 e 506 (CT 005/2021)	P. Piloto	0038	Concluída
Revitalização da W3 Sul - Quadras 502 e 503 (CT 004/2021)	P. Piloto	0039	Concluída
Revitalização da W3 Sul - Quadras 513 e 514 (CT 022/2020)	P. Piloto	0041	Concluída
Revitalização da W3 Sul - Quadras 507 e 508 (CT 002/2021)	P. Piloto	0042	Concluída
Obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 021/2021)	V. Pires	0054	Normal
Revitalização da W3 Sul - Quadras 515 e 516 (CT 011/2021)	P. Piloto	0071	Normal
Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2 (CT 015/2021)	S. Nasc	0072	Normal
Supervisão e apoio técnico das obras de implantação do Viaduto da EPIG (CT 018/2021)	P. Piloto	0081	Normal
Obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 019/2021)	V. Pires	0082	Normal
Supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (CT 025/2021)	P. Piloto	0088	Normal
Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de requalificação do Setor de Rádio e TV Sul (CT 012/2020) e à obra de drenagem e pavimentação do trecho denominado "Rota de Fuga" - Rota de Segurança (CT 011/2019)	P. Piloto	0090	Concluída
Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires (CTs nºs 006/2016, 008/2016, 019/2016, 021/2016 e 019/2021)	V. Pires	0091	Concluída
Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de revitalização da W3 Sul, Quadras 502 a 506; 504 a 506 e 513 a 516 (CTs nºs 022/2020, 004/2021, 005/2021 e 011/2021)	P. Piloto	0092	Concluída

A maior parte das ações previstas para serem executadas no âmbito do Programa Temático 6209, soma o percentual de 90,22% da Despesa Autorizada, que consiste de recursos provenientes de: Operações de Crédito (Fontes: 135 e 335), Contratos de Repasse celebrados com a União (Fontes: 132, 332, 732 e 832), Convênios firmados com a Terracap (Fontes: 131 e 331) e também decorrentes da Contribuição para Iluminação Pública – CIP (Fonte 134). Portanto, concentra-se neste Programa o maior percentual de recursos alocados para utilização por esta Unidade Orçamentária.

Verifica-se nas realizações das fontes de recursos externas, principalmente aquelas vinculadas aos financiamentos vigentes com a Caixa, o avanço no desempenho da Pasta, muito embora, o efetivo ingresso desses recursos estejam condicionados ao cumprimento das regras pactuadas e à solução de situações de natureza variadas, sobretudo, questões ambientais, fundiárias, de projetos desatualizados que serviram de base para a realização de certames em gestões anteriores, e também, do cumprimento de exigências de órgãos como Ibram, Iphan, Semob, Seduh, Terracap e outros, além da conclusão de grandes licitações em curso.

Destaca-se maior evidência da constatação supracitada nas Ações Orçamentárias 3023 - Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e 3058 - Execução de Obras de Urbanização - Pró-Moradia (Sol Nascente, Arapoanga, Mestre D'armas). Verifica-se no contexto do presente relatório, que o andamento das respectivas intervenções previstas reflete os fatores citados no desempenho orçamentário dessas ações.

Ação/Subtítulo 1110.0147 – Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal –

Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Segurança", no Setor de Inflamáveis, no SIA - DF, contrato nº 011/2019 – Importante rota de saída do Setor de Inflamáveis foi concluída e entregue à população do Distrito Federal no 6º bimestre de 2021. Contrato nº 011/2019 - Rota de Segurança



Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul - Contrato nº 012/2020: O Projeto de Requalificação do Setor de Rádio e Televisão Sul partiu da necessidade premente de reurbanização do local para privilegiar o pedestre na região. No decorrer da execução, deparou-se com inúmeras interferências (rede elétrica, rede de esgoto, rede de águas pluviais, rede de água potável, pedestres utilizando a mesma área de trabalho, veículos circulando sem interrupção), sendo concluída em agosto de 2021. Contrato nº 012/2020 - Setor de Rádio e TV Sul




Importante salientar que será celebrado contrato, em 2022, mediante recursos da Ação/Subtítulo 1110.0147, objetivando à Revitalização da Av. Paranoá, com cerca de 2,7km de extensão e caixa de 40m em média, tendo em vista, que a licitação ocorrida ao longo do ano de 2021, foi finalizada em dezembro.

Ação/Subtítulo 1110.0306 – Urbanização Por do Sol, DF - Não houve consignação de recursos em montante adequado para programação de intervenções pertinentes a essa Ação por esta Secretaria, há que se ressaltar, no entanto, que o setor de projetos planeja para 2022, a elaboração de Termo de Referência para fins de contratação dos projetos executivos relativos à urbanização do Por do Sol.

Ação/Subtítulo 1948.0003 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares - Plano Piloto – Considerando a ausência de recursos próprios, houve reavaliação do GDF quanto ao órgão encarregado de executar as intervenções de drenagem previstas nesta Ação que, anteriormente estavam sob a gestão desta SODF, optando-se por encarregar à Terracap, que se responsabilizou pela elaboração de novos projetos de drenagem para as Faixas 1 e 2 Norte, estando essa intervenção em procedimento licitatório, conduzido por aquela empresa.

Ação/Subtítulo 1948.0004 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga: Após revogação da Concorrência Internacional nº 002/2012 – ASCAL/PRES/Novacap, Lotes 2 e 3 em 2020 e Lote 1 em 2021, o setor de projetos elaborou Termo de Referência para a Readequação do Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana dos denominados Lotes 1, 2 e 3, de construção, visando atender as novas normativas vigentes. O certame para a contratação dos projetos está em finalização, com previsão de contratação no primeiro bimestre de 2022.

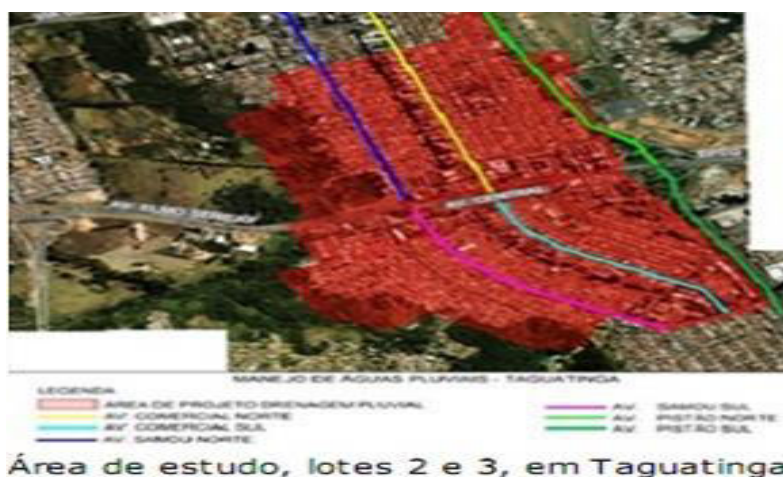

Intervenções Pontuais de Drenagem:

Em 2021 o Secretário de Obras, por meio da Portaria nº 50, de 12/04/2021, instituiu o Grupo de Trabalho Executivo com o objetivo de identificar, planejar e promover a execução de intervenções pontuais que busquem mitigar os eventos impactantes, ocasionados pelas chuvas na região da Asa Norte no Plano Piloto.

Ademais, deu-se continuidade à gestão conjunta com a Novacap e a UnB para realizar intervenções de drenagem na Asa Norte, com o objetivo de mitigar as ocorrências de alagamentos, ocasionados em períodos chuvosos, iniciados em 2019. Neste sentido, verifica-se as situações a seguir para as respectivas ações elencadas:

Local da Intervenção	Ações	Estágio em 31/12/2019	Estágio em 31/12/2020	Estágio em 31/12/2021
Ala Norte Estádio Nacional	Manutenção do rebaixamento da área verde livre na Ala Norte do Estádio Nacional (7000m³ de reservação)	-	Em execução	Concluído

Local da Intervenção	Ações	Estágio em 31/12/2019	Estágio em 31/12/2020	Estágio em 31/12/2021
W3 505 a 513 Norte	Abertura de novas bocas de lobo ao longo de toda a Via W3 Norte. Essa medida visa maior captação das águas superficiais que escoam na via.	Em execução pela Novacap, que conta com apoio da mão de obra da SESIPE.	Concluídas a duplicação de cerca de 55 bocas de lobo neste ano, sendo necessária a retomada no próximo exercício	Realizada nova proposta de intervenção na altura da 511 Norte e em frente ao Ibram visando solução para ampliação de captação e criação de novos ramais. Demanda se encontra na Novacap para ciência e providências.
FT / UnB	Planejamento de intervenções no estacionamento da Faculdade de Tecnologia – FT/UnB, onde têm ocorrido eventos de alagamentos. Definiu-se as seguintes ações: i) execução de meios-fios ou alteamento dos já instalados, em frente à FT/UnB; ii) limpeza e desobstrução dos ramais e dispositivos de captação (grelhas) do estacionamento da antiga sede da Secretaria de Saúde, em frente a Faculdade.	-	Realizada reuniões com a UnB e Novacap	Apresentada nova proposta, em complemento a anterior (00110-00002377/2020-71). A demanda se encontra na Novacap para análise e providências.
901 Norte	Rebaixamento de gramado em área verde, na Quadra 901 Norte. Em execução rebaixamento com lâmina de 50 cm (cinquenta), que terá aproximadamente 6.300 m ³ (seis mil e trezentos) de reservação. A concepção da solução foi realizada pela Novacap, 30903308. Foram necessárias vistorias conjuntas entre SODF, CEB e Novacap para solução de problemas de interferências do projeto com redes de alta tensão da CEB.	Em fase final de execução (por empresa contratada pela Novacap)	A intervenção requer continuidade no próximo exercício (Bacia de contenção concluída, faltando ligação 1a rede de drenagem)	Concluída a ligação à rede de drenagem e feita conformação do fundo da Bacia.
	Derivação de duas galerias de rede de drenagem para área verde, sendo que uma galeria será recepcionada pelo rebaixamento de terreno já implantado, e para a outra galeria será necessário ampliar o rebaixamento de gramado na área verde.	-	-	Em estudo
Autódromo Nelson Piquet	Visando minimizar o impacto das chuvas na região, a SODF, em conjunto com a Novacap, foi autorizada, por meio do Despacho, 31899950, a atuar nas melhorias na drenagem do Autódromo para que seja reduzido o pico de vazão que é adicionado ao sistema público de drenagem, reduzindo, assim, os problemas causados à jusante. Desta forma, está sendo estudado entre SUAPS/SODF, SUPOP/SODF e DU/Novacap proposta para retenção das águas pluviais do Autódromo Nelson Piquet, de forma ao aumento do tempo de concentração do "run off" até seu retorno à rede de drenagem convencional.	Em planejamento	Em análise de viabilidade	Demanda está a cargo da Terracap, em virtude da parceria entre esta e o Banco de Brasília - BRB, que visa a revitalização do Autódromo. Desta forma, foi encaminhado levantamento topográfico cadastral à aquela Companhia para proceder junto ao banco, a drenagem do empreendimento.

Local da Intervenção	Ações	Estágio em 31/12/2019	Estágio em 31/12/2020	Estágio em 31/12/2021
906/907 Norte	Estudadas por setores técnicos desta Secretaria SODF/SUAPS e SODF/SUPOP propostas de projeto para derivação da rede SRPN Trecho 1 na rede da W6 Norte.	Em planejamento	Em análise de viabilidade	Conforme, o Despacho - SODF/SUPOP (53239928) a demanda está sendo tratada entre a Terracap e o Ibram no âmbito do processo de urbanização referente ao Parque Burle Marx. Demanda encaminhada para ciência do Ibram, por meio do Ofício Nº 88/2021 - SODF/GAB/ASSESP.
302 e 702 Norte - HRAN	Implantação de novas bocas de lobo e novos ramais	-	Em estudo	Projeto elaborado. Aguardando execução.
SQN 402 Norte	Implantação de novas bocas de lobo em frente ao Bloco A interligando à rede de 1000mm existente, com o objetivo de maior captação das águas pluviais superficiais.	-	-	Concluído
	Implantação de novas bocas de lobo e ramal no balão do Banco do Brasil e alteamento de meios fios em frente ao Bloco I, com o objetivo de maior captação das águas pluviais superficiais.	-	-	Concluído
	Rebaixamento de área verde livre atrás do Bloco D, com o objetivo de reter águas pluviais e posterior devolução à rede de drenagem.	-	-	Em estudo
ERL St. de Autarquias Norte	Rebaixamento de área verde livre atrás da parada de ônibus na ERL Norte - St. de Autarquias Norte, com a implantação de canaletas para o direcionamento do fluxo de água pluvial que corre na pista.	-	-	Em estudo
103/102 Norte	Rebaixamento de área verde livre com o objetivo de reter águas pluviais e posterior devolução à rede de drenagem.	-	-	Em estudo

Além das ações acima relacionadas, realizou-se gestão junto à Novacap, com apoio dos apenados da Funap, para limpeza e manutenção de redes de drenagem e bocas de lobo ao longo de toda W3 Norte e W3 Sul, bem como nas quadras residenciais, conforme registro fotográfico a seguir:

Registro Fotográfico 2021 - Limpeza e manutenção de redes de drenagem e bocas de lobo.



Ação/Subtítulo 3023.0073 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Qualificação de vias no Setor Habitacional Bernardo Sayão:

Pavimentação e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 03 - Contrato nº 004/2017: O projeto executivo inicialmente proposto sofreu adequações em razão de diversas interferências que afetaram o desenvolvimento do contrato e estenderam a conclusão das obras para o 6º bimestre de 2021. No ano de 2021, destaca-se a conclusão do reservatório de detenção nº 06; conclusão da execução da pavimentação e drenagem das vias BS-54 e BS-55 e execução de calçadas e meios-fios ao longo das vias pavimentadas.

Contrato nº 004/2017 - Bernardo Sayão



Pavimentação e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 02 - Contrato nº 001/2018: Nos exercícios anteriores o projeto executivo inicialmente proposto sofreu adequações por razões diversas. Após paralisações houve a conclusão da intervenção durante o exercício de 2021 (3º bimestre) com a celebração do aditivo de supressão.

Ação/Subtítulo 3023.0075 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, Km 4 da DF-290, em Santa Maria - Contrato nº 001/2020 - Intervenção retomada no 1º bimestre de 2021, após paralisação para os trâmites necessários à celebração de aditivo financeiro para finalização da obra, em função da adequação de projeto, devido à grande velocidade e volume das águas, constatou-se a necessidade de realização de enrocamento dos gabiões que compõem a parte final do dissipador. Intervenção concluída no 3º bimestre de 2021. Contrato nº 001/2020 - Construção de bacias de detenção, Km 4 da DF-290.




Ação/Subtítulo 3023.0077 - Obras de execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e obras de artes especiais no Setor Habitacional Vicente Pires: PAC - Qualificação de Vias no Vicente Pires: Contratos nºs 008/2015 (Lote 01), 010/2015 (Lote 03), 008/2016 (Lote 04), 019/2016 (Lote 05), 004/2015 (Lote 06), 005/2015 (Lote 07), 003/2018 (Lote 08), 020/2016 (Lote 09), 021/2016 (Lote 10), 006/2016 (Lote 11), 014/2020 (Lote 02) e 019/2021 (Lote Único).

O Setor, dividido territorialmente em glebas, de número I a IV, possui área aproximada de 2.200 hectares. Para a realização das licitações dividiu-se os espaços em onze Lotes. Na Gleba I estão os Lotes: 1, 2 e 3. Na Gleba II, os Lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Na Gleba III, encontram-se os Lotes 6 e 7; e na Gleba IV, ficam parte dos Lotes 1 e 10.

Foram firmados contratos para a execução das obras em 2015 e 2016, com base em projetos de 2010 que restaram desatualizados quando da efetiva execução das obras, pois se verificou significativo crescimento urbano. Novas ruas, muros, edificações, redes de energia, água e esgoto, enfim, interferências de toda a ordem impulsionadas pela expansão desordenada, demandando constantes readequações nos projetos das obras então contratadas, de infraestrutura de redes de drenagem e de pavimentação licitadas, tendo acarretado diversos aditamentos e ajustes contratuais, bem como atrasos na execução das intervenções. Os Contratos em sua maioria, com a execução das obras paralisadas, requeriam avaliação e decisão quanto a sua continuidade.

A partir de 2019, foram realizadas tratativas junto aos moradores, comerciantes e demais órgãos do GDF, visando à atualização dos orçamentos e projetos para a conclusão das obras, sendo necessário ajustes de projetos e orçamentos a fim de executar as principais vias em Vicente Pires, dentro dos limites legais de aditivo financeiro. Buscou-se, também, orientação junto aos órgãos de controle, em relação à situação das contratações anteriores, decidindo-se pela supressão de serviços originalmente previstos, que não apresentavam possibilidade de execução. Assim, as ruas 1, 3, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 6, 7, 8 e 10 estão totalmente asfaltadas e o sistema de drenagem em finalização, o que reduz a possibilidade de enchentes na região.

Em 2020, foram tomadas decisões importantes e adotadas ações com o objetivo de contemplar as áreas cujos contratos existentes foram rescindidos ou impossibilitados de dar prosseguimento, por ultrapassarem o limite legal de aditivos. Tais serviços que não puderam ser realizados nos contratos existentes, foram incluídos em uma nova licitação: Concorrência nº 009/2020 – DECOMP/DA. Em 2021, a partir do citado certame, as obras remanescentes dos Lotes 2, 5, 8 e 9 foram contratadas - Contrato nº 019/2021 - Lote Único. No âmbito dessa contratação, iniciada em junho/2021, foi possível executar parte da pavimentação da Rua 5 e, iniciar os serviços de drenagem Rua 10. Essa intervenção encerrou o exercício com 12,50% dos serviços executados.

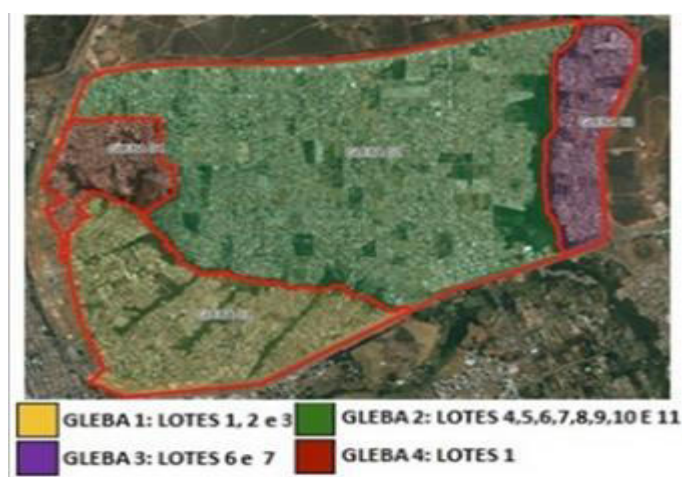

As dificuldades intrínsecas a cada contratação e a respectiva evolução constam a seguir:

Lote	Contrato	Dificuldades/Interferências	% Executado (acumulado)		
			2019	2020	2021
01	008/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Impossibilidade de execução de parte do objeto contratual em razão das interferências com edificações; - Negativa de acesso a condomínio pelos moradores, para execução dos serviços; - Ausência de projetos executivos de alguns lançamentos, inviabilidade na execução de calçadas conforme normas de acessibilidade e descompasso entre projetos e planilha orçamentária; - Contrato encerrado por decurso de prazo. 	Em execução 45,92%	Em execução 64,07%	Concluído 64,96%

04	008/2016	- Ocorrência de itens de serviços que não foram previstos em orçamento, e que ultrapassam a 25% do valor inicial do contrato, o que impede a formalização de novos aditivos financeiros; - Após aditivo de supressão, o contrato foi encerrado no 4º bimestre/2021.	Em execução 54,62%	Em execução 68,22%	Concluído 68,96%
05	019/2016	- Contrato encerrado no 3º bimestre/2021.	Em execução 42,00%	Em execução 67,89%	Concluído 87,22%
06	004/2015	- Contrato finalizado devido a ocorrência de itens de serviços que não foram previstos em orçamento, e que ultrapassam a 25% do valor inicial do contrato, o que impede a formalização de novos aditivos financeiros. - Contrato encerrado no 3º bimestre/2021.	Em execução 43,00%	Em execução 54,00%	Concluído 54,00%
07	005/2015	- Impossibilidade de execução de parte do objeto contratual em razão das interferências com edificações; - Ausência de projetos executivos de alguns lançamentos e descompasso entre projetos e planilha orçamentária. Inviabilidade na execução de calçadas conforme normas de acessibilidade e; - Contrato encerrado por decurso de prazo.	Em execução 51,42%	Em execução 58,00%	Concluído 58,16%
09	020/2016	- Ausência de projetos executivos, necessidade de remoção de interferências (hidrantes, postes e de supressão vegetal); necessidade de liberação de área para execução das lagoas; - Negativa de acesso a condomínios pelos moradores, para execução dos serviços; - Intervenção concluída no 3º bimestre/2021.	Em execução 68,91%	Em execução 89,93%	Concluída 91,05%
10	021/2016	- Necessidade de readequação do projeto executivo; descompasso de tempo entre a análise e aprovação dos aditivos financeiros e para o uso de fragmentadores para realização de Túnel Liner, presente na Rua 08; chuvas; remoção de hidrantes; remoção de poste; supressão vegetal. - Negativa de acesso a condomínios pelos moradores, para execução dos serviços.	Em execução 49,81%	Em execução 74,46%	Em execução 80,40 %
11	006/2016	- Necessidade de readequação do projeto executivo; chuvas e negativa de acesso a condomínios pelos moradores, para execução dos serviços. - A intervenção, suspensa até fevereiro de 2022 - 4º Termo de Suspensão (72686124), aguarda a conclusão das obras remanescentes do Setor (Contrato nº 19/2021) para a retomada. Em 2021 destaca-se a conclusão da pavimentação da Rua 12, incluindo os serviços de execução de meios fios e calçadas.	Em execução 25,00%	Em execução 43,95%	Paralisada 49,30%

Contrato nº 005/2015 - Vicente Pires



Ramal da boca de lobo – Lote 7



Calçada – Lote 7

Contrato nº 008/2015 - Vicente Pires



Boca de lobo – Lote 1



Dissipador e gabião – Lote 1



Calçada – Lote 1

Contrato nº 006/2016 - Vicente Pires



Calçadas na Rua 12



Meios-fios na Rua 12

Contrato nº 008/2016 - Vicente Pires



Base de pavimentação asfáltica - Rua 04



OAE 02 Rua da Misericórdia

Contrato nº 019/2016 - Vicente Pires



Galeria Lançamento Re



Pavimentação asfáltica Rua 04 A

Contrato nº 020/2016 - Vicente Pires



Lagoa de contenção - Margem da Via Estrutural



Calçadas na Marginal da Via Estrutural



Serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de pavimentação e drenagem de Vicente Pires – Contrato nº 014/2020 – Os trabalhos foram iniciados no final de 2020, sendo executados 13,59% até o encerramento de 2021.

Ressalta-se no exercício a celebração do Contrato nº 019/2021 – Obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires, englobando as obras remanescentes dos Lotes 2, 5, 7 e 9. A intervenção iniciada em 2021, encerrou o exercício com 12,50% dos serviços executados.

Ação/Subtítulo 3058.0001- Execução de obras de urbanização – Pró-Moradia - Arapoanga Planaltina - Em 2021, devido à meta do trabalho técnico-social -TTS ainda se encontrar em aberto, o pleito de encerramento do contrato requerido por esta SODF, em 2020, foi negado pela Caixa e Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. Contudo, após as reuniões, a Caixa e o MDR, solicitaram novamente um estudo atualizado e com maiores detalhamentos sobre a situação social nas regiões e com as devidas conclusões se ainda é cabível a implantação do TTS ou não nessas localidades. Foram realizadas tratativas junto à Codhab (00110-00002448/2021-17), visando efetivar novos estudos quanto à viabilidade na realização do TTS na região.

Ação/Subtítulo 3058.0002 - Execução de obras de urbanização - Pró-Moradia – Mestre D’Armas – Planaltina – Foi contratada a revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem no Setor Habitacional Mestre D’Armas - Contrato nº 021/2021, para fins de retomada das obras remanescentes. A elaboração dos projetos encerra o 6º bimestre com andamento normal e com 10,00% dos serviços executados.

Ação/Subtítulo 3058.0003 - Urbanização Sol Nascente e Pôr do Sol: Contratada a execução das obras remanescentes de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 – Contrato nº 015/2021, que encerra 2021 com andamento normal e com 44,22% dos serviços executados. Foram continuados os serviços de elaboração de projetos, a saber:

- Elaboração de projeto executivo de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no Trecho 03, Contrato nº 015/2020 – Encerra 2021 com andamento normal e com 92,40% dos serviços executados.
- Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do Trecho 3, do Trecho 1 e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o Trecho 01 e o Trecho 02), Contrato nº 016/2020 - Encerra 2021 com andamento normal e com 96,12% dos serviços executados.
- Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN):

Após a suspensão das obras de infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente, a Secretaria de Obras trabalha para retomar e concluir as obras na região. Nos Trechos 1 e 3 o primeiro passo foi dado com a contratação das empresas responsáveis pela elaboração dos projetos

executivos para a continuidade das obras de pavimentação asfáltica, drenagem, construção de meios fios e calçadas, sinalização horizontal e vertical, além da readequação das bacias de retenção. A atualização do projeto referente ao Trecho 1 é realizada ao custo de R\$ 995.436,02, e o Trecho 3 ao custo de R\$ 1.013.936,95.

A ocupação do Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN) ocorreu de forma desordenada, inclusive com o uso de áreas de proteção ambiental para fins residenciais, o que modificou o comportamento do escoamento das águas das chuvas, principalmente devido à impermeabilização da superfície, resultando em maiores picos e vazões. A ausência de sistema de drenagem pluvial adequado e completo, implica em problemas ambientais negativos intensos (inundações e alagamentos, assoreamento dos cursos d'água e agravamento dos processos erosivos).


Os projetos iniciais, utilizados à época da licitação das obras de urbanização e infraestrutura do Setor que deram origem aos contratos nº 002/2015 (Trecho 2) e nº 003/2015 (Trecho 3), datavam de setembro de 2011 e, em função das modificações ocorridas ao longo dos anos, devido ao forte crescimento populacional na região, se mostraram totalmente desatualizados, dessa forma, trechos de drenagem que comprometem tanto o funcionamento das etapas executadas quanto a implementação de novas redes não puderam ser executados.

Assim, desde a rescisão desses contratos (Termo de Rescisão Contratual Unilateral, de 02/01/2020), a Secretaria trabalha para retomar e concluir as obras na região. Para tanto, foram atualizados os projetos e efetuadas as análises com vistas ao planejamento de licitações futuras.

Nesse contexto, de acordo com a Portaria nº 108 de 09/07/2019, instituída a partir de Decisão do TCDF, que recomenda que todos os projetos de obras a serem licitados, devem ser revisados ou refeitos, conforme avaliação de tempo e técnica. O setor de projetos desta SODF elaborou novos projetos e documentação técnica para execução das obras remanescentes do intitulado Trecho 2, que inclui trechos de vias secundárias e principais. Essas providências permitiram o lançamento da Concorrência nº 012/2020 – DECOMP/DA e a respectiva contratação, em 2021, das obras de pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e readequação de bacias, que não puderam ser realizadas no Contrato nº 002/2015, sendo objeto do atual Contrato nº 015/2021. Esse projeto, em síntese, prevê a construção de 73.151 m² de pavimentação e de 451 m de drenagem.

Ademais, foram contratadas no final de 2020, a elaboração dos projetos executivos: 1) de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (Contrato nº 015/2020) e 2) de infraestrutura urbana da bacia 3, do trecho 3 e áreas remanescentes, bem como a infraestrutura urbana do Trecho 1 e áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (Contrato nº 016/2020). Essas contratações possibilitaram a autorização de certames para a conclusão do empreendimento (Concorrência nº 009/2021, 012/2021 e 013/2021 – DECOMP/DA).

Localização - Setor Habitacional Sol Nascente

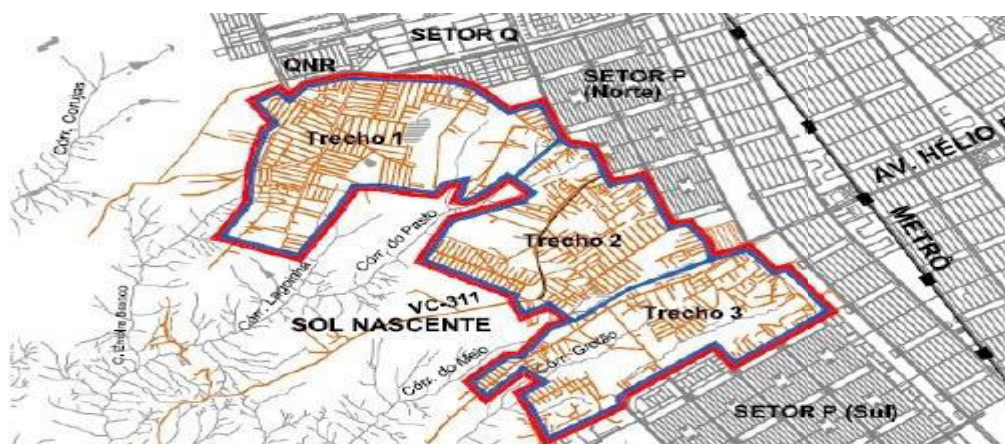

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF:

Posição do 6º Bimestre/2021- Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública/Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no DF

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa no SAG	Situação
Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2). (CT 003/2017)	DF	0027	Normal
Implantação Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF. (CV 001/2017)	DF	0028	Normal
Manutenção do sistema de iluminação pública no Distrito Federal. (004/2018)	DF	0029	Concluída
Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de iluminação do Distrito Federal. (CT 002/2017)	DF	0030	Concluída
Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal. (CT 003/2017 e Conv. 001/2017)	DF	0074	Concluída
Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal. (CT 003/2017 e Conv. 001/2017)	DF	0075	Concluída
Manutenção do sistema de iluminação pública. (CT 004/2018)	DF	0076	Concluída
Iluminação no complexo urbanístico - Torre de TV. (CT 003/2017 e Conv. 001/2017)	DF	0079	Concluída
Manutenção do Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. (CT 004/2018)	DF	0085	Concluída
Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. (CT 002/2017)	DF	0086	Concluída

Ação/Subtítulo 1836.0023 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública:

- Contrato nº 003/2017 - Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos as built (Etapa 2), que visa proporcionar a execução de obras de Implantação, Expansão e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no Distrito Federal. Neste exercício foram realizados 12 projetos (Etapa 1 e Etapa 2).

Convênio nº 001/2017 - Celebrado entre a SODF e a CEB para execução das obras de expansão, implantação e melhorias no Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, a serem realizadas por empresas contratadas pela CEB mediante procedimento licitatório para este fim e conforme demanda apresentada pela SODF, sem que sobre tais custos incidam quaisquer despesas da CEB, com exceção, única e exclusivamente, de tributos eventualmente devidos pela emissão de fatura pela CEB à Secretaria de Obras.

Os instrumentos contratuais citados apresentam as seguintes realizações:

15.752.6209.1836.0023 - Institucional SODF (demandas indicadas para execução a partir da avaliação da Pasta). Fonte SAG (Etapas 0027, 0028 e 0079)			
Bimestre	Contrato nº 003/2017 (Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF.)	Convênio nº 001/2017 (Implantação Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF a serem realizados por empresas contratadas pela CEB.)	
	Projetos	Pontos de Iluminação	Luminárias
1º	01	99	127
2º	00	00	00
3º	02	428	966
4º	07	528	1.225
5º	01	043	067
6º	01	082	266
Total	12	1.180	2.651

Ações/Subtítulos: 1836.7037 e 1836.7038 (Emendas Parlamentares) e **1836.0105** (Descentralizada pela SEEC/DF)

O Contrato nº 003/2017 e o Convênio nº 001/2017 também foram utilizados para a execução de intervenções indicadas por meio de duas Emendas Parlamentares (Ação/Subtítulos: **1836.7037** e **1836.7038**) e para continuidade das ações institucionais a partir de créditos descentralizados pela SEEC/DF (Ação/Subtítulo **1836.0105**), o que resultou na elaboração de 10 projetos, na implantação de 138 pontos de iluminação pública e na instalação de 421 luminárias, conforme especificado no quadro abaixo:

Emenda Parlamentar

Emendas Parlamentares - Programas de Trabalho 15.752.6209.1836.7037 e 25.752.6209.1836.7038	
Localidade	Realizações
Rua das Palmeiras e na Rua dos Pinheiros, Ponte Alta Norte - Gama.	02 projetos e 67 luminárias
SQN 412, Asa Norte - Plano Piloto.	02 projetos, 269 luminárias e 138 pontos de iluminação

- Descentralização – (SEEC/SODF) - Portaria nº 034, de 02/08/2021, DODF nº 147, de 05/08/2021

Demandas custeadas pela descentralização de créditos – Programa de Trabalho 15.752.6209.1836.0105 - SEEC/DF - Portaria Conjunta nº 034, de 02/08/2021, DODF nº 147, de 05/08/2021	
Localidade	Realizações
Área de intervenção relativa à implantação de pavimentação e de construção da OAE que liga a Rua 4 à Avenida Misericórdia, no Setor Habitacional Vicente Pires.	02 projetos e 22 luminárias
Setor de Rádio e Televisão Sul - Plano Piloto.	02 projetos e 63 luminárias
Praça do Povo, em Brasília/DF.	01 projeto
Ao longo da Ponte, que liga o Jockey à marginal da Via Estrutural.	01 projeto
Iluminação pública na "Rota de Segurança", Setor de Inflamáveis, SIN	-

Ação/Subtítulo 8507.6471 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no DF. Nesta ação foram executados os serviços de fornecimento de energia elétrica e respectiva manutenção do sistema de iluminação pública no Distrito Federal, a partir de recursos originalmente alocados no orçamento desta Secretaria. Todavia, devido aos efeitos do Decreto nº 41.991, (DODF de 13/04/2021), relativo à transposição de créditos desta SODF para SEEC/DF, esses serviços também foram custeados pela Ação/Subtítulo 8507.0040, a partir de descentralizações orçamentárias formalizadas.

Ação/Subtítulo 8507.0040 - Consignada no QDD desta Secretaria no modo Gestão, mediante atos conjuntos de descentralização orçamentária entre a SEEC/DF e a SODF, a saber: Portarias Conjuntas nºs 25, DODF de 25/05/2021; 29, DODF de 28/06/2021; 33, DODF de 28/07/2021; 36, DODF de 27/08/2021 e 43, DODF de 28/09/2021. Todavia, houve nova transposição efetivada por meio do Decreto nº 42.657, (DODF 27/10/2021), e, diante do retorno de parte dos créditos ao Programa de Trabalho original integrante do QDD desta Unidade Orçamentária restou desnecessária, a partir de outubro/2021, a continuidade do procedimento de descentralização entre as partes.

Contrato nº 002/2017 - Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de energia elétrica do sistema de iluminação pública no DF. A sua execução correspondeu ao fornecimento de 408.641.485 kwh.

Contrato nº 004/2018 - Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal. PIP, que compreende a gestão dos serviços, consultoria técnica-operacional, engenharia de manutenção, operação manutenção preditiva, preventiva e corretiva, além da execução de substituição de luminárias convencionais por LED (Eficientização). Em 2021 foi realizada a manutenção de 3.722.231 pontos de iluminação pública e eficientizadas 6.466 luminárias.

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)			
Mês	Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP)		Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica e utilização de postes para instalação do sistema de iluminação pública).
	Quantidade de Pontos Mantidos (unidade)	Luminárias Eficientizadas (unidade)	Consumo de Energia (KWH)
janeiro	305.758	-	34.700.875
fevereiro	305.758	-	31.312.752
março	310.151	-	38.984.667
abril	179.469	-	22.333.771
maio	177.347	-	14.646.016
setembro	307.392	970	32.965.674
outubro	307.486	05	33.980.495
novembro	307.811	12	32.897.492
dezembro	307.832	42	33.988.282
Total	2.509.004	1.029	275.810.024

Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.0040 (Institucional SEEC/DF)			
Mês	Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP)		Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica e utilização de postes para instalação do sistema de iluminação pública).
	Quantidade de Pontos Mantidos (unidade)	Luminárias Eficientizadas (unidade)	Consumo de Energia (KWH)
abril	131.432	-	11.237.337
maio	307.225	1.373	34.644.962
junho	307.251	2.505	33.307.406
julho	337.303	727	34.226.296
agosto	307.363	832	34.061.476
Totais	3.722.231	6.466	408.641.485

Relaciona-se, adiante, as localidades contempladas com serviços de efficientização de luminárias, executadas por meio do Contrato nº 004/2018:

Localização	Região Administrativa
SHTN Trecho 2 - Vila Planalto; SGAN 601 - L2 Norte; Setor de Embaixadas Norte Qd. 803; Praça dos Cristais; Avenida do Exército - SMU; Arredores da Praça do Povo - SCS e SGAN 906/907 Bloco A.	Plano Piloto
Vila DVO; QD 50 - Setor Leste e Avenida São Francisco - Ponte Alta	Gama
QNL - Chaparral "total" e Faixa verde entre as QSDs Impares	Taguatinga
QNM 2,4,19	Ceilândia
Quadras 01 a 07 - Vias principais - Jardim Roriz	Planaltina
SQPS e SOF Sul	Guará
AC.300, 218 e CL.118, 209 e 316	Santa Maria

Av. São Bartolomeu - Capão Comprido e Acessos a Rua 30A - Setor Tradicional	São Sebastião
Alça do viaduto sobre a EPIA Sul	Candangolândia
SH Água Quente - Trecho 1	Recanto das Emas
Vila Basevi; Campo Sintético - AR 03	Sobradinho II
Quadras 01 e 02	Itapoã
Chácara 13 - Rua do Mato - Fercal	Fercal
Bairro Pôr do Sol Completo e QNR 1 - Restaurante Comunitário - Sol Nascente	Sol Nascente e Por do Sol

Ação/Subtítulo 8507.6494 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública de Emenda Parlamentar, efetivada por intermédio do Contrato nº 004/2018, realizou-se a efficientização de 608 luminárias, em diversas ruas e Avenidas de Sobradinho II.

Emenda Parlamentar - Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.6494 - Manter Sistema de Iluminação Pública nas Regiões Administrativas do Distrito Federal - Contrato nº 004/2018	
Localização	Realizado (unidade)
Em várias ruas e avenidas de Sobradinho II	608 luminárias

Emenda Parlamentar:

Para a utilização dos recursos oriundos de Emendas Parlamentares Distritais (Fonte 100) destinadas a custear intervenções pertinentes ao Parque de Iluminação Pública, tem sido adotado o procedimento de aditamento aos Contratos já celebrados entre a SODF e a CEB. Portanto, a partir da liberação de Emenda destinada a tal fim, há a necessidade de rito processual de celebração de termos aditivos, iniciando-se esse processo com a comprovação de desbloqueio da referida emenda no Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) desta Secretaria.

A atual Subsecretaria de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos - SUITEC, desta SODF, setor responsável pela coordenação de todo o processo, atua nas tratativas junto às assessorias dos parlamentares para se obter esclarecimentos adicionais acerca das demandas a serem custeadas pelos recursos disponibilizados, procedendo à atualização das informações necessárias para o Gabinete/SODF e demais setores do GDF, visando à programação das intervenções com a utilização dos recursos disponibilizados.

Não obstante a adoção de aditamentos aos contratos vigentes, para contemplar as demandas previstas nas Emendas, constatam-se dificuldades para a sua execução total no exercício, ressalta-se que houve descentralização de créditos à Administração de Samambaia, realizada por meio da Portaria Conjunta nº 12/2021, (DODF de 28/10/2021), firmada entre esta SODF e àquela Administração Regional, todavia, até o encerramento do exercício, não se constatou a efetiva utilização dos recursos transferidos.

Contrato de Concessão:

No ano de 2020, por força do Decreto nº 40.898, de 17/06/2020, foi celebrado entre a SODF e a Companhia Energética de Brasília – CEB, o Contrato de Concessão nº 001/2020, que tem por objeto "a delegação pelo Poder Concedente, por meio de concessão administrada, da prestação dos Serviços de Iluminação Pública, à Concessionária e contratados de atividades inerentes, acessórias ou complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste Contratos e dos anexos". O contrato foi assinado em 20/07/2020 e possui o prazo de 30 (trinta) anos.


Ocorre que sua eficácia e início de vigência dependem dentre outras providências, do repasse pela SEEC/DF dos recursos da CIP, à delegatária CEB, conforme previsto no art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 40.898/2020. Vale destacar, que, na tentativa de viabilizar a execução das determinações contidas no Decreto nº 40.898/2020, esta Secretaria realizou, em 20/08/2020, consulta à SEEC/DF (00110-00002207/2020-97) e suas Secretarias Executivas de Orçamento - SEORC/SEEC e de Fazenda - SEF/SEEC para solicitar providências acerca da dinâmica operacional de cunho orçamentário, financeiro e contábil a ser envidada, em decorrência do Decreto 40.898/2020 e do Contrato de Concessão nº 001/2020. Até o encerramento do exercício de 2021, não houve orientação conclusiva por parte dos setores competentes do órgão central de Planejamento e Orçamento do DF.

Sobre o denominado Plano de Transição Operacional – PTO, no que se refere sobretudo à obrigação de transferência dos bens vinculados, o prazo para realização do levantamento de ativos foi prorrogado em mais 180 dias, todavia, deverá haver repactuação desse prazo devido à situação de certame, sob a gestão da CEB, ainda não finalizado, referente à contratação de empresa avaliadora especializada para definir o valor do patrimônio de iluminação pública do Distrito Federal, obrigação essa, prevista no art. 4º do Decreto nº 40.898/2020. A última informação da CEB sobre a licitação em questão consta do teor da Carta nº 319/2021 - CEB-H/PR (74352431) de 18/11/2021.

Cumprir registrar, também, que esta SODF formalizou em 23/07/2021, por meio do processo 00110-00002082/2021-86, proposta da mudança de titularidade do Contrato nº 002/2017, alterando o representante do GDF da SODF para a SEEC/DF, tendo em vista que a SEEC/DF é a unidade detentora dos recursos arrecadados com a CIP. Não se obteve manifestação sobre a alteração proposta até o encerramento de 2021.

Ressalta-se, ainda, que esta SODF aguarda as providências e orientações pertinentes aos órgãos envolvidos, para que possa exercer seu papel determinado no Decreto nº 40.898/2020 e no Contrato de Concessão nº 001/2020, que é o de fiscalizar a concessão.

A seguir, algumas fotos dos trabalhos realizados pela SODF/ CEB:

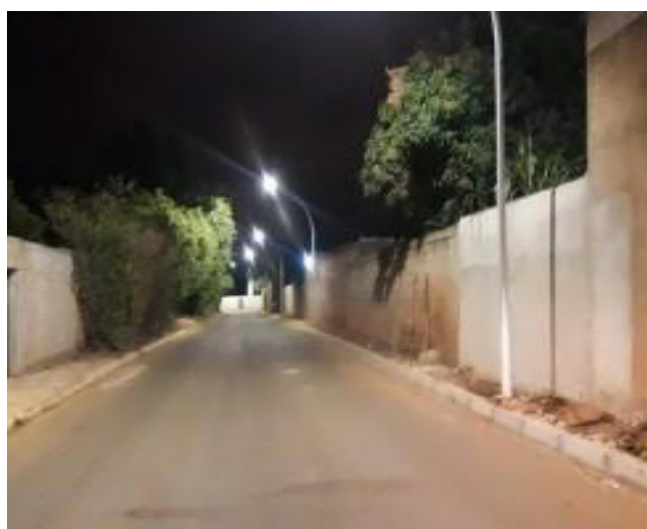


Ação/Subtítulo 3089.0002 - Requalificação de espaços urbanos – Avenida W3 Sul. As intervenções concluídas e em fase de conclusão, demandaram recursos na ordem de R\$ 19.066.743,00. No quadro a seguir, apresenta-se o panorama da Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos (W3 Sul):

Revitalização da Avenida W3 Sul		
Quadras	Contrato	Situação

		2019	2020	2021
502 e 503	004/2021	-	Contratação prevista para o início de 2021	Concluída: (5º bimestre)
504, 505 e 506	005/2021	-	Contratação prevista para o início de 2021	Concluída: (6º bimestre)
507 e 508	002/2021	-	Contratação prevista para o início de 2021	Concluída: (4º bimestre)
509 e 510	002/2020	-	Concluída (5º bimestre)	-
511 e 512	001/2019	Concluída (5º bimestre)	-	-
513 e 514	022/2020	-	A ser Iniciada	Concluída: (6º bimestre)
515 e 516	011/2021	-	A ser Iniciada	Conclusão prevista para o início de 2022
703 a 715 - Requalificação de calçadas	-	-	-	Em procedimento licitatório
Restauração do pavimento	-	-	-	Em procedimento licitatório


Contrato nº 004/2021 - W3 Sul, Quadras 502 e 503

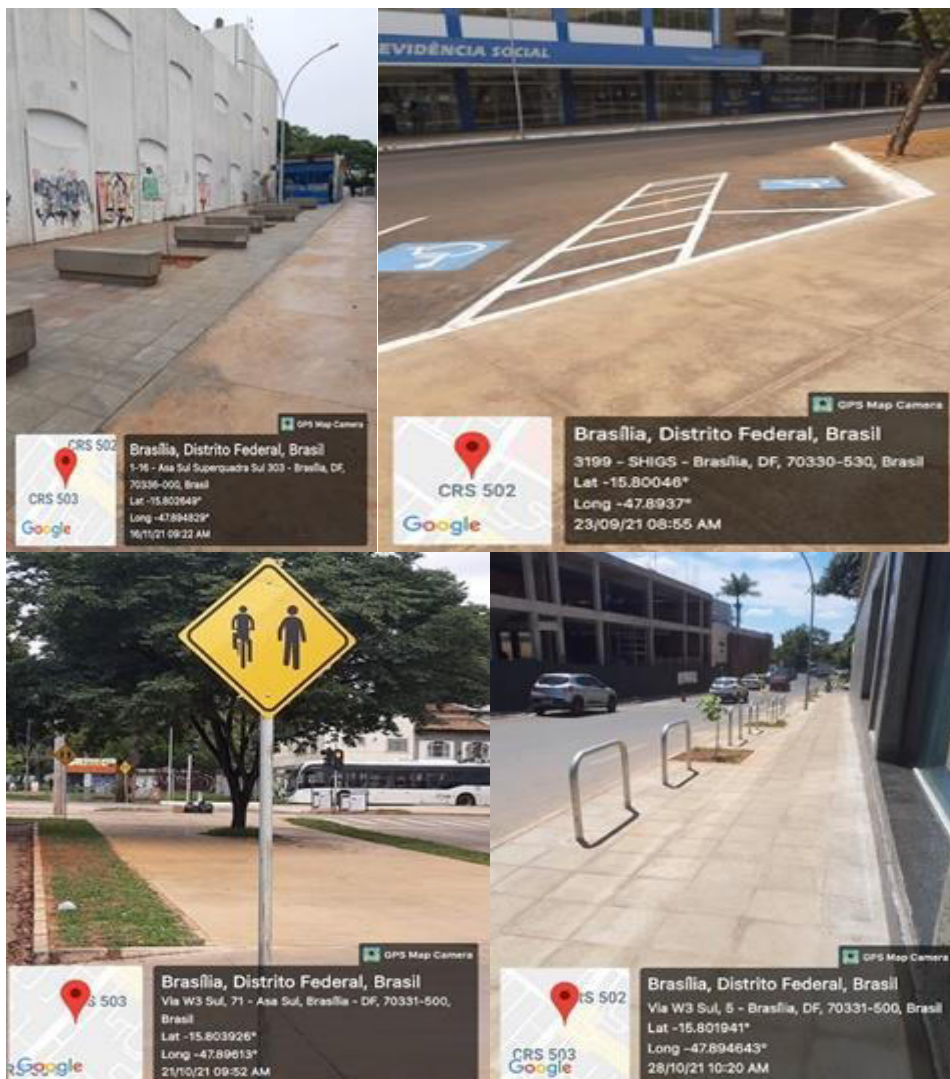

Contrato nº 005/2021 - W3 Sul, Quadras 504 a 506




Contrato nº 005/2021 - W3 Sul, Quadras 507 e 508

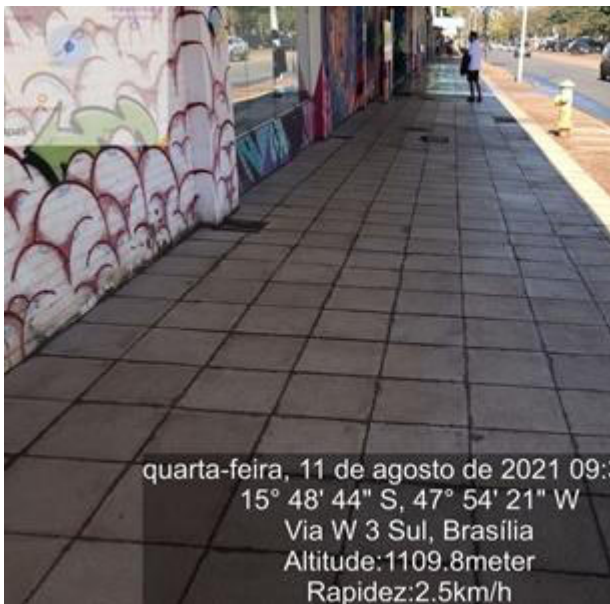

Contrato nº 022/2020 - W3 Sul, Quadras 513 e 514



Contrato nº 011/2021 - W3 Sul, Quadras 515 e 516

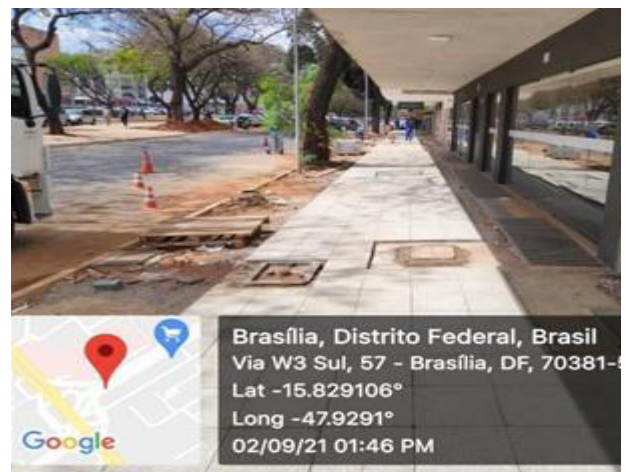

Ação/Subtítulo 3056.0001 – Gestão da Fiscalização e Supervisão de Obras:

Supervisão e acompanhamento das obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga, de Remodelação da Avenida Central e do Viaduto da Avenida Samdu e da elaboração de seus respectivos projetos executivos – Contrato nº 018/2020: Serviços iniciados no 6º bimestre/2020 para a supervisão e acompanhamento das obras do contrato nº 004/2016. Compreendem as análises de projetos e acompanhamento diário das atividades executadas pelo Consórcio Novo Túnel (acompanhamento, verificação e aprovação dos projetos executivos; o acompanhamento da elaboração do Diário de Obra da construtora; supervisão da execução dos serviços, aferindo quantitativos e medições; aprovação e liberação das etapas de obra; proposição de solução para eventuais problemas e imprevistos; verificação e validação dos ensaios tecnológicos e das instrumentações geotécnicas; execução do controle físico-financeiro da obra; acompanhamento das condições de segurança e ambiental e implantação de ações mitigadoras; elaboração de relatórios mensais, parciais, eventuais e finais). Foram entregues, em 2021 pela contratada, um Relatório de Atividades por mês, totalizando 12 no ano.

Supervisão e apoio técnico nas obras de implantação do Viaduto da EPIG e Alças de acesso a infraestrutura urbana - Eixo Oeste - Contrato nº 018/2021: Serviços iniciados no 4º bimestre/2021 para a supervisão e acompanhamento das obras do contrato nº 020/2021, que tem por objeto a execução das obras da interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade (Viaduto da EPIG). Compreendem as análises de projetos e acompanhamento diário das atividades executadas pelo Consórcio Viaduto da EPIG (estudos preliminares, verificação dos projetos executivos, acompanhamento da execução das obras, elaboração do Manual, Uso e Operação da Rodovia e elaboração do projeto de "as built"). Foram entregues, em 2021 pela contratada, 04 Relatórios de Atividades, um a cada mês.

Supervisão da obra de Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar – ESPM – Contrato nº 25/2021: Serviços iniciados no 6º bimestre/2021 com a celebração do Contrato nº 022/2021. Compreendem as análises de projetos e acompanhamento diário das atividades executadas pelo Consórcio G5 ESPM (fiscalizar os serviços específicos, representar o poder público, decidir questões de interpretação do projeto e análise dos detalhamentos construtivos necessários às obras; especificações e normas, avaliar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais empregados e dos serviços executados, verificação topográfica, serviços de laboratórios de solos, concreto e asfalto, relatórios fotográficos das obras, monitoramento das construções existentes circunvizinhas (edificações), acompanhamento e supervisão na execução da obra do Tunnel Liner e da Bacia de Detenção, monitoramento ambiental, desvio de trânsito e engenharia de trânsito, consulta às concessionárias, aprovação de projeto nos órgãos competentes e elaboração do projeto "as built", assim como do produto acabado; acompanhar as diversas etapas da adequação dos projetos executivos, aprovação e verificação de suas qualidades técnicas, além do acompanhamento de sua execução e acompanhar a revisão/readequação dos projetos em fase de obras.

Ação/Subtítulo 3855.0001 – Gestão ambiental na execução de obras e na implementação das políticas de saneamento:

Pagamentos de: 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da Av. Hélio Prates; 01 taxa de autorização de transporte de matéria de supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de Inflamáveis; 01 taxa de prorrogação da autorização de supressão vegetal relativa a obra do Túnel de Taguatinga/viadutos acessórios e 01 taxa de análise de autorização de corte de árvore isolada para obra do Viaduto EPIG.

Ação/Subtítulo 7316.6035 – Implantar sistema de esgotamento sanitário. Valor consignado em 2021, insuficiente para planejar intervenções. Ademais, as obras do tipo em questão tem sido implementadas pela Caesb.

Ação/Subtítulo 9115.0001 – Transferência de Recursos da RIDE – DF Entorno - Nesta ação orçamentária seriam realizados os repasses financeiros efetivados, devido à participação do

GDF no Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás - Cor sap-DF/GO. Porém, esta ação restou não iniciada no exercício, essa ocorrência deveu-se pela saída do DF do mencionado Consórcio, formalizada em Ata da AGE realizada em 23/06/2021. A competência para o aludido ato de retirada do DF foi delegada ao Secretário desta SODF, pelos efeitos do Decreto nº 42.189, DODF de 11/06/2021.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	METRO QUADRADO		01/01/2001	Anual	208570,00	252634,00	55319,00	241199,00	192203,00	X	X	X	SUAF/SODF E NOVACAP/ UO 22101 / OE 211
<p>Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o índice alcançado, como, Revitalização da W3 Sul - Quadras 509 e 510 Sul e a Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, no Plano Piloto. Além de outras intervenções de execução de pavimentação realizadas pela NOVACAP, na Av. dos Pioneiros, no Gama.</p> <p>2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e as obras remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado (Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e Via MN1 e, Revit. W3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. Destaca-se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021 - DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (CC 001/2021-DECOMP/DA); Av. Paranoá (CC05/2021 - DECOMP/DA), do SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 - DECOMP/DA).</p>													
10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	METRO		01/01/2001	Anual	20680,00	20241,00	14416,00	11213,00	4835,00	X	1650,00	X	SUAF/SODF E NOVACAP/ UO 22101 / OE 211
<p>Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o resultado de, aproximadamente, 98% do índice almejado, como, Revitalização da W3 Sul - Qds. 509 e 510; Trecho Rota de Fuga, no Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul e Execução de Canal e Bueiro N.A.T.M., em Porto Rico - Santa Maria. Além de outras pequenas intervenções de execução e ampliação de Redes de Drenagem realizadas pela Novacap, em diversos locais do DF. A pequena diferença em torno de 2%, perante o índice almejado, deu-se, sobretudo, em razão dos certames em trâmite, no exercício de 2020, relacionados aos empreendimentos diretamente vinculados aos indicadores previstos.</p> <p>2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as obras remanescentes contratadas em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela Novacap no DF. Apesar dos esforços envidados, constata-se que o resultado não se efetivou conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades em se prever as quant. exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, em 2022, de incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga</p>													

OBJETIVO O211: Executar obras de urbanização e infraestrutura, tais como, drenagem pluvial, pavimentação de vias, execução de calçadas, assentamento de meios-fios, urbanização de áreas públicas, tratamento paisagísticos, recuperação ambiental, manutenção, conservação e modernização das áreas já urbanizadas em diversos locais do Distrito Federal.

Os resultados alcançados, pertinentes ao Objetivo Urbanização e Infraestrutura, do Programa Temático 6209 – Infraestrutura, refletem os dados apurados e consolidados pela Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização – SUAF/SODF e pela Diretoria de Urbanização da Novacap. Foram continuadas as obras iniciadas em anos anteriores, de infraestrutura nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão e contratadas as intervenções remanescentes de urbanização e infraestrutura nos Setores Habitacionais Sol Nascente e Vicente Pires. Além disso, outras intervenções contribuíram para os índices alcançados, tais como: Trecho Rota de Segurança, no Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, Revitalização da W3 Sul (Quadras 502 a 508 e, 515 a 516) e Requalificação da Via MN1 – Hélio Prates. Na obtenção do resultado alcançado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de drenagem e de pavimentação, em diversos locais do Distrito Federal, realizadas pela Novacap.

Apesar de todos os esforços envidados, constata-se que a execução de redes de drenagem, não se efetivou conforme previsto. Isto deveu-se, de modo geral, segundo o setor técnico (SUAF/SODF) pelas dificuldades em se prever as quantidades exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura, tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto. No entanto, verifica-se a conclusão em 2021 de grandes obras de drenagem pluvial, a saber: Construção da bacia de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M (New Austrian Tunnelling Method) no km 4 da DF-290, em Santa Maria – DF, concluída em 2021, além da construção de bacias de detenção em Bernardo Sayão e em Vicente Pires.

Ademais, soma-se às questões de ordem técnica, administrativa e climáticas, a não concretização de desfechos esperados de procedimentos licitatórios e respectivas contratações de grandes obras, cujas intervenções iriam impactar positivamente no resultado, tais como, as contratações de intervenções remanescentes de infraestrutura nos Setores Habitacionais Bernardo Sayão, Sol Nascente e Vicente Pires (Remanescente), e também a reestruturação do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras Complementares em Taguatinga e no Plano Piloto (Drenar DF).

Destaca-se para os próximos exercícios de vigência do PPA 2020-2023 que há perspectiva de incremento das metas e indicadores em função de procedimentos licitatórios e respectivas contratações, em andamento, que irão impactar positivamente no resultado, tais como as de urbanização dos Setores Habitacionais: Sol Nascente (Concorrências nº 009/2021 - DECOMP/DA (Remanescente do Trecho 01 e parte do Trecho 03), 012/2021 - DECOMP/DA (Trecho 03/Lote 01) e 013/2021- DECOMP/DA (Trecho 03/Lote 02), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (Concorrência nº 001/2021 - DECOMP/DA); a Revitalização da Av. Paranoá (Concorrência nº 005/2021 - DECOMP/DA); Revitalização do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (Concorrência nº 010/2021 - DECOMP/DA) e a Reestruturação do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras Complementares em Taguatinga (Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA), cuja contratação para elaboração dos projetos encontra-se em licitação.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3720 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR	1943255,0	1941314,00	0	0
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-Projeto e Instalação de Usina Fotovoltaica-DISTRITO FEDERAL	1943255,0	1941314,00	0	0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	1943255,00	1941314,00	0,00	0,00

Ação/Subtítulo 3720.0002 - Implantação do Programa Brasília Solar - Projeto e instalação de usina fotovoltaica - DF - Contrato de Repasse - Proposta nº 004.4727/2020, rejeitada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	40364002,0	136904542,0	107810727,17	103963867,39
0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA	40364002,0	136904542,0	107810727,17	103963867,39
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	10000,0	474336,0	463967,60	42451,89
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL	10000,0	474336,0	463967,60	42451,89
3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	67920154,0	58094348,00	18737420,70	10795832,86
0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	67920154,0	58094348,00	18737420,70	10795832,86
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	666516,0	0,00	0	0
4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL	666516,0	0,00	0	0
4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.	730000,0	0,0	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0001 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL	730000,0	0,0	0	0
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	666513,0	0,00	0	0
7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL	666513,0	0,00	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	110357185,00	195473226,00	127012115,47	114802152,14

Posição do 6º Bimestre/2021

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6216	Cidade	Etapas SAG	Situação
Construção de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária da Avenida e do viaduto da Samdu (CT 004/2016)	Taguatinga	0031	Normal
Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga (CT 005/2020)	Taguatinga	0032	Normal
Obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul - TAS (CT 009/2020)	P. Piloto	0033	Normal
Ampliação e Readequação do Reservatório do Parque Sarah Kubitschek (CT 003/2021)	P. Piloto	0040	Atrasada
Requalificação Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (CT 014/2021)	DF	0073	Atrasada
Obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (CT 020/2021)	Sudoeste	0083	Normal
Reformulação do sistema viário na estrada do Setor Policial Militar (ESPM), trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (CT 022/2021)	P. Piloto	0084	Normal
Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de construção do Túnel de Taguatinga (CT 004/2016)	Taguatinga	0093	Concluída

As ações principais previstas para serem implementadas por meio deste programa integram o escopo de contratos de repasse e de operações de crédito celebrados com a Caixa em exercícios anteriores, visando à Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Linha Verde), na Região Oeste e a Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga. Assim, os valores consignados com base nesses instrumentos representaram 98,12% da Dotação Inicial e 99,76% da Despesa Autorizada, o que torna o desempenho do Programa absolutamente dependente das intervenções previstas no Corredor Eixo Oeste. Destacam-se, a seguir, as ações do Programa 6216 em 2021:

Ação/Subtítulo 3054.0002 - Construção de Túnel - Rodoviário na Av. Central de Taguatinga - Contrato nº 004/2016-Sinesp - Importante intervenção para o DF, retomada em fevereiro de 2020, após destraves jurídicos desta gestão, as obras de construção do Túnel de Taguatinga, que integra o Corredor de Transporte Rodoviário Eixo Oeste, avançaram bastante em 2021, totalizando o acumulado de 51,68% de execução. O Túnel Rodoviário, com extensão aproximada de 980 metros, a ser implantado sob a Av. Central, terá as seguintes características:


- Emboque - Trecho com extensão de 150m, constituído por duas pistas de tráfego com laje de fundo, com espessura= 0,50m e paredes diafragma em balanço nas extremidades, constituídas por lamelas de 0,50 x 2,50m com contraforte longitudinal de 0,50 x 2,50m. Adjacente à entrada dos túneis serão locadas as vigas do pergolado de travamento das paredes laterais, com seção transversal de 0,50 x 1,0m, no total de 11 vigas espaçadas a cada 3,0m.
- Túneis Simples - Em sequência ao emboque inicia-se 2 túneis simples, com extensão de 140m cada. A cobertura está definida como laje maciça de 1,0m de espessura com extensão aproximada de 72m e a seguir laje nervurada com vigas de 0,50 x 1,80m a cada 3,50m com laje superior com 0,25m de espessura, ambas com 12,95m de vão

livre interno e, apoiadas nas paredes diafragma, constituídas por lamelas de 0,50 x 3,20m.

- Túnel Duplo - Com extensão de 550m a cobertura será executada com laje nervurada contínua com vigas de 0,50 x 1,80m a cada 3,50m com laje superior com 0,25 m de espessura, com dois vãos internos de 12,95m e, apoiadas nas paredes diafragma externas e central constituídas por lamelas de 0,50 x 3,20m.
- Trecho Final - Com extensão de 140m o trecho final é constituído por dois túneis simples, sendo que a laje de cobertura inicial com extensão de 39,0m será executada com laje nervurada e o restante com laje maciça.

Após a conclusão dessa intervenção, Taguatinga terá sua área central totalmente remodelada a partir da sua implantação que inclui a criação de um Boulevard arborizado, com calçadas acessíveis e estacionamentos. Também permitirá a fluidez do trânsito para Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente e Pôr do Sol, equacionamento dos problemas de trânsito, diminuindo o tempo de viagem para a região e entorno, beneficiando os moradores dessas regiões.

Durante 2021, em síntese, foram executados, serviços relacionados à elaboração dos projetos executivos, execução das contenções provisórias, paredes diafragma, vigas e lajes, escavações, desvios de tráfego, drenagem de águas pluviais, instrumentação, cimbramento, demolições, caminhos de serviço, entre outros. Destaca-se a finalização da concretagem das lajes de topo, sinalizadas em amarelo no croqui abaixo, bem como o início da concretagem das lajes de fundo e escavação invertida:

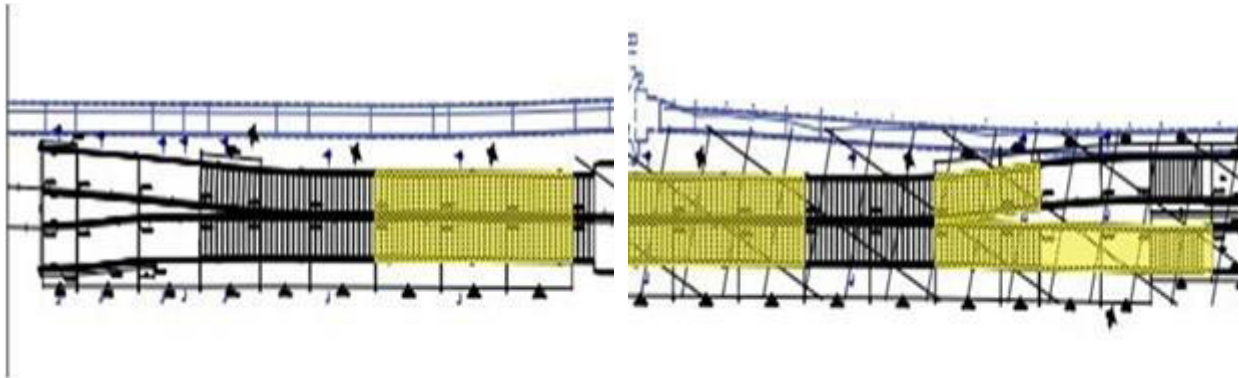


Contrato nº 004/2016 – Túnel de Taguatinga





Execução de formas da laje de topo

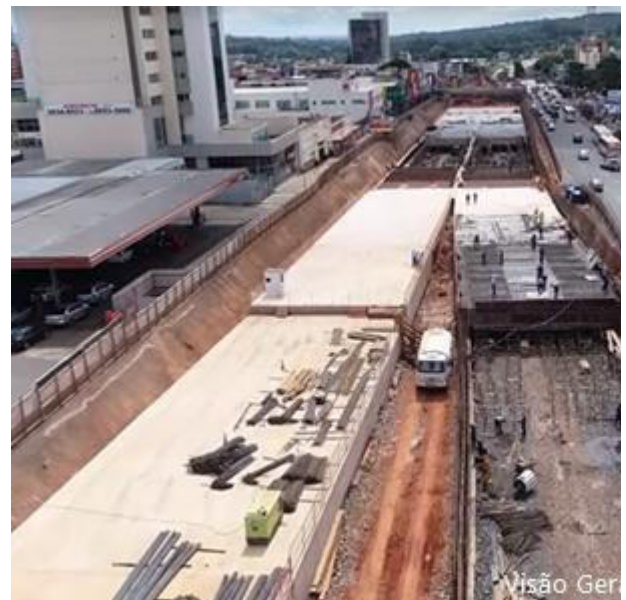

Visão Ger



Cimbramento



Cura da laje



Laje de fundo

27 de nov de 2021 12:08:24
15.49.55.0012 S - 48.37.00517 W
30 Avenida Central
Fazenda
Basilis
Distrito Federal

Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga - Contrato nº 005/2020 – Contrato com andamento normal, encerra 2021 com 80% dos serviços executados.

Ação/Subtítulo 3087.0001 – Execução de Obras de Acessibilidade – Execução de calçadas na Asa Sul – Contrato nº 007/2016 – A execução orçamentária realizada correspondeu ao pagamento mediante reconhecimento de dívida de despesas executadas em exercícios anteriores.

Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste: O Corredor de Transporte Público do Eixo Oeste do Distrito Federal, consiste na implantação de um sistema de transporte coletivo de caráter tronco-alimentador, com o intuito de incorporar benefícios à população usuária advindos da elevação da velocidade operacional e, por conseguinte, dos tempos de viagem. Após intenso trabalho da equipe de projetos foi possível dar continuidade a certames que sofreram interrupções em anos anteriores, tendo realizada a instrução para o saneamento de diversas questões técnicas apontadas por órgão de controle, o que possibilitou o desfecho de licitações e a respectiva contratação das seguintes intervenções em 2021: Ampliação e Readequação do Reservatório do Parque Sarah Kubitschek (Contrato nº 003/2021); Requalificação da Avenida Hélio Prates – Trecho 1 (Contrato nº 014/2021); do Viaduto da EPIG (Contrato nº 020/2021), a Reformulação da ESPM entre a EPIG e o Viaduto da W3 (Contrato nº 022/2021). As intervenções de Requalificação da Avenida Hélio Prates – Trecho II; Transversais Samdu e Comercial (projetos); Obras de Drenagem em Taguatinga - Drenar (projetos) e da Requalificação da EPIG - Trecho SIG e Trechos restantes encontram-se em fase de licitação.

⇒ Apresenta-se a seguir a situação dos contratos firmados:

- Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - Contrato nº 009/2020. Intervenção iniciada em maio/2020. Devido à necessidade de adequação de projetos e ajustes no contrato, este, se manteve suspenso até 24/05/2021, no entanto, durante o período de suspensão, os serviços de escavação, carga e transporte do material continuaram com equipes e máquinas da Novacap. Executado em 2021, em síntese: fundações com perfuração, armação e concretagem de estacas; arrasamento das estacas; armação, montagem das formas, concretagem e após desforma, impermeabilização das vigas baldrames e, execução dos pilares e arrimos (paredes) dos viadutos. Encerra o exercício com o acumulado de 37% dos serviços executados.

Contrato nº 009/2020





Ampliação e readequação do reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto - Contrato nº 003/2021 – Intervenção iniciada em 16/03/2021, que consiste na ampliação da capacidade de acumulação da bacia de detenção existente, por meio do aumento de sua área para atender o escoamento pluvial proveniente do Viaduto da EPIG e das vias W4 e W5, incluindo os lançamentos existentes. Devido a fatores climáticos, técnicos e administrativos, a intervenção encerrou o exercício com 57% dos serviços executados, todavia, com os serviços planejados em atraso.

Contrato nº 003/2021



Requalificação Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates Contrato nº 014/2021 – Iniciada em maio de 2021, a intervenção consiste na execução de drenagem pluvial, pavimento rígido, estacionamentos, além de calçadas, meios-fios, mobiliário urbano e paisagismo. Durante a execução do contrato da Av. Hélio Prates, foram detectados problemas e interferências que se demonstraram recorrentes desde o início das obras (interferências com redes da Caesb, Neoenergia e redes clandestinas; necessidade de negociação com chacareiros e proprietários dos lotes para execução das calçadas). Encerrou o exercício com 19,70% dos serviços executados.

Planta de situação



Contrato nº 014/2021



Execução das obras de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste – Contrato nº 020/2021 – Intervenção iniciada no 4º Bimestre de 2021, sendo implantado o canteiro de obras, executada a drenagem e o desvio de tráfego. Encerra 2021 com 12,34% dos serviços executados e em andamento normal.



Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul – Contrato nº 022/2021 – O Setor Policial Militar – ESPM integra os Setores Centrais da Asa sul, estando acessível pela via W3, e possuindo nas proximidades grandes centros hospitalares (Hospital Santa Lúcia, Centro Clínico Sul, Hospital Santa Luzia, Hospital PAI, Centro Médico de Brasília e OHB), além de estar contíguo ao Cemitério Campo da Esperança. Destaca-se a proximidade com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Academia de Polícia Militar de Brasília, em especial com a Polícia Federal, que demandam do setor boa acessibilidade dos veículos públicos às pessoas, o que será proporcionado com a execução da intervenção. Contempla adequações na via existente, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de detenção localizada na ARIE Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, Estrada Parque das Nações – Via L4. A obra iniciada em outubro/2021, apresenta estágio normal de execução (executados 0,38% dos serviços).

Contrato nº 022/2021





Placas da obra



Corte das árvores no local da bacia de detenção

Empreendimentos do Corredor Eixo Oeste:

Demonstra-se no Quadro abaixo as etapas dos empreendimentos que integram o Corredor Eixo Oeste:

Local das Obras	Situação das Intervenções			
	2018 (Até 31/12/2018)	2019 (até 31/12/2019)	2020 (até 31/12/2020)	2021 (até 31/12/2021)
ACESSO SOL NASCENTE / HÉLIO PRATES	Obra paralisada, com necessidade de revisão dos projetos executivos de drenagem; revisão do projeto executivo de pavimentação; calçadas e ciclovia.	Obra concluída, tendo havido a supressão do pavimento rígido de concreto devido a alterações no projeto do Eixo Oeste.	-	-

<p>AV. HÉLIO PRATES</p>	<p>Há necessidade de ajuste do projeto face às novas diretrizes da Semob;</p> <p>- Obra a ser executada depois de concluída a obra do Túnel;</p> <p>- O Trecho em concreto da Rótula, mencionada na intervenção anterior deverá ser executado quando da implantação do Corredor de Transportes na Hélio Prates como um todo.</p>	<p>- Iniciada a revisão do projeto pela execução dos SUPOP/SODF, devido as atuais diretrizes da Hélio Prates, em SEMOB, conforme ATA de reunião realizada em 21/11/2019 entre a SEMOB/SEDUH/SODF (Processo SEI nº 00110-00002071/2019-81), e solicitação de estudos do Comitê Intersetorial de Projetos.</p> <p>- O projeto está sendo revisado por etapas, e a primeira equivale a parte do Trecho 3 do projeto anterior, que vai do Sol Nascente a QNM1 e QNM2, trecho ajustado até o divisor de águas para compatibilizar a execução da obra com o projeto de drenagem. Os demais trechos serão desenvolvidos em sequência.</p>	<p>A Av. Hélio Prates teve seu projeto alterado resultando na divisão de projetos e obras em três etapas:</p> <p>Etapa I: Em licitação a execução dos serviços da Av. Hélio Prates, em Ceilândia, com a requalificação urbana, entre a Via N3 até a Via M1 (00110-00001782/2020-00002071/2019-81), e 7).</p> <p>Etapa II: Aprovação do Projeto de Sistema Viário - SIV, de requalificação da Av. Hélio Prates, Quadras QI 1 e QNG até a EPCT (Pistão Norte). Aprovação do SIV na SUPAR/Seduh e Detran. (00110-00002095/2020-74).</p> <p>Etapa III: Projeto de Requalificação da Via MN 1 - Av. Hélio Prates, da Via M1 as Quadras QNH e QI 10, em Ceilândia e Taguatinga. Projeto em desenvolvimento pela SODF.</p>	<p>Considerando a divisão da intervenção estabelecida em 3 Etapas, tem-se a seguinte situação:</p> <p>- Etapa 1: Obra contratada - Contrato nº 14/2021, no Valor R\$ 14.394.920,01</p> <p>- Etapa 2: Em fase de licitação - Concorrência nº 008/2021 - DECOMP/DA</p> <p>- Etapa 3: Projeto em desenvolvimento pela SODF</p>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>AVENIDAS SAMDU E COMERCIAL NORTE E SUL</p>	<p>- Norte: Projeto desenvolvido pela Segeth; projetos complementares em finalização pela Sinesp. - Sul: Projeto pronto aguardando aprovação do projeto de Sistema Viário - SIV pela Central de Aprovação de Projetos - CAP/SEGETH para concluir os projetos executivos complementares já contratados.</p>	<p>- Norte: Novas ações serão tratadas em 2020. - Sul: Em ajustes finais de projeto elaborados por empresa contratada para cumprir as exigências da SUPAR/SEGETH.</p>	<p>Considerando que as etapas do Túnel de Taguatinga e Hélio Prates estão em execução ou licitação, o lançamento de licitação inviabilizaria o trânsito e a gestão da cidade tendo em vista que a Av. Comercial e Samdu fazem a conexão entre os trechos citados. Portanto, a etapa Samdu Comercial necessita a compatibilização com a etapa de obra do Corredor Eixo Oeste. Definiu-se a estratégia de revisão e adequação dos projetos existentes para lançamento dos projetos executivos e posterior execução da obra.</p>	<p>A partir da premissa de compatibilizar as etapas das obras do Corredor Eixo Oeste, manteve-se atuação na estratégia de revisão e adequação dos projetos existentes para o lançamento dos projetos executivos e posterior execução da obra.</p>
<p>TRANSVERSAIS SAMDU E COMERCIAL</p>	<p>- Por força de Decisões do TCDF (nº 4752/2017 e nº 4754/2017), ao longo do exercício de 2018, mantiveram-se suspensas as Concorrências nº 015/2017-ASCAL/PRES e nº 016/2017 - ASCAL/PRES, cujos objetos eram, respectivamente, a Execução de Passeios e Acessibilidade em áreas dos Setores QNE, QNB, CNB de Taguatinga; incluindo as Ruas do SESC e dos Bombeiros, consistindo de intervenção integrante do denominado Binário das Avenidas Comercial e Samdu de Taguatinga e a Execução de Passeios e Acessibilidade em áreas dos Setores QSB e CSB de Taguatinga; incluindo Trecho à Igreja Nossa Senhora de Fátima, consistindo de intervenção integrante do denominado Binário das Avenidas Comercial e Samdu de Taguatinga. - Em síntese, àquela Corte de Contas determinou à Novacap a adoção de medidas corretivas que visam ajustar Projetos. - Em 22/11/2018, foi publicado o Aviso de Revogação dos certames em questão.</p>	<p>- Novas ações serão tratadas em 2020.</p>	<p>- Novas ações serão tratadas em 2021, com a provável contratação de obras e projetos integrados, a fim de dar continuidade na adequação dos projetos com o atual estágio do Corredor Eixo-Oeste.</p>	<p>- Em procedimento Licitatório a Elaboração dos Projeto das Vias Transversais Samdu/Comercial Norte. Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA - Do tipo Técnica e Preço (00110-00003128/2020-01).</p>

<p>DRENAR TAGUATINGA</p>	<p>-Certame homologado em 19/11/2015 (Concorrência de Pré-Qualificação Internacional nº 002/2012 - ASCAL/PRES).</p> <p>- Obra é imprescindível para a implantação dos projetos de revitalização das Avenidas Comercial e Samdu.</p> <p>- O TCDF determinou que a contratação está condicionada à ulterior deliberação, conforme alínea a), do item IV, da Decisão nº 2821/2018 - TCDF, reiterada pela Decisão nº 4999/2018 - TCDF.</p> <p>A instrução dos questionamentos foi apresentada àquela Corte de Contas, tendo em vista a manifestação daquele Órgão por meio das Decisões acima mencionadas.</p> <p>- Em que pese o tempo transcorrido da homologação do certame, considera-se que o Lote 1 mantém-se com condições técnicas para eventual contratação, mas os Lotes 2 e 3, poderão requerer novos certames, devido a alterações na composição original das empresas consorciadas vencedoras, à época, da licitação.</p> <p>- Haverá a necessidade de intervenção complementar para o recapeamento de Vias onde serão implantadas as redes de drenagem, com recursos previstos para a implantação do Corredor Oeste</p>	<p>Por meio de decisão datada de 16/08/2019 (26603079), o Secretário de Estado de Obras decidiu pela não adjudicação dos objetos licitados referentes aos Lotes 02 e 03 aos Consórcios GW/CD/CONESA/POLLO e ÁGUAS DE TAGUATINGA, respectivamente, no âmbito da Concorrência Internacional nº 002/2012 - ASCAL/PRES/Novacap, em razão da inabilitação das empresas consorciadas.</p> <p>- Quanto ao Lote 01, os setores de Acompanhamento e Fiscalização e de Projetos Orçamento e Planejamento de Obras estão encarregados da análise acerca da atualidade, exequibilidade e vantajosidade do projeto em questão.</p> <p>- Em 13/08/2019 foi publicada a Decisão nº 2669/2019 do TCDF, em que se reitera e solicita o efetivo cumprimento da Decisão nº 2821/2018, requer esclarecimentos conclusivos sobre as considerações e recomendação da PGDF em pareceres que tratam da matéria; e que apresentassem as medidas a serem adotadas relativas a licitação da intervenção, dentre outras determinações.</p> <p>- Em 16/08/2019, o Secretário desta Pasta decidiu pela não adjudicação dos objetos licitados referentes aos Lotes 02 e 03, em razão da inabilitação das empresas consorciadas. Em nova decisão de 16/09/2019, o Secretário manteve a decisão anteriormente proferida por seus próprios termos e encaminhou os autos à Casa Civil do Distrito Federal para julgamento do mérito pela autoridade superior</p>	<p>Houve constituição de Comissão instituída pela Portaria Conjunta nº 03, de 17/02/20, para analisar a viabilidade técnica de se efetivar a contratação das obras do Lote 01 - Execução de Drenagem Pluvial das Sub-Bacias I a VII, Programa - Águas do DF, em Taguatinga, nas Quadras QNA, QNB, QNC, QND, QNF, SC, QSA e QSB concluiu em seu relatório final que o projeto de drenagem pluvial deverá ser revisto e justificado, de forma a evitar a ocorrência de aditamentos financeiros durante a execução das obras. Diante disso, aguarda-se a publicação da revogação da concorrência referente ao Lote 1, para que, também, em 2021 seja contratada a elaboração e readequação de projetos.</p>	<p>Publicada em 22/03/2021, a revogação da concorrência referente ao Lote 1.</p> <p>- Em procedimento licitatório a Elaboração e Readequação de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana - Drenar DF. Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA - Do tipo Técnica e Preço (0110-00003128/2020-01).</p>
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>responsável para apreciar os recursos administrativos interpostos pelos consórcios participantes. Os recursos ainda aguardam julgamento pela Casa Civil.</p> <p>- Embora a SODF já tenha oficiado o TCDF sobre a decisão de não adjudicação dos objetos licitados referentes aos Lotes 02 e 03 e a provável revogação também da licitação referente ao Lote 01, que ainda está em análise pela área técnica da SODF quanto a atualidade, exequibilidade e vantajosidade do projeto em questão.</p> <p>- Há necessidade de revisão dos projetos relativos ao Lote 01 e de elaboração de novos projetos para os Lotes 02 e 03.</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>TÚNEL TAGUATINGA (ATÉ O VIADUTO DA EPTG)</p>	<p>- O Contrato nº 004/2016 - SINESP continua com sua execução suspensa nos termos indicados nas Decisões nºs 2375/2016 e 6393/2016 que determinou sobrestamento dos autos até o deslinde dos Processos n.º 2016.01.1.058212-0 e n.º 0015660-96.2010.403.6100.</p> <p>- Há necessidade de se elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.</p>	<p>- Considerando andamentos obtidos quanto às ações judiciais interpostas por licitantes que justificaram o sobrestamento da contratação determinado pelo TCDF, em 18/10/2019 esta Secretaria propôs ao TCDF análise relativa à solicitação de revogação da suspensão determinada desde 2016, no intuito de que a contratação celebrada no ano em referência pudesse ser retomada.</p> <p>- Em 12/12/2019 por meio do Ofício 8849/2019-GP/TCDF esta Secretaria foi informada pelo TCDF quanto a autorização concedida por aquela Corte para o prosseguimento da execução do contrato.</p> <p>- Desde então, esta Secretaria tem adotado providências para restabelecer a execução do contrato e atuado junto aos diversos órgãos do GDF, para que a retomada da intervenção ocorra no início de 2020, sendo constituídos demais processos para tratar assuntos relacionados ao empreendimento, tais como o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e a contratação da prestação de serviços técnicos especializados de supervisão e acompanhamento das obras de implantação do Túnel.</p>	<p>A retomada da execução do Túnel de Taguatinga, Contrato nº 004/2016, ocorreu em 14/02/2020. O Projeto de Sistema Viário - SIV da Boulevard na Avenida Central de Taguatinga. Aguarda aprovação do SIV na SUPAR/Seduh que segue em análise pelo Órgão. Foram efetivadas as contratações referentes:</p> <p>- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário, Contrato nº 018/2020, em andamento normal.</p> <p>- Consultoria para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração do EIV para o Túnel Rodoviário e Boulevard. O Contrato nº 005/2020) encontra-se suspenso aguardando aprovação referente ao SIV - Boulevard do Túnel de Taguatinga.</p>	<p>Obras de construção do Túnel de Taguatinga, durante 2021, em andamento normal - Contrato nº 04/2016.</p> <p>- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário, em andamento normal - Contrato nº 018/2020.</p> <p>- EIV para o Túnel Rodoviário e Boulevard, em análise e aprovação na SEDUH/CPA-EIV - Contrato nº 005/2020.</p>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>VIADUTO EPTG/EPCT</p>	<p>Obra encontra-se paralisada, devido à impossibilidade da execução da obra com relação ao previsto no projeto.</p>	<p>-Após a readequação do projeto executivo estrutural foram realizados os devidos ajustes no contrato que resultou na celebração do Quarto Termo Aditivo de Prazo e de Valor que permitiu a retomada da obra.</p> <p>- Estas obras encontravam-se com contrato suspenso, com apenas 5% de execução do objeto contratual, devido à deficiência de projetos, deu-se pleno andamento com estabelecimento de cronograma de entrega, tendo alcançado 97% de execução ao final de 2019.</p>	<p>Intervenção concluída no 1º Bimestre de 2020.</p>	<p>-</p>
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------

<p>EPIG – VIADUTO PARQUE DA CIDADE</p>	<p>- Após a revisão dos projetos e da estimativa de custos, em 08/08/2019 a CAIXA informou esta Secretaria quanto à obtenção da denominada homologação da Síntese do Projeto Aprovado - SPA, o que permitia o início de procedimento licitatório, sendo o Edital da Concorrência publicado no DODF nº 171 de 09/09/2019, página 37 e no DOU nº 188, página 171, de 27/09/2019.</p> <p>- Diante da aprovação do Ministério das Cidades quanto aos recursos necessários, houve autorização por parte da CAIXA para a licitação;</p> <p>- Em 20/10/2018, o processo foi encaminhado à Novacap para licitação da obra.</p> <p>- Em 03/12/2018, a Diretoria de Urbanização daquela Companhia, informou a esta Pasta da necessidade de atualização das Estimativas de Custos previstas para esta obra, devido à alteração da data base das tabelas de preços utilizadas por aquele Setor.</p> <p>- Em sequência, o Setor técnico desta Secretaria responsável pela análise da repercussão desta alteração no custo a ser considerado para o certame, SUPOP/SINESP, identificou que além das atualizações da data base, houve alterações de composições e itens estimados.</p> <p>- Dadas as alterações constatadas, são necessárias instruções e justificativas para reavaliação por parte do Agente Financiador, CAIXA, e concessão de nova autorização para lançamento de certame.</p> <p>- Há necessidade de se contratar em outro processo:</p> <p>1) A recuperação/ampliação da lagoa de detenção de águas pluviais existente no Parque da Cidade, próxima à Quadra 913 Sul 4; e</p> <p>2) A execução de calçadas sob o Viaduto (exigência do Iphan) que se encontra em fase de elaboração de estimativa de custo pela Novacap.</p>	<p>- Imediatamente à publicação do Aviso de Licitação, o TCDF iniciou diligências pertinentes a sua atuação, tendo proferido em 03/10/2019 a Decisão nº 3386/2019, (DODF de 15/10/2019), que determinou a suspensão da Concorrência nº 001/2019 - ASCAL/PRES, relativa à intervenção em questão. Por conseguinte, em 10/10/2019 foi publicada a suspensão do certame no DOU nº 197 de 10/10/2019, Seção 3, página 176. Em 08/09/2019 esta Secretaria apresentou ao TCDF o Parecer Técnico SEI-GDF nº 1/2019 - SODF/SUPOP de 08/11/2019, acompanhado de Carta Resposta, de 22/10/2019, emitida pela empresa responsável pela elaboração dos projetos, visando prestar esclarecimentos relativos aos questionamentos exarados pelo TCDF. Em 28/11/2019 o TCDF proferiu a Decisão nº 4151/2019 (DODF de 06/12/2019), que autoriza a continuidade da Concorrência nº 001/2019-ASCAL/PRES. Não obstante a autorização concedida por parte do TCDF para retomada do certame, ainda em 2019, há necessidade de submeter novamente os dados técnicos da intervenção à CAIXA,</p> <p>- Em 26/06/2020 foi publicada a revogação da concorrência para a contratação do viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste) e alças de acesso e infraestrutura urbana no âmbito do corredor de transporte público (00110-00002310/2019-01) e a Decisão nº 4764/2020, na Sessão Ordinária nº 5233, realizada em 04/11/2020, quando apreciou o Processo nº 21286/2019-e e promoveu a continuidade da Concorrência nº 11/20-ASCAL/PRES e desta feita segue licitação encaminhada a Novacap em 26/11/2020. - Edital republicado após análise do TCDF - Supervisão e apoio técnico nas obras de implantação do Viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste) e alças de acesso e infraestrutura urbana, no âmbito do Corredor de Transporte Público - EIXO OESTE. Para se contratar os serviços licitados torna-se necessária a conclusão do certame relativo ao objeto a ser supervisionado.</p>	<p>Após destraves junto ao TCDF, as obras de construção do Viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste e alças de acesso e, infraestrutura urbana) foram licitadas e contratadas em 2021, Contrato nº 020/2021.</p> <p>- Observa-se que para o início efetivo das obras foram necessárias ações de esclarecimento junto à população e à Casa Civil/DF, no sentido de apresentar os documentos prévios de aprovação da intervenção (00001-00028577/2021-91).</p> <p>- Serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de Construção do Viaduto da EPIG, Contrato nº 018/2021, em andamento normal.</p>
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		pois houve alteração no caderno de orçamento, em função da inclusão de serviços e de alterações no projeto de drenagem. Até o encerramento do exercício de 2019, a documentação encontrava-se em consolidação para envio formal à CAIXA, prevista para o início de 2020.		
EPIG – TRECHO SIG	Há necessidade: - Contratação de ajuste do projeto face à alteração do eixo da via para desviar da adutora e inclusão de ciclovias/calçadas complementares; e de - Atualização do orçamento, incluindo os recursos necessários para a implantação de drenagem complementar (Parque da Cidade).	- Priorizou-se a elaboração de elementos técnicos necessários para a licitação do Viaduto Parque da Cidade. Novas ações referentes à EPIG - Trecho SIG serão tratadas em 2020.	- Houve a realização de certame visando contratação da Ampliação e readequação do reservatório do Parque Sarah Kubitschek, no Plano Piloto (00110-00002212/2018-85), e encerrou o ano em fase de contratação, tendo em vista a homologação do certame em 23/12/20. - As intervenções remanescentes estão previstas para contratação integrada RDCI - Regime diferenciado de Contratação Integrado (obras e projetos).	- Projeto e Obra em fase de licitação. RDCI nº 001/2021 – DECOMP/DA Objeto: Elaboração de Estudos Técnicos, Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Execução das Obras de readequação e Manual de Operação, Uso e Manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, incluindo implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit), viadutos, estações BRT, passagens para pedestres, infraestrutura e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, 00110-00002590/2020-83.

<p>EPIG - TRECHOS RESTANTES</p>	<p>EPIG - TRECHO 3.1: Setor Sudoeste - trecho entre o Viaduto da Saída do Parque da Cidade e o SIG. Há necessidade de se contratar ajuste do projeto face à nova norma de cargas, inclusão de ciclovias e calçadas complementares; falta definição do Iphan quanto à travessia de pedestres. EPIG - TRECHO 1: Trecho entre o Viaduto da Saída do Parque da Cidade e a EPIA. Há necessidade de se contratar ajuste do projeto face à nova norma de cargas, inclusão de ciclovias e calçadas complementares; definição do Iphan quanto à travessia de pedestres.</p>	<p>- Priorizou-se a elaboração de elementos técnicos necessários para a licitação do Viaduto Parque da Cidade. Novas ações referentes à EPIG - trechos restantes serão tratadas em 2020.</p>	<p>Verificou-se que a melhor estratégia para continuidade dos trechos restantes será a contratação mediante o RDCI (00110-00002590/2020-83), a seguir especificado: - Contratação de empresa para desenvolvimento de projetos e execução de obras de readequação da rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público - Eixo Oeste - DF, encaminhado à Novacap no dia 01/12/20 para início dos procedimentos licitatórios.</p>	<p>- Projeto e Obra em fase de licitação. Intervenção incluída no certame RDCI nº 001/2021 - DECOMP/DA, conforme descrição contida no item acima.</p>
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ESPM – ENTRE A EPIG E O VIADUTO DA W3</p>	<p>- Projeto desenvolvido por meio do Contrato nº 17/2014 - Sinesp, aguardando aprovação do projeto final pela Central de Aprovação de Projetos - CAP/SEGETH, para posterior aprovação do orçamento pela SUPOP/SINESP. - Há necessidade de rever a solução adotada para a captação das águas pluviais de todo o Setor Policial culminando com a implantação de Bacia de Drenagem na Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE do Riacho Fundo. ESPM – ENCAIXE COM A EPIG: 1) Os viadutos na intercessão da ESPM com a EPIG, deverão ser revisados face à nova norma de cargas. 2) Estudar solução para a travessia de pedestres considerando que os ônibus irão circular no canteiro central (Passarela aérea existente não atende ao novo sistema).</p>	<p>- Cumprimento de exigências para aprovação do projeto do Sistema Viário - SIV na Seduh (aprovação do SIV em fase final). Projeto de sinalização aprovado pela Seduh/CAP/ULIC/CIARQ - aguardando a ratificação da aprovação pelo DETRAN/GEREN/NUPRO. Foi constatado que o projeto de drenagem estava em desacordo com as recomendações da Novacap o que demanda o ajuste do Projeto pela empresa contratada. Necessidade de revisão do orçamento após a finalização e aprovação dos projetos. Bacia de Drenagem na ARIE do Riacho Fundo em revisão na Novacap. ESPM – ENCAIXE COM A EPIG: 1) Continua a necessidade de revisão dos projetos dos viadutos. 2) Continua a necessidade de solução para travessia de pedestre.</p>	<p>- Em setembro/2020 foi consolidada documentação técnica necessária para autorização do certame. -Encontra-se em licitação mediante a Concorrência nº 016/2020 DECOMP/DA, a Intervenção relativa à reformulação do Sistema Viário na ESPM, no Trecho entre a interseção com a EPIG e o Viaduto da W3 Sul, para implantação de Corredor exclusivo de Transporte Coletivo, contemplando adequações na via existente, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de retenção. (00110-00002168/2020-28). - Em licitação a contratação dos Serviços de Supervisão das Obras Tomada de Preços nº 007/2020 - DECOMP/DA. (00110-00002198/2020-34).</p>	<p>- Intervenção iniciada em outubro de 2021, Contrato nº 022/2021, Valor de R\$ 47.972.546,24. - Serviços de Supervisão, em andamento normal, Contrato nº 025/2021, Valor de R\$ 2.374.449,91.</p>
<p>ESPM - VIADUTO W3</p>	<p>Obra objeto do contrato 034/2013, concluída em 2014.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

<p>ESPM – ENTRE O VIADUTO W3 e o Terminal da Asa Sul – TAS - T15</p>	<p>- Em setembro/2018 foi lançado o Edital de Concorrência Pública 006/2018 – ASCAL/PRES, no valor de R\$ 8.132.559,49 (processo físico nº 110.000.084/2017).</p> <p>- Houve decisão do Tribunal determinando a suspensão cautelar do certame em questão, conforme Decisão nº 5035/2018. A instrução aos questionamentos do TCDF está sendo tratada por meio do processo SEI-GDF nº 00112-00030753/2018-47.</p>	<p>Em janeiro de 2019 a Novacap consolidou a instrução de esclarecimentos ao TCDF, sendo obtida em maio de 2019 a autorização para continuidade do certame após a adoção das medidas corretivas informadas pela Novacap e pela SODF, conforme a Decisão nº 1802/2019.</p> <p>Em novembro de 2019 esta Secretaria apresentou à Novacap os orçamentos e projetos revisados, de forma a possibilitar a preparação dos elementos técnicos necessários à retomada do certame, prevista para o início de 2020.</p>	<p>- Certame foi concluído em abril/2020 (39085981) e a Intervenção iniciada em maio/2020, encerra o exercício com o contrato suspenso devido à necessidade de aditivo financeiro em função de ajustes nos projetos ocorridos com a mudança nas Normas Técnicas (0110-000084/2017).</p>	<p>- As obras suspensas em 2020 foram retomadas em 25/05/2021, após a celebração de aditivo financeiro, ocasionado pelos ajustes dos projetos. Ressalta-se que durante o período de suspensão do contrato, os serviços de escavação, carga e transporte de material escavado foram executados por equipes e máquinas da Novacap - Contrato nº 009/2020, Valor R\$ 7.667.020,57.</p>
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ação/Subtítulo 3361.4356 - Construção de Pontes – Distrito Federal – Os recursos consignados foram insuficientes para o planejamento da intervenção. Há que se ressaltar, no entanto, a ocorrência de construção de pontes em Vicente Pires, custeada pela Ação/Subtítulo pertinente ao empreendimento, em execução naquela localidade.

Ação/Subtítulo 4026.0001 – Avaliação e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - Em 2021 foram empreendidas ações junto ao Comitê Gestor de Manutenção do Patrimônio do DF (CGMP), onde esta Secretaria se posicionou quanto à necessidade de execução das seguintes ações:

- Contratação de empresas especializadas para a execução de inspeções cadastrais, rotineiras e especiais para as OAEs, em conformidade com a norma brasileira ABNT NBR 9452:2016 - Inspeção de Pontes e Viadutos;
- Contratação de curso para a certificação de profissionais como Inspetor I;
- Contratação da UnB/Finattec para o desenvolvimento de ferramenta de diagnóstico de patologias em vistorias de obras especiais pela FAPDF (solicitado em 2020 e, ainda, permanece em análise);
- Implantação de estrutura orgânica em órgão do GDF com atuação específica na Inspeção de Pontes e Viadutos; e
- Contratação de Engenheiros Civis e Técnicos de Edificações para o Quadro Permanente de Servidores, com capacidade técnica para planejar e gerir as ações de monitoramento, de recuperação e de reforço estrutural, necessários às OAEs do DF.

Ressalta-se que a demanda de Curso de Formação em Vistoria de Obras de Arte Especiais – OAEs (NBR 16230/13), continua em análise na SEEC. E, se encontra na Novacap para procedimentos licitatórios a contratação de empresas especializadas para a execução de inspeções cadastrais, rotineiras e especiais para as OAEs.

Ante o exposto, esta SODF, mediante Portaria Conjunta nº 10/2021, de 24/08/2021, descentralizou R\$ 630.000,00 para a Novacap, visando à contratação de empresas especializadas na execução de Inspeções Cadastrais, Rotineiras e Especiais de Obras de Arte Especiais - OAEs em conformidade com a norma técnica, ABNT NBR 9452:2016 - Inspeção de Pontes e Viadutos. No entanto, ao final de 2021 àquela Companhia requereu o estorno dos créditos orçamentários descentralizados, pois estes não puderam ser empenhados. Em 2022, há previsão de celebração de nova portaria conjunta com a Novacap para a continuidade do procedimento licitatório para a efetiva contratação das empresas especializadas, a serem credenciadas (00110-00003639/2019-81).

6219 - CAPITAL CULTURAL**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	14770177,0	14603927,0	0	0
0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL	14770177,0	14603927,0	0	0
1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	10999,0	231418,00	222416,97	222416,97
0009 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	10999,0	231418,00	222416,97	222416,97
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	14781176,00	14835345,00	222416,97	222416,97

Os empreendimentos vinculados ao Programa Temático 6219 constam das seguintes Ações:

Ação/Subtítulo 1606.0009 – Construção de Praça de Esporte e Cultura - Implantação da Praça da Juventude do Itapoã - Contrato nº 006/2019 - Efetuar pagamento de devolução de recursos do Contrato de Repasse nº 765.046/2011 ao órgão financiador Caixa. Intervenção concluída em 02/09/2020.

Ação/Subtítulo 5968.0007 - Construção de Museu da Bíblia – Contrato de Repasse nº 903.915/2020. Em 2021 foi realizado Concurso Público Nacional para Estudo Preliminar de Arquitetura para Equipamento Público Comunitário de Caráter Cultural - Museu Nacional da Bíblia, finalizado pela Secretaria de Cultura - SECEC, e o resultado final restou como fracassado (00150-00005824/2020-03). Aguarda-se, para 2022, a realização pela SECEC/DF, de novo concurso para que esta SODF possa encaminhar a documentação técnica pendente à Caixa.

Manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC)

O Decreto nº 39.968, de 19/07/2019, estabelece a cobrança de preço público pela URE/SLU, para manejo de resíduos da construção civil, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021: "Art. 2º Os órgãos deverão garantir que as obras em andamento ou com início planejado a partir de 01/01/2021, tenham previsão contratual e orçamentária para destinação final de resíduos de construção civil."

Com o objetivo de dar efetivo cumprimento ao disposto no Artigo 2º, bem como, em virtude das ocorrências verificadas na execução de determinadas obras, alcançadas pela cobrança da Taxa de Resíduos da Construção Civil - RCC, depositados em Unidade de Recolhimento de Entulhos - URE, sob a administração do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF, credor da taxa em questão, procedeu-se ao aporte orçamentário adequado para sanar as pendências financeiras verificadas ao longo do exercício de 2021. Segue abaixo, relação de obras que apresentaram a incidência de tal cobrança (00110-00003297/2021-14):

Programa de Trabalho/Objeto	Valor (R\$)
15.451.6209.1110.0147 - Execução de Obras de Urbanização - Distrito Federal. Requalificação do Setor de Rádio e Televisão Sul, Contrato nº 012/2020. Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Segurança", Contrato nº 011/2019.	41.081,17
15.451.6209.3023.0077 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires. Execução de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - DF, Contratos nºs: 006/2016, 008/2016, 019/2016, 021/2016 e 019/2021.	317.808,11
15.451.6209.3089.0002 - Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos - Avenida W3 Sul - Plano Piloto. Revitalização das Quadras 502 a 506 e 513 a 516 da W3 Sul, Contratos nºs: 022/2020, 004/2021, 005/2021 e 011/2021.	94.139,19
15.782.6216.3054.0002 - Construção de Túnel Rodoviário na Av. Central de Taguatinga. Construção do Túnel de Taguatinga, Contrato nº 004/2016.	4.594,51
15.812.6206.3048.0012 - Reforma de Espaços Esportivos - Distrito Federal. Reforma de Espaços Poliesportivos no Parque da Cidade de Brasília Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020.	1.885,63

Programa de Trabalho/Objeto	Valor (R\$)
Valores Totais Atestados em 2021	459.508,61

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	19781815,0	20241815,00	20078199,52	20051243,68
0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	19781815,0	20241815,00	20078199,52	20051243,68
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2517400,0	808400,00	715856,02	712856,02
7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	2517400,0	808400,00	715856,02	712856,02
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103723,0	1183723,00	728423,73	511469,73
0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	1103723,0	1183723,00	728423,73	511469,73
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	500000,0	0,0	0	0
0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2550000,0	93584,00	93582,08	86454,09
2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	2550000,0	93584,00	93582,08	86454,09
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10000,0	30000,0	23888,0	23888,0
0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	10000,0	30000,0	23888,0	23888,0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	300000,0	0,0	0	0
0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--GUARÁ	300000,0	0,0	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	10000,0	0,0	0	0
6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	10000,0	0,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50000,0	0,00	0	0
5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,00	0	0
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	26822938,00	22357522,00	21639949,35	21385911,52

Ação/Subtítulo 1471.0033 - Não houve execução orçamentária, pois se priorizou ações que não gerassem custos, tais como, a estrutura fornecida pela Nuvem de Serviços da

SUTIC/SEEC para hospedagem de sistemas, e a utilização de softwares livres. Foi realizada, parceria entre a SODF e a SDE/DF, e no final do ano de 2020, a SDE/DF aderiu à Ata de Registro de Preços (ARP 217/20 e 218/20), para aquisição dos seguintes equipamentos: 05 Switches, 01 Servidor Datacenter, 40 computadores do tipo Workstation, que foram transferidos para a SODF, por meio do Termo de Movimentação de Bens Móveis – TMBP nº 0089/21 - SDE/SUAG/DILOG/GESEG/NUPAT, com o objetivo de auxiliar a SODF, com relação ao que institui o Decreto nº 9.377, de 17/05/18, sobre a Estratégia Nacional para a Disseminação do Building Information Modeling (BIM), ou Estratégia BIM-BR.

Ação/Subtítulo 1984.6962 - Construção de Prédios e Próprios - Não houve realização financeira no exercício.

Ação/Subtítulo 2396.5292 - A conservação das estruturas físicas das edificações ocupadas, por esta Secretaria (Edifício Sede e Anexo), compreendeu a realização de serviços nas áreas de elétrica, hidráulica, marcenaria, serralheria, entre outros, sem custos diretos para a SODF, uma vez que estes foram executados pela própria equipe de manutenção predial, em conjunto com a equipe de profissionais disponibilizados pela Novacap.

Ação/Subtítulo 2557.2570 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação. Nesta ação foram adquiridos cartuchos de tintas para impressoras HP Designjet HD Pro MFP, a execução dos serviços de Outsourcing de impressão, referente ao Contrato nº 003/2018, e aquisições de licença de uso do software de orçamento de obras, licença de uso de controle de dados biométrico (ponto eletrônico) e a licença de uso do banco de dados online "FGVDADOS", com finalidade de atender as necessidades desta Secretaria.

Deu-se continuidade à realização de reuniões do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, tendo em vista a contínua verificação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI/SODF, que tem vigência com encerramento em 2021.

No papel de Integrante Técnico do Contrato de Modernização Tecnológica e solução de ferramenta Building Information Modeling – BIM a Unidade de Ativos Tecnológicos – UNATEC, em 2021, atuou na fiscalização técnica contratual, realizando atividades para a instalação e implantação dos equipamentos e softwares para viabilizar a inserção da metodologia BIM.

Assim, como em anos anteriores, realizou-se atividades de Gestão do Contrato de Outsourcing de Impressão, executando verificações e controles dos indicadores e atividades no exercício. Realizou-se, também, o acompanhamento das batalhas definidas no Planejamento Estratégico Institucional – PEI, da SODF para o atendimento dos indicadores definidos para a UNATEC, sendo atingidos os seguintes objetivos:

- Atendimento de cinco necessidades presentes no Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI;
- Monitorar até o final de 2021, 75% do catálogo de Serviços;
- Attingir 100% no Índice de Transparência Ativa – ITA, anualmente.
- Os Sistemas geridos e criados, por esta Secretaria, passam por melhorias contínuas, como por exemplo, o InfObras que teve diversas alterações implantadas nos módulos do Sistema (manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva), além do desenvolvimento de novas funcionalidades.
- O Sistema de Controle de Processos Físicos – SCPF, plataforma digital criada para atender demandas e requisitos, referentes às dificuldades operacionais do setor de arquivamento de processos físicos teve os seguintes desenvolvimentos:
- Aplicação Web disponível apenas na rede da Secretaria;
- Cadastro, edição e pesquisa de processos e suas informações de identificação;
- Cadastro, edição e pesquisa de caixas;
- Cadastro, edição e pesquisa de setores para vínculo com processos;
- Cadastro, edição e pesquisa de assuntos de obras para vínculo com processos;
- Função de arquivamento e desarquivamento de processos para identificação rápida da localização; e
- Busca dinâmica dos processos a partir de parâmetros modulares.

O Sistema de Doação de Solos de Escavação – SDSE foi desenvolvido para oferecer nova destinação para um componente específico dos resíduos da construção civil, chamado solo puro. Durante a fase de projetos e orçamento, técnicos especializados identificam a volumetria do solo puro que será disponibilizado quando da execução de determinada obra,

assim que o serviço de escavação for iniciado, o Sistema SDSE disponibiliza a volumetria e os interessados se manifestam quanto à quantidade desejada.

O Sistema do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB, demanda da área ambiental desta SODF, por meio da Comissão Técnica composta pela SODF, Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF – Adasa, SLU, Novacap e Caesb. Foram realizados trabalhos, no sentido de se desenvolver o sistema, mas alguns entraves ocorreram e, assim os estudos para a continuidade destes trabalhos encontram-se em elaboração pela área pertinente (00110-00000378/2021-62).

Realizou-se o necessário e contínuo monitoramento da rede de dados e serviços para garantir a disponibilidade de serviços de tecnologia. E, atualizou-se o Parque Computacional, com a realização dos seguintes procedimentos:

- Instalação e configuração de 05 novos Switches na infraestrutura de dados da SODF;
- Instalação de 01 Servidor no Datacenter da SODF para modernização do parque de Servidores;
- Implantação de Servidor de licenciamento para a solução AUTODESK, permitindo que as estações de trabalho acessem a ferramenta que irá auxiliar as atividades referentes ao Building Information Modeling - BIM;
- Instalação de 40 novos computadores do tipo Workstation, para a realização das atividades que necessitam de alto poder de processamento provenientes da utilização das ferramentas da AUTODESK;
- Realização de configurações para melhoria de desempenho do Servidor de Arquivos da SODF, para viabilizar a utilização juntamente com a solução AUTODESK.

Ação/Subtítulo 4088.0066 – Capacitação de Servidores – Em 2021, foi elaborada, por meio da SUAG/SODF, o Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores, desta Secretaria, que consolidou, através de pesquisa por meio de Formulários encaminhados aos servidores, a necessidade individual de cada profissional, objetivando o treinamento e o aperfeiçoamento do servidor público, a fim de buscar soluções para identificar e superar deficiências e aprimorar conhecimentos que impactam, diretamente, na qualidade da prestação dos serviços públicos. Desta forma, foi solicitado à Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV, atender as demandas dos cursos levantados, na citada pesquisa, conforme Relação contendo as necessidades levantadas.

Ressalta-se que neste ano, com os cuidados com relação à pandemia de Covid-19, continuou-se a priorizar a capacitação realizada à distância, organizadas pelos diversos órgãos do GDF e da União, quais sejam: cursos, congressos, seminários, workshops e eventos afins, ministrados pela Escola de Governo - EGOV/DF, Escola Nacional de Administração Pública – Enap, outros órgãos do GDF e da União. Salienta-se, a participação voluntária de servidores em cursos de instituições de ensino diversas e de outros Órgãos, tais como: Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e o Ministério da Economia - ME.

Cabe, ainda destacar a participação de servidores nos cursos e seminários ("Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico para Serviços e Obras de Engenharia, segundo a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, incluindo o uso de BIM" e "Planejamento e Orçamento de Obras Públicas, segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.").

Foram realizadas 141 inscrições em cursos de capacitação, sendo 44 na EGOV/DF, 01 na Enap e 96 nas demais instituições. Os eventos realizados abordaram temas diversos de interesse da Administração Pública, com destaque para os relacionados abaixo:

INSTITUIÇÃO	CURSO	PARTICIPANTES
EGOV - Escola de Governo	Produtividade e Melhoria do Clima Organizacional	1
	Norma Regulamentadora (NR32)	1
	Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa	5
	Atendimento ao Público	3
	Desenvolvimento de Competências Gerenciais	3
	Ética, uma questão de escolha	1
	Gestão de Qualidade	2
	Gestão de Processos	4

INSTITUIÇÃO	CURSO	PARTICIPANTES
	Transparência, Ética e Controle Social	1
	Gestão e Fiscalização de Contratos	6
	Assédio na Administração Pública - Controle e Prevenção	1
	Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - Módulo Usar	6
	Noções de Administração Pública	1
	Instrução Processual de Aposentadorias e Pensões baseada no novo manual do IPREV/DF	1
	Introdução à Libras	1
	Redação Oficial	3
	Tratamento de Acervos Arquivísticos	1
	Aposentadorias e Pensões - LC 769/2008 e Compensação Previdenciária	1
	Gestão e Fiscalização de Contratos	1
	Processo Administrativo Disciplinar - PAD	1
Enap – Escola Nacional de Administração Pública	Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos	1
Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e a Enap	Seminário Internacional de Proteção de Dados	1
Corregedoria do Ministério da Economia	I Seminário de Direito Administrativo Disciplinar do Ministério da Economia - Direito Administrativo Disciplinar - Perspectivas Contemporâneas	2
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, por meio do Centro de Altos Estudos - CEAE	Encontro da Consultoria Administrativa da PGFN 2021	1
Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF	Workshop sobre Processo Administrativo de Responsabilização – PAR	3
	III Encontro de Corregedorias da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF	3
	II Webinar do Sistema Correccional Integrado - SCI: A Otimização na Gestão de Processos	3
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF	XXVI SEMAT - Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo	2
CREA-DF – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal	Seminário sobre a nova Lei de Licitações: Avanços e conflitos com a Lei 5.164/66	2
Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico para Serviços e Obras de Engenharia, segundo a Nova Lei de Licitações 14.133/2021, incluindo o uso de BIM	7
	Planejamento e Orçamento de Obras Públicas, segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	6
Grupo Negócios Públicos	15º Pregão Week – Semana Nacional de Estudos Avançados Sobre Pregão	3
Instituto educacional - AUTODESK Authorized Training Center	Webnário de Capacitação e Execução de Recursos Operacionais de Crédito e de Transferências Voluntárias do Distrito Federal	1
	Intra Works - Básico 1	24
	Civil 3D Básico	24
	Revit Básico 1	12
Instituto Educacional - IBRASFOR Instituto Brasil de Formação	Gestão Participativa	1
Curso - Connect On Cursos e Eventos	Reequilíbrio Econômico - Financeiro dos Contratos Administrativos - Revisão, Reajuste e Repactuação, Fundamentos jurídicos e processamento de acordo com a legislação vigente (Lei 8.666/93 e Lei 13.303/2016) e a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 14.133/2021	1
Total de Inscrições		141

Ação/Subtítulo 8502.0092 - Administração de Pessoal. As despesas realizadas nesta ação, referem-se à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, as contribuições previdenciárias e as substituições.

Ação/Subtítulo 8504.7003 - Concessão de Benefícios a Servidores. Efetuaram-se pagamentos relativos a auxílios: creche, natalidade, alimentação e transporte.

Ação/Subtítulo 8517.0091 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Deu-se continuidade às despesas de natureza continuada, com a manutenção de contratos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos administrativos da Pasta, e, com a celebração de novas contratações:

- Aquisição de material de sinalização visual e afins (placas de obras e de inauguração);
- Aquisição de carimbos de madeira e automáticos (sob demanda);
- Aquisição de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, com suporte técnico presencial, compatível com o Registrador Eletrônico de Ponto (REP);
- Aquisição de materiais de proteção individual, devido a Covid-19;
- Aquisição de crachá funcional;
- Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso do Banco de Dados online denominado "FGVDADOS";
- Disponibilização de Software de Orçamentação de Obras, contemplando Infraestrutura e Edificações, consoante especifica o Estudo Técnico Preliminar (ETP) da Contratação;
- Serviços de telefonia fixa para PABX, na modalidade local;
- Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado;
- Serviços de fornecimento e entrega da revista Conjuntura Econômica;
- Serviços postais e telemáticos;
- Serviços de reprografia, plotagens, cópias de projetos colorido e preto/branco e encadernações;
- Serviços de controle de praga;
- Serviço de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas nacionais;

Retorno ao Trabalho Presencial

Em 2021, apesar de estabelecido o retorno ao trabalho presencial, foram mantidas as medidas de prevenção à disseminação e ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19), conforme as recomendações impostas pelos Decretos distritais, desta forma, continuaram sendo implementadas as providências já iniciadas em 2020, quanto à: aferição da temperatura na entrada da Secretaria (prédio Sede e Anexo), organização dos espaços disponíveis no auditório e sala de reunião para garantir a distância mínima recomendada; disponibilização de álcool líquido e em gel a 70% para todos os setores; distribuição de máscaras de tecido a todos os servidores; afixação de cartazes sobre o uso obrigatório de máscaras e a aquisição de equipamentos de segurança individual para a realização, semanal, de ação sanitizante a base de amônia em toda a estrutura física da SODF, dentre outras ações. Destaca-se que, o registro destas contratações, e de outras que tenham como objetivo o combate à Covid-19, estão sendo lançadas no Sistema SistCovid, de acordo com as orientações e prazos estipulados na Circular nº 10/2021 - CGDF/SUBTC.

O Secretário de Obras por meio da Portaria nº 109, de 30/07/2021, regulamentou o retorno ao trabalho presencial e estabeleceu o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, como medida de segurança, necessária para dar continuidade aos serviços, conforme dispôs o Decreto nº 41.841, de 26/02/21.

Gestão da Frota

Houve ampliação da frota de veículos oficiais, desta Secretaria, para um total de seis veículos oficiais, sendo 2 de médio porte e 4 de pequeno porte, destinados a atender, com prioridade, as ações voltadas à fiscalização e vistorias de obras, que resultaram no quantitativo de 648 solicitações, atendidas pela frota própria e 173, por meio do aplicativo "TáxiGov", sendo 100% atendida a necessidade de deslocamento dos servidores no exercício de suas atribuições.

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	500000,00	0,00	0,00	0,00
9875 - Construção do Museu da Educação	500000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	500000,00	0,00	0,00	0,00

Ação/Subtítulo 1984.9875 - Construção de Prédios e Próprios - Construção do Museu da Educação - Recursos oriundos de Emenda Parlamentar Distrital, cujos créditos orçamentários foram cancelados por iniciativa do Parlamentar (Lei nº 6.862, de 09/06/2021).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

3.1 Projetos e Planejamento de Obras

3.1.1 Projetos que resultaram em Processo de Licitação

Em 2021 foram formalizadas análises, compatibilizações e elaborações/revisão de projetos que resultaram em 16 processos de licitação, quais sejam:

1. Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG - Obras de readequação e Manual de Operação, Uso e Manutenção da rodovia DF-011, incluindo implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit), viadutos, estações BRT, passagens para pedestres - RDCI nº 001/2021 - DECOMP/DA, do tipo maior desconto;
2. Requalificação urbana no SOF SUL, no Guará (RA-X) - Concorrência nº 010/2021 - DECOMP/DA;
3. Elaboração e Readequação de Projeto Executivo - Drenar Taguatinga - DF - Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA;
4. Requalificação da Av. Hélio Prates, Taguatinga-DF, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte - Etapa 2, - Concorrência nº 08/2021 - DECOMP/DA;
5. Revitalização da Av. Paranoá com cerca de 2,7 km de extensão e largura média de 40 m - Concorrência nº 005/2021 - DECOMP/DA;
6. Implantação de Praça na QD 113, no Recanto das Emas, RA XV - Pregão Eletrônico nº 030/2021 - DECOMP/DA;
7. Requalificação da Quadra 03 do Setor Comercial Sul, no Plano Piloto - RA I, incluindo recuperação de pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, execução de calçadas, escadas e rampas - Concorrência nº 011/2021 - DECOMP/DA;
8. Serviços topográficos e de mapeamento aéreo RTK (com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras - Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SODF;
9. Serviços geotécnicos/geológicos, e de controle tecnológico laboratorial (concreto, betumes e solos), com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a responsabilidade da SODF - Pregão Eletrônico nº 01/2021 - SODF;
10. Infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, bacias e OAE que promoverá a ligação interna entre os Trechos 01 e 02 - Concorrência nº 009/2021 - DECOMP/DA;
11. Infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03 - Lote 01, compreendendo drenagem, pavimentação, sinalização viária e bacias de retenção - Concorrência nº 012/2021 - DECOMP/DA;
12. Infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03 - Lote 02, compreendendo drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de retenção - Concorrência nº 013/2021 - DECOMP/DA;

13. Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto, Brasília RA I - Pregão Eletrônico nº 07/2021 – DECOMP/DA;
14. Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01 (Concorrência 016/2021-DECOMP/DA);
15. Implantação/Requalificação das calçadas na Av. W3 Sul, entre as QDs. 703 e 715 do SHIGS, Plano Piloto. Em preparação de procedimento licitatório (00110-00003049/2021-73);
16. Execução de Pavimento Rígido na W3 SUL. Em preparação de procedimento licitatório (00110-00001749/2020-42).

3.1.2 Projetos Urbanísticos em Geral - Contrato nº 017/2014 - Sinesp

O Contrato nº 017/2014 – Sinesp, continua sob o acompanhamento da equipe de projetos desta SODF, pois ainda apresenta pendências de aprovação de projetos/estimativas de custos que requerem monitoramento, de forma a se obter o recebimento desses produtos. Nesse contexto, o valor estimado dos projetos entregues com pendências de aprovação, no âmbito do contrato, permanece em R\$ 402.919,90.

Neste exercício atuou-se nas análises de ajustes dos produtos entregues para aprovação nos órgãos competentes, e nos trâmites processuais de encaminhamento.

3.1.3 Projetos de Obras e Serviços de Engenharia: Desenvolvidos, em Desenvolvimento e/ou Analisados:

Obra/Serviço	Atividades Desenvolvidas no Setor de Projetos (SUPOP/SODF)
Obra de Arte Especial - OAE 03 – Vicente Pires	Retomada do certame em decorrência de licitação deserta. Após reanálise do projeto contratado verificou-se a necessidade de se proceder à mudança de projeto para adequar ao local, tendo em vista que a implantação de caminho de serviço com o projeto anteriormente licitado oneraria os cofres públicos.
Campo de Grama Planaltina	Projeto e orçamento elaborado nesta SODF e aprovados junto ao agente financiador, porém não licitado devido à negativa da Administração de Planaltina para a implantação da intervenção.
Av. Hélio Prates - Etapa 3	Intervenção integrante do Corredor Eixo Oeste que foi dividida em 3 Etapas, sendo que a Etapa 1 segue em fase de obra, a Etapa 2 em licitação e a Etapa 3 encontra-se em fase de desenvolvimento do projeto.
Recuperação Ambiental no Parque do Cortado	Intervenção solicitada pelo Ibram, que irá promover a adequação de lançamento de água no Córrego do Cortado, a fim de resguardá-lo ambientalmente, em face das obras da Etapa 2 da Av. Hélio Prates demandar a realização de drenagem que contempla a construção da bacia de detenção no Parque do Cortado.
Pavimentação no Gama	Procedeu-se solicitação de esclarecimentos junto ao agente financiador quanto às razões para as recorrentes negativas de aprovação de projetos de pavimentação. Novamente o agente financiador denegou a aplicação dos valores e, em reunião com a SUGRE/SODF, foi identificado que o programa que ora representa pavimentação asfáltica, implica na obrigação de aprovação de SIV, decorrente do Manual que os projetos que utilizam recursos de emendas devem seguir, o que irá onerar os custos com a necessidade inclusive de execução de calçadas e acessibilidade.
Reforço da estrutura do Anfiteatro do Gama	Relatório Técnico elaborado e Termo de Referência finalizado. Orçamento em elaboração.
Setor Comercial Sul, Quadra 03	Elaborado pela Seduh, compatibilizado, quantificado e orçado pela SODF, sendo que o mesmo foi desmembrado da Praça do Povo, cujas obras foram concluídas neste exercício.
Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante	Decorrente de Emenda Parlamentar este projeto foi desenvolvido pela SODF e aprovado pela Seduh. Encontra-se em análise no agente financiador com expectativa de aprovação, tendo em vista o cumprimento de todos os itens demandados no Manual que os projetos que utilizam recursos de emendas devem seguir.
Vicente Pires, Lote 02	Projeto de implantação de drenagem e pavimentação em áreas remanescentes de obra, em desenvolvimento.
Ginásio do Gama	Análise de projeto e solicitação de revalidação de visto à Seduh/CAP.
Hospital Veterinário Parque do Cortado	Em atendimento à demanda do Ibram, a SODF desenvolveu projeto de implantação, estrutural, análise de projetos existentes com extração de quantitativos e orçamento do Hvep.
Museu da Bíblia	Acompanhamento e colaboração na contratação de concurso relativo ao projeto para a construção do Museu da Bíblia.
Setor Comercial Sul, Quadra 05	Projeto desenvolvido pela Seduh. Análise de projeto e extração de quantitativos, com identificação de serviços, realizados pela SODF.
Setor Comercial Sul, Quadra 04	Projeto desenvolvido pela Seduh, e análise de projeto, por parte da SODF, com encaminhamento de observações à Seduh para ajustes e adequações.

Obra/Serviço	Atividades Desenvolvidas no Setor de Projetos (SUPOP/SODF)
Taguacenter	Projeto desenvolvido pela Seduh, e análise de projeto, por parte da SODF, com encaminhamento de observações à Seduh para ajustes e adequações.
Via Boca da Mata, em Taguatinga	Após realização de consultas de interferências, a SODF desenvolveu estudo preliminar para duplicação da Via.
Via de Ligação entre CAUB I e II	Projeto de pavimentação, drenagem, sinalização e calçadas em desenvolvimento.
Via de Ligação entre Riacho Fundo II e Granja Modelo	Decorrente de emenda parlamentar, o projeto de Sistema Viário foi desenvolvido e finalizado, mas não foi encaminhado para análise e aprovação do agente financiador por estar localizado em área rural, o que se torna impeditivo segundo o Manual para Apresentação de Propostas 2021.
Drenar Plano Piloto, Faixas 1 e 2	Elaborado pela SODF o orçamento referente à drenagem do Plano Piloto, porém a Terracap decidiu por não utilizar a estimativa de custos elaborada por esta Secretaria.
Contratação de Projetos de Remanejamento LDS	Após realização de consultas de interferências, a SODF procedeu às tratativas com o objetivo de remanejar as interferências de redes de energia nos projetos licitados na SODF.
Elaboração de projeto de Remanejamento de Redes Elétricas na Interligação entre o Guará e Núcleo Bandeirante	Após realização de consultas de interferências, a SODF procedeu às tratativas com o objetivo de remanejar as interferências de redes de energia.
Projeto de Infraestrutura Cicloviária e Acessibilidade da Av. Central	Cooperação técnica decorrente da Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (CPA/EIV), sendo demandada a elaboração de orçamento para encaminhamento às compromissárias.
Implantação de Praça, na QD 310, próxima ao Conj. 7A Lote 01, no Recanto das Emas	Aprovação do Projeto de Implantação de Paisagismo e Mobiliário Urbano de Esporte e Lazer em Área Pública. (Portaria 53, de 12/07/21).

3.1.4 Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT

Constituída pela Portaria 51, de 15/04/21 para atender as demandas da Comissão de Licitação Permanente referentes aos certames de obras e serviços, a serem realizados pela Novacap e pela Comissão Permanente de Licitação da SODF, constituída pela Ordem de Serviço nº 01, DODF de 27/10/21, para as contratações realizadas por esta Secretaria. A CIAT em 2021, desenvolveu 68 Pareceres/Relatórios Técnicos para dirimir dúvidas dos licitantes e encaminhamento de análise dos documentos de qualificação e de preços.

3.2 Participação em Comissões e Grupos de Trabalho (GT)

3.2.1 Participação do Setor responsável pelo Planejamento e Projetos em Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho:

- Comitê de Mobilidade Urbana, DODF de 25/09/2019;
- Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI;
- Comitê Interno de Governança Pública – CIG;
- Comissão de Recebimento Provisório e Definitivo de Contratos;
- Comissão Inventariante de Bens Patrimoniais;
- Comissão Permanente de Sindicância;
- Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSDA;
- CODDED – Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do DF;
- CONDETUR – Conselho de Desenvolvimento de Turismo do DF;
- COPEP/DF – Câmara Setorial de Serviços, Turismo, Hospitalidade e Tecnologia;
- CPA/EIV – Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança;
- CTPC/DF – Conselho do Transporte Público Coletivo do DF;
- PDOT – Estratégias de Regularização e Habitação; Participação Social e Governança;

- GT Elaboração e articulação do Plano Distrital de Acessibilidade;
- GT de Manutenção de Obras de Arte Especiais - OAE;
- Grupo de Transporte Público Coletivo do DF;
- GT do Túnel de Taguatinga;
- GT Museu da Bíblia;
- GT Sol Nascente;
- GT SODF, Novacap e Cultura (Projeto de Reforma da Sala Martins Penna do Teatro Nacional Cláudio Santoro);
- Grupo Executivo para Estudos e Projetos W3 Sul, Comércio e Lazer.

3.2.2 Participação do Setor responsável pelo Acompanhamento Ambiental em Conselhos, Comissões e GTs:

- Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do DF – CORC/DF;
- Comissão Técnica de revisão e atualização do PDSB e PDGIRS;
- Comissão Técnica para acompanhar as escavações na área de parcelamento condicionando – APC;
- Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico – Econômico – ZEE;
- Conselho de Meio Ambiente do DF - Conam;
- Conselho de Limpeza Urbana – Conlurb;
- Conselho de Saneamento Básico do DF – Consab;
- Conselho Gestor do Parque Burle Marx;
- Conselho de Recursos Hídricos – CRH;
- Câmara Julgadora de autos de infração – CJAI;
- Câmara Técnica de Resíduos;
- GT de Educação Ambiental;
- GT de Populações Vulneráveis;
- GT para Seleção da Sociedade Civil;
- GT Resposta à Decisão nº 698/2021 TCDF;
- GT Lodo/Esgoto;
- GT de Drenagem do Plano Piloto;
- GT Institucionalização da Drenagem;
- GT de Enquadramento de Requerimentos de Parcelamento de Solo Urbano;
- GT com o Objetivo de Elaborar Minuta de Decreto, que vise ações de fiscalizações relacionadas ao RCC/DF;
- GT do Corsap - DF/GO (GDF e Municípios).

3.3 Projetos submetidos ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – Fundurb

O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Fundurb) possui natureza contábil e é vinculado à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação (Seduh). Possui como objetivo captar e destinar recursos para viabilizar programas e projetos voltados para o desenvolvimento urbano, institucional e para preservação do patrimônio existente na área de tombamento de Brasília. A SODF participa do Conselho Gestor do Fundurb, sendo de competência, dentre outras atribuições, formular, acompanhar, avaliar e agilizar a execução de planos, programas e projetos pertinentes ao desenvolvimento das atividades do Fundo. No ano de 2021, esta Secretaria participou de diversas reuniões que trataram de assuntos pertinentes às atividades do Fundurb. Ressalta-se que não houve disponibilização de recursos para programação de obras por esta Secretaria.

Destaca-se, em 2021 a realização da prestação de contas de recursos descentralizados em 2020 para a execução da Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul, no valor de R\$ 647.931,39, referente aos recursos efetivamente utilizados. A aprovação da prestação de contas ocorreu na 46ª Reunião Ordinária do Fundurb, realizada em 22/06/2021. Ademais, constatou-se saldo remanescente de R\$ 1.005.190,36, que restou não aplicado no exercício anterior, de 2020, devido à reprogramação do cronograma de execução da intervenção, que estendeu parte das etapas de obras prevista para 2020, para o exercício de 2021. Assim, optou-se por custear a conclusão da intervenção, mediante aporte de recursos desta Secretaria, evitando aporte orçamentário complementar proveniente do Fundurb.

3.4 Convênios

3.4.1 Cooperação Técnica entre a SODF e a Novacap

Como relatado em exercícios anteriores, a SODF mantém com a Novacap, o Convênio de Cooperação Técnica nº 001/2018 (Novacap/Sinesp), celebrado em junho/2018, com vigência de 05 anos, que tem por finalidade estabelecer condições de Cooperação Técnica entre esta Secretaria e a Novacap, para a elaboração de estudos, projetos, orçamentos, licitações, contratações e prestação de contas, além da execução direta ou indireta de obras e/ou serviços de edificações e de urbanização, no âmbito do DF. Há que se destacar, no entanto, que se encontram suspensas as atividades de fiscalização pela Novacap, das intervenções contratadas por este órgão, uma vez que, em comum acordo com àquela Companhia, nesta gestão governamental a fiscalização passou a ser exercida diretamente pela equipe técnica lotada, em geral, na Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização - SUAF/SODF.

3.4.2 Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap

Esta Secretaria mantém com a Terracap importantes convênios e em 2021, atuou na gestão administrativa dos termos pactuados, procedendo às devidas prestações de contas, tendo apresentado também novos pleitos para formalização de outros instrumentos. Estes Convênios são imprescindíveis para a SODF, dada a finalidade de alavancar novos empreendimentos de infraestrutura urbana e principalmente de possibilitar a continuidade de determinadas obras, custeadas por financiamentos, que demandam vultosos aportes de recursos de responsabilidade do DF, destinados: às contrapartidas; aos reajustamentos contratuais; aos reequilíbrios econômico-financeiros de contratos, ocasionados pela variação de preços de materiais betuminosos, e às demais ocorrências de aditivos contratuais necessários. Portanto, os repasses de convênios tem contribuído, sobretudo, para o não comprometimento do fluxo financeiro das operações de crédito, tendo em vista que as insuficiências recorrentes nas fontes de recursos oriundas do Tesouro limitariam o ingresso desses recursos.

Apresenta-se no Quadro 01, a seguir, a situação dos convênios, sendo evidenciado que o Convênio nº 059/2019 – Rota de Segurança e o Convênio nº 036/2020 – W3 Sul, estão em finalização. Já o Convênio nº 090/2016 – Lote 03 de Vicente Pires foi finalizado em 2021, estando pendente a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e, se encontram em andamento o Convênio nº 042/2019 – Vicente Pires e o Convênio nº 041/2020 – Bernardo Sayão, de acordo com os respectivos Planos de Trabalhos aprovados pela Terracap:

Quadro 01 (Valores em R\$)

Convênios Terracap e os respectivos desembolsos em 2021											
Objeto	Valor Total	Desembolsado em 2019 (R\$)		Desembolsado em 2020 (R\$)		Desembolsado em 2021 (R\$)			Vigência	Situação	
		Medições (Valor original)	Reajustam. de Medições	Medições (Valor original)	Reajustam. de Medições	Reequil. Econôm-Financeiro (Betuminosos)*	Medições (Valor original)	Reajustam. de Medições		Reequil. Econôm-Financeiro (Betuminosos)*	
Convênio 90/2016 - Execução de pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem pluvial e obras de arte especiais (OAE) - Vicente Pires.	13.506.465	838.742	0	0	0	0	0	0	0	Finalizado	Finalizado

Convênio 42/2019 - Complementação da execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais nos lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 - Vicente Pires.	152.221.902	8.122.247	5.426.315	3.572.131	10.570.113	2.138.351	1.349.585	7.154.019	3.039.723	31/12/2022	Em andamento
Convênio 59/2019 - Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga" - SIA.	11.350.584	357.979	0,00	4.976.238	290.927	0	5.722.876	516.836	0	30/04/2022	Em finalização
Convênio 41/2020 - Complementação da execução de serviços de pavimentação e drenagem/urbanização nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 - Bernardo Sayão.	20.275.970	-	-	0	65.091	0	1.048.837	200.469	0	31/07/2022	Em andamento
Convênio 36/2020 - Execução dos serviços de revitalização nas Quadras 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 514, 515 e 516 da W3 Sul - Plano Piloto.	18.845.823	-	-	0	0	0	12.388.520	187.222	0	30/04/2022	Em finalização
Total	216.200.745	9.318.969	5.426.315	8.548.370	10.926.132		2.138.351	20.509.819	8.058.547	3.039.723	
Total por Ano		14.745.284	21.612.853				31.608.090				

*Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, devido à variação de preços de materiais betuminosos.

Considerando as citadas demandas por recursos para execução de novos empreendimentos, em 2021 a SODF propôs junto à Terracap a celebração de novo convênio destinado a custear a realização de intervenções também relacionadas à revitalização da W3 Sul. O pleito em referência encontra-se em avaliação pela equipe técnica daquela Companhia e visa a:

- Implantação/requalificação das calçadas ao longo da Av. W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do SHIGS, Plano Piloto – RA I, no valor estimado de R\$ 1.916.263,38;

- Restauração do pavimento da Av. W3 Sul, incluindo reconstrução da estrutura em pavimento rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível em trechos da faixa central; restauração do revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas daquela Avenida; as readequações do sistema de drenagem em decorrência da necessidade de realocação de bocas de lobo e/ou condição estrutural do sistema - Plano Piloto - RA I, no valor estimado de R\$ 28.073.250,03.

3.5 Atividades e Resultados Referentes às Execuções dos Contratos de Financiamentos e Repasses

Em 2021, prosseguiram-se as tratativas objetivando o devido andamento das obras previstas para serem executadas a partir dos recursos provenientes das Operações de Créditos, sob a gestão da Pasta, sendo realizadas reuniões periódicas com o agente financiador - Caixa, com a participação de diversos órgãos governamentais, tais como: Terracap, Codhab, Ibram, CEB, Novacap e SEEC/DF.

3.5.1 Contratos de Financiamento

3.5.1.1 PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades - EIXO OESTE

Esta operação de crédito visa à implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste e as intervenções originalmente previstas para serem executadas, e envolviam recursos da ordem de R\$ 693,7 milhões, a serem aplicados na ligação Ceilândia-Taguatinga-Plano Piloto. Este total era composto pelo Contrato de Financiamento (CF) nº 0394.629-04/2013, contratado em 2013, junto à Caixa, no valor de R\$ 544,6 milhões, sendo R\$ 517,4 milhões de financiamento e R\$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF e pelo Termo de Compromisso (TC) nº 0402.091-01/2014, firmado em 2014 também junto à Caixa, no valor total atualizado R\$ 149 milhões, sendo R\$ 116,5 milhões do OGU e R\$ 32,5 milhões de contrapartida do GDF.

Nesse contexto, conforme apresentado no ano de 2020, após formalizado o distrato do Termo de Compromisso nº 0402.091-01/2014, as metas previstas no TC (Via EPIG, Viaduto da EPIG e Hélio Prates) foram incorporadas ao CF nº 0394.629-04/2013, desse modo, para a implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste têm-se vigentes apenas os recursos provenientes da operação de crédito em questão. Por conseguinte, face ao tempo decorrido da celebração desse financiamento, firmado em 2013, e ao custo atual pertinente às intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, o Distrito Federal deverá aportar contrapartida em valor superior ao montante originalmente previsto, tendo em vista o expressivo aumento dos insumos aplicados na realização de obras e serviços de engenharia nos últimos anos.

No tocante à implantação do Corredor Eixo Oeste, a SODF, por intermédio da SUGRE/SODF, realizou diversas reuniões junto à Caixa, com a Comissão de Acompanhamento das Obras do Contrato nº 004/2016 (CAOC), SUAF/SODF e outros órgãos do GDF, a fim de garantir a evolução do Programa. Importante ressaltar que os projetos das obras do Eixo Oeste sofrem interferências de diversos órgãos do GDF, tais como, Semob, Seduh, Metrô, DER, Detran, Ibram e, por isso tem ocorrido mudanças e atrasos na finalização dos projetos e orçamentos, bem como no andamento das obras.

Cumprir destacar, que ao longo de 2021 ocorreu a finalização do processo licitatório da Bacia do Parque da Cidade, da Etapa 1 da Av. Hélio Prates, do Viaduto da EPIG, do Trecho de interseção EPIG/ESPM e o Viaduto da W3 Sul (T16). Assim, foram formalizados os contratos de obras nºs 03/2021, 014/2021, 020/2021 e 022/2021. No cenário das obras em execução do Corredor Eixo Oeste, continuaram em andamento os contratos nºs 04/2016 e 009/2020, totalizando assim 6 contratações com execução de obras no ano de 2021.

Conforme se observa no Quadro 02, que apresenta o desempenho das metas inseridas nesta operação de crédito, com a celebração desses novos contratos a SODF teve uma evolução considerável na execução financeira do contrato de financiamento do Eixo Oeste, pois foram investidos aproximadamente R\$ 90 milhões, resultando em 17% a mais que o ano de 2020.

Quadro 02 – Eixo Oeste (Valores em R\$)

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/2013 - Eixo Oeste								
Obra	Valor Disponibilizado (R\$)		Atividades Realizadas em 2021	Situação até dezembro de 2021	Execução financeira acumulada (%)			
	CAIXA	GDF			Até 2018	2019	2020	2021
1. Viaduto de interseção da ESPM, via W3 Sul - Contrato nº 034/2013	1.357.418	13.195.854	-	Obra concluída em 2014	100%	100%	100%	100%
2. Via de ligação entre a Av. Hélio Prates e a Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente (T1) - Contrato nº 022/2016	2.700.570	729.791	-	Obra concluída em 2019	58%	72%	100%	100%
3. Alargamento do viaduto da EPCT/EPTG (T10) - Contrato nº 001/2017	3.012.500	1.472.828	-	Obra concluída em 2020	27%	82%	100%	100%
4. Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga - Contrato nº 004/2016	224.801.132	0	Execução da obra	Obra em andamento (19ª medição)	0%	0%	8%	48%
5. Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar - ESPM, até o terminal da Asa Sul (TAS) - T15 - Contrato nº 009/2020	10.378.182	0	Execução da obra	Obra em andamento (9ª Medição)	0%	0%	3%	37%
6. Bacia do Parque da Cidade - Contrato nº 003/2021	2.871.168	0	Obra contratada e iniciada	Obra em andamento (8ª Medição)	0%	0%	0%	55%
7. Viaduto da EPIG - Contrato nº 020/2021	29.610.361	0	Obra contratada e iniciada	Obra em andamento (5ª Medição)	0%	0%	0%	10%
8. Av. Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 014/2021	15.966.971	0	Obra contratada e iniciada	Obra em andamento (5ª Medição)	0%	0%	0%	18%
9. Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM (T16) - Contrato nº 022/2021	46.565.076	0	Obra contratada e iniciada	Obra em andamento (3ª Medição)	-	-	-	0,46%
10. Via EPIG	70.896.830	4.459.348	Em fase de licitação RDCI	Edital de Licitação - RDCI nº 001/2021 - DECOMP/DA	-	-	-	-

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/2013 - Eixo Oeste								
Obra	Valor Disponibilizado (R\$)		Atividades Realizadas em 2021	Situação até dezembro de 2021	Execução financeira acumulada (%)			
	CAIXA	GDF			Até 2018	2019	2020	2021
11. Drenagem em Taguatinga								
Fase 1 - Contratação de projetos executivos	79.015.141	4.158.691	Fase 1- Em fase de licitação (projetos executivos)	Fase 1 - Edital de Licitação - Tomada de Preços nº 001/2021 - DECOMP/DA	-	-	-	-
Fase 2 - Contratação das obras								
12. Av. Hélio Prates - Etapas 2 e 3	58.247.007	3.065.631	Etapa 2 - Em fase de licitação	Etapa 2 - Edital de Licitação - Concorrência nº 08/2021 - DECOMP/DA	-	-	-	-
13. Av. Samdu e da Av. Comercial (Taguatinga)	2.916.553	153.502	Atualizações de projetos	Atualizações de projetos e orçamento	-	-	-	-
Aporte de recursos extras*		30.861.564						
Total	517.477.350	27.235.650		Total execução financeira (%)	3,4%%	4%	9%	26%
Caixa + GDF	544.713.000							

* Aporte de recursos extras: O valor informado trata-se de aporte adicional de contrapartida necessário, perante o valor inicialmente pactuado junto ao agente financeiro Caixa. Observa-se que os valores das obras que ainda serão contratadas poderão sofrer alterações.

3.5.1.2 - PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas

Em continuidade às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações de crédito contratadas no ano de 2014, a SODF atuou em 2021 na esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Porto Rico, Vicente Pires e Bernardo Sayão. Importa reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses financiamentos, em especial devido à dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados obtidos para o ano de 2021, foram satisfatórios. Os contratos de financiamento abrangidos por este programa são identificados a seguir:

3.5.1.2.1 - Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.836-22/14

Trata-se de operação de crédito assinada em 2014, no valor de R\$ 418.906.698,73, dos quais, R\$ 397.961.363,79 referem-se ao financiamento da Caixa e R\$ 20.945.334,94 são equivalentes ao aporte de Contrapartida-GDF, mínima obrigatória contratual. Contudo, ao longo da execução contratual, os custos iniciais previstos para as intervenções vinculadas a esta operação de crédito sofreram diversas alterações, sendo o valor ora vigente correspondente a R\$ 397.961.363,79 - Caixa/FGTS e R\$ 86.279.432,07 - Contrapartida/GDF, perfazendo um total de R\$ 486.208.894,49.

Como manifestado em relatórios anteriores, para arcar com os custos referentes à Contrapartida e demais despesas a cargo do Distrito Federal, esta gestão celebrou com a Terracap o Convênio nº 042/2019 no valor de R\$ 152.221.902,00, estando assegurados os aportes demandados pelo órgão financiador a título de contrapartida desta operação de crédito, o que tem evitado a ocorrência de interrupção de repasses. Em relação ao Convênio nº 090/2016, firmado em 2016, específico para o Lote 03, tendo em vista a finalização das obras, esta Secretaria irá apresentar o Termo de Recebimento Definitivo da intervenção na

qual foram aplicados os recursos, desembolsados pela Concedente, procedendo assim à prestação de contas final do Convênio.

Os desembolsos realizados no exercício de 2021, vinculados a esta operação de crédito, constam no Quadro 3, que apresenta também os valores que restaram atribuídos para as obras e serviços contratados:

Quadro 03 – Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R\$)

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Vicente Pires								
Contrato nº /Lote	Valor Disponibilizado (R\$)		Atividades Realizadas em 2021	Situação até dezembro de 2021	Execução financeira acumulada (%)			
	Caixa	GDF			2018	2019	2020	2021
008/2015 - Lote 01	40.345.611	8.747.071	Obra paralisada	Contrato concluído (45ª medição)	24%	46%	59%	60%
014/2020 - Lote 02	2.361.779	512.042	Continuidade da execução dos serviços	Em andamento (4ª Medição)	2%	2%	30%	32%
010/2015 - Lote 03	18.113.223	3.927.010	Obra finalizada	Obra finalizada (23ª medição)	54%	100%	100%	100%
008/2016 - Lote 04	31.505.662	6.830.539	Obra finalizada	Obra finalizada (43ª medição)	23%	58%	72%	100%
019/2016 - Lote 05	38.408.297	8.327.054	Obra finalizada	Obra finalizada (38ª medição)	31%	42%	53%	66%
004/2015 - Lote 06	16.693.440	3.619.196	Obra finalizada	Obra finalizada (41ª medição)	20%	42%	57%	100%
005/2015 - Lote 07	32.411.902	7.027.015	Obra Paralisada	Contrato concluído (41ª medição)	35%	50%	52%	52%
003/2018 - Lote 08	10.150.979	2.200.768	Obra finalizada	Obra finalizada (4ª medição)	0%	81%	84%	84%
020/2016 - Lote 09	33.853.211	7.339.496	Obra finalizada	Obra finalizada (40ª medição)	53%	69%	77%	100%
021/2016 - Lote 10	60.280.302	13.068.982	Continuidade da obra	Obra em andamento (47ª medição)	31%	53%	69%	76%
006/2016 - Lote 11	33.800.653	7.328.101	Obra paralisada	Obra paralisada (24ª medição)	6%	23%	44%	49%
019/2021 - Lote 12	29.298.982	6.352.123	Continuidade da obra	Obra em andamento (5ª medição)	0%	0%	0%	8%
M* - Outras obras	50.737.315	11.000.029	A Licitar	-	-	-	-	-
Total	397.961.363	86.279.432						
Caixa + GDF	484.240.795		Total execução financeira (%)		29%	50%	60%	63,5%

Assim, verifica-se a partir dos dados dispostos no Quadro acima, que a operação de crédito apresenta desembolso financeiro acumulado até 2021, de aproximadamente 63,5%, equivalente a R\$ 307.502.120,02.

Nesse ano de 2021, obteve-se a emissão dos Termos de Recebimentos Provisórios dos Lotes 04, 06 e 09, quanto aos Lotes 01, 05 e 07, aguarda-se os trâmites para a finalização, no entanto, já se constata que parte dos escopos contratados não poderão ser realizados, por questões de reordenamento territorial e atualizações de projetos, demandando novos certames para a conclusão do empreendimento. Em relação às intervenções em execução, ressalta-se a contratação das obras remanescentes dos Lotes 05, 08 e 09 que consistem do denominado Lote 12, especificado no Quadro, tratado no certame como Lote Único. E, no que se refere às obras em andamento dos Lotes 10 e 11, há previsão de que o término ocorra em 2022.

Destaca-se também a previsão de contratação das obras do Lote 02 no exercício de 2022, incluindo as Obras de Artes Especiais 01 e 03, onde serão utilizados os recursos relativos ao item "M*- Outras obras", vide Quadro 03.

Mesmo com o avanço das obras, torna-se importante salientar que as constantes reprogramações dos cronogramas de execução, que ocorreram em relação aos prazos dos contratos celebrados nos anos de 2015 e 2016, ocasionaram respectivo aumento no valor final dos ajustes, com a incidência de relevante percentual aplicado para contemplar os reajustamentos contratuais, demandando assim, a necessidade crescente de provisionamento de recursos para tal fim.

3.5.1.2.2 Setor Habitacional Porto Rico / Santa Maria - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.819-14/14

Sobre o Contrato de Financiamento das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Região Setor Habitacional Porto Rico – Santa Maria, em 2021 foi realizada a prestação de contas da Meta 01 do contrato relativo às obras, realizadas entre 2016 e 2018, dos Lotes 01, 02, 04, 05 e 06, com as emissões dos respectivos Termos de Recebimentos Definitivos, apenas neste ano.

Em relação a Meta 02, definida como a reestruturação do Bueiro da DF-290 e revitalização da Lagoa de Santa Maria, que se iniciou em março de 2020, com o valor inicial contratado de R\$ 4.737.784,41, tendo alcançado após aditamentos necessários, o montante de R\$ 5.540.714,44. Esta intervenção foi concluída em 2021, conforme programado, tendo havido a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a devida prestação de contas realizada.

3.5.1.2.3 Setor Habitacional Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.840-83/14

O Contrato de Financiamento prevê investimento no valor total de R\$ 69.152.875,78, sendo o valor de financiamento (FGTS) de R\$ 47.622.498,29 e a Contrapartida de R\$ 21.530.377,49. Considerando o alto percentual de 31,13% relativo à contrapartida a ser aportada, para a obtenção de cada desembolso, bem como os déficits recorrentes quanto à disponibilidade de recursos próprios do GDF, esta SODF celebrou junto à Terracap o Convênio nº 041/2020, no valor total de R\$ 20.275.970,37, com a finalidade de garantir que os desembolsos previstos pela Caixa sejam efetivados. A situação do convênio mencionado consta especificada, com mais detalhes, quanto a vigência e repasses providenciados, no item Convênios Terracap.

Diante da necessidade contratual de realização de obras de drenagem e pavimentação nos Lotes 01, 04 e 05 no Setor Habitacional Bernardo Sayão, neste ano de 2021 foi desenvolvido pela SODF um cronograma de Metas e Ações no qual tentou-se viabilizar primeiramente, a contratação do Lote 01, sendo convocada a primeira colocada na licitação ocorrida em 2016, contudo concluiu-se pela inviabilidade do processo de contratação, devido à atualização dos projetos, sendo identificadas novas interferências e incrementos de serviços antes não previstos, que impactam nas estimativas de custos da intervenção referente a esse Lote. Portanto, no caso específico do Lote 01, tendo em vista a referida impossibilidade de contratação, relativa ao certame realizado em 2016, há necessidade de programação de nova licitação tomando-se por base os projetos atualizados que contemplam novas interferências constatadas, assim, está sendo revisada a estimativa de custos para que se inicie novo certame visando à efetiva contratação das obras.

Em relação ao Lote 05, considerando que os projetos de drenagem e pavimentação encontram-se em processo de atualização, visando otimizar a programação de intervenções que apresentavam condição técnica de execução, houve importante definição quanto à realização de licitação das Bacias de Contenção do Lote 05, estando prevista a contratação em 2022, tendo em vista a conclusão do certame ocorrida no final do exercício. Outro objetivo da licitação, somente das Bacias do Lote 05, foi evitar interrupção de desembolsos da operação de crédito por um período superior a três meses.

Para os Lotes 04 e 05 (drenagem e pavimentação de vias), estão sendo realizados serviços geotécnicos complementares que irão contribuir no desenvolvimento dos projetos e na orçamentação do custo das intervenções previstas para serem executadas nesses Lotes. As licitações dos Lotes 01, 04 e 05 (drenagem e pavimentação) estão previstas para 2022.

Sobre as obras contratadas, dos Lotes 02 e 03, salienta-se que houve conclusão em 2021, no entanto, no que se refere ao Lote 03, a última medição dos serviços executados deverá ser

apresentada em janeiro/2022, com previsão de Prestação de Contas no primeiro trimestre de 2022. Encerrados esses contratos, caso se constate a necessidade de obras remanescentes, estas deverão ser incluídas nas licitações que estão previstas para 2022.

Segue abaixo o Quadro 04, que demonstra os dados do Contrato de Financiamento das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial do Setor Habitacional Bernardo Sayão:

Quadro 04 - Bernardo Sayão (Valores em R\$)

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão							
Lotes	Valor Disponibilizado (R\$)		Atividades Realizadas em 2021	Execução financeira acumulada (%)			
	Caixa	GDF		Até 2018	2019	2020	2021
01	15.512.986,31	7.013.501,25	Aguardando nova Licitação	0%	0%	0%	0%
02	2.718.079,48	1.228.857,77	Obra finalizada	24%	43%	48%	100%
03	5.762.156,69	2.605.100,80	Obra finalizada	5%	38%	50%	99%
04	10.309.285,47	4.660.881,22	Aguardando nova Licitação	1%	1%	1%	1%
05	10.151.003,49	4.589.321,12	Aguardando nova Licitação	0%	0%	0%	0%
05 (Bacias)	3.168.986,85	1.432.715,33	Em fase de contratação	0%	0%	0%	0%
Total	47.622.498,29	21.530.377,49					
Caixa + GDF	69.152.875,78		Total de execução do financiamento (%)	3%	12%	15%	17%

De acordo com o Quadro 04, os Lotes 02 e 03 obtiveram avanços financeiros consideráveis. O Lote 02 foi finalizado no 3º Bimestre de 2021, o valor contratual foi readequado por meio de aditivos que se tornaram necessários, devido às constatações de interferências decorrentes do reordenamento urbano, não sendo possível então, a realização de todo o escopo contratado previsto no projeto inicial. Também se observa essa ocorrência para o Lote 03.

3.5.1.3 Pró-Moradia I – Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006

Esta operação de crédito, assinada em 2006, executada em anos anteriores a 2021, integra o denominado Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de equipamentos públicos comunitários e da execução de Trabalho Técnico Social – TTS, em diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, tendo a Caixa como agente financeiro. Conforme tem sido manifestado, por ocasião do encerramento de diversos exercícios, ainda restam itens em aberto e sem comprovação de funcionalidade perante o órgão financiador, devido às dificuldades de finalização das metas das obras à época contratadas.

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2021, providências envidadas objetivando a retomada do referido Contrato, sendo realizadas diversas reuniões de ponto de controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas, conforme especificado no Quadro 05. Com isso, o cronograma de ações para o término das obras foi devidamente atualizado e está sendo monitorado pelas equipes da Caixa, SEEC, SODF, Novacap e Codhab.

Quadro 05 - Itens em Aberto (Valores em R\$)

Detalhamento dos Itens	Região	Valor Contratado	Valor desembolsado até 2021	Saldo (R\$)
Drenagem/Pavimentação	Arapoanga - Planaltina	17.463.556	16.476.472	987.084
	Mestre D'armas - Planaltina	22.214.430	18.932.576	3.281.854
	Vila Vicentina - Planaltina	6.826.426	5.306.532	1.516.894
	Total	46.504.412	40.715.580	5.785.832

Para a programação de execução das metas, destaca-se que em novembro/2021, foi iniciada a elaboração dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D'Armas, por meio do Contrato nº 021/2021, sendo apresentada à Caixa, a documentação relativa à contratação efetivada. Quanto às outras metas em aberto, estas se encontram em fase de preparação para licitação destinada à contratação de empresas para à elaboração do projeto executivo dos remanescentes de obras.

3.5.1.4 Pró-Moradia II

O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente Financeiro. Os objetivos principais são: a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, unidades habitacionais e a execução de Trabalho Técnico Social - TTS nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina – DF.

3.5.1.4.1 Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009

As intervenções previstas no Programa Pró-Moradia no Setor Habitacional Sol Nascente, envolvem recursos da ordem de R\$ 326 milhões a serem aplicados nos Trechos 01, 02 e 03. O Contrato de financiamento foi contratado em 2009 junto à Caixa Econômica Federal (Caixa) e apresenta o valor total atualizado até 2021 de R\$ 326.338.989, que é o valor do investimento (VI), sendo R\$ 208.960.870 de financiamento (FGTS) e R\$ 117.653.068 de contrapartida (GDF).

O contrato tem como objeto a construção de Unidades Habitacionais (UH), execução de Trabalho Técnico Social (TTS), infraestrutura (drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, blocos intertravados e meios-fios) no Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN). Contudo, o Manual do Programa Pró-Moradia exige a aplicação de 30% do valor do investimento para a construção de Unidades Habitacionais (UH), que equivale ao montante de R\$ 98.804.605, com base nos valores contratuais vigentes, e aporte de 2,5% do valor do empréstimo em execução de TTS, que representa o montante de R\$ 5.224.021. Assim, o investimento total previsto nas obras de urbanização (drenagem e pavimentação) é de aproximadamente R\$ 222.310.362.

Ao longo do ano de 2021, foram realizadas reuniões mensais de ponto de controle e gestão junto à Caixa, agente financiador da operação de crédito, com a participação de órgãos governamentais envolvidos na execução das metas do contrato de financiamento, tendo ocorrido também reuniões internas de governo das quais participaram equipes técnicas da SODF, Terracap, SEEC/SUCAP, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa Civil, DF Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, objetivando: o recebimento das metas de Unidades Habitacionais por parte da Codhab, de acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes, tendo em vista o encerramento do contrato relativo ao Trecho 01 e as rescisões dos contratos dos Trechos 02 e 03, ocorridas em 2019.

Desta forma, no que tange à meta de infraestrutura urbana, no ano de 2021 efetivou-se a contratação dos serviços de elaboração dos projetos executivos das obras remanescentes dos Trechos 01 e 03 (Contratos nº 015/2020 e nº 016/2020) e a contratação da execução das obras remanescentes do Trecho 02, mediante a celebração do Contrato nº 015/2021. A elaboração dos projetos executivos possibilitou a autorização de outros importantes certames para a contratação da execução das obras remanescentes, quais sejam: Trechos 01 e parte do Trecho 03 no valor de R\$ 53.104.205,21 (Concorrência nº 009/2021 – DECOMP/DA); Trecho 03 / Lote 01 no valor de R\$ 80.501.175,91 (Concorrência nº 012/2021 – DECOMP/DA) e Trecho 03/ Lote 02 no valor de R\$ 68.694.144,41 (Concorrência nº 013/2021 – DECOMP/DA).

Em relação à meta de construção de UH, não ocorreu a execução de obras por parte da Codhab no ano de 2021. Sobre as últimas metas entregues de UHs, decorrentes da construção de 308 UHs na Quadra 700 do Trecho 01 do Sol Nascente, ressalta-se que em

2021 foi realizado o recebimento provisório das obras, bem como a entrega das UHS aos beneficiários dos programas daquela Companhia.

Quanto às metas de TTS, a Codhab retomou o planejamento para publicação de um novo processo licitatório, de acordo com as exigências da Caixa, atendendo aos normativos internos de execução. No decorrer de 2021 foi preparado o diagnóstico do TTS no Sol Nascente e todo o processo licitatório para publicação no início de 2022.

Cabe ressaltar, que, não obstante as contratações de UH e TTS sejam efetivadas e administradas pela Codhab, para que os pagamentos das medições atestadas por aquela Companhia sejam realizados, esta SODF procede à operacionalização da transferência de recursos, tanto de origem de financiamento (FGTS) quanto de contrapartida (Fonte 100).

Por fim, levando-se em consideração as dificuldades operacionais que a região do Sol Nascente apresenta, em 2021 houve a efetiva retomada das obras remanescentes, tendo em vista a celebração do Contrato nº 015/2021 e a contratação da elaboração dos projetos executivos, o que possibilitou a programação dos respectivos certames relativos as obras complementares, identificadas para a conclusão da urbanização do setor.

Sendo assim, conforme o Quadro 06, ao se comparar o desempenho financeiro da operação de crédito, ocorrido em 2021, com o resultado obtido de 1,24% no ano anterior de 2020, constata-se acréscimo nos desembolsos efetivados, uma vez que o investimento de 2021 correspondeu a 2,53%, equivalentes a aproximadamente R\$ 8 milhões.

Quadro 6 – Setor Habitacional Sol Nascente (Valores em R\$)

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Sol Nascente								
Lotes/Trecho	Valor Disponibilizado (R\$)		Atividades Realizadas em 2021	Situação até dezembro de 2021				
	Caixa	GDF			2018	2019	2020	2021
1. Trecho 01	18.267.588	31.204.344	Recebimento provisório das obras	A ser emitido o recebimento provisório da obra	84%	84%	84%	84%
2. Trecho 02	30.956.023	25.979.422	Recebimento provisório das obras	A ser emitido o recebimento provisório da obra	53%	58%	58%	58%
3. Trecho 03	12.592.469	8.216.095	Recebimento provisório das obras	A ser emitido o recebimento provisório da obra	22%	32%	32%	32%
4. Projetos Executivos (Lotes 01 e 02)	1.285.998	723.374	Execução de contrato	Projeto executivo em fase final	0%	0%	0%	94%
5. Remanescente Trecho 02	9.185.731	5.166.974	Obra contratada e iniciada	Obra em andamento (6ª medição)	0%	0%	0%	44%
6. Remanescente Trechos 01 e 03	70.627.598	9.237.598	Em licitação	Em licitação	0%	0%	0%	0%
7. Construção de UH*	62.657.086	35.244.610	Meta executada pela Codhab	Codhab planeja licitatório de 308 UHs* (CT 031/2018)	29%	50%	55%	0%
TTS**	3.343.373	1.880.647	Meta executada pela Codhab	Codhab irá licitar o remanescente	7%	9%	23%	23%
Total Financeiro	208.960.870	117.653.068						
Caixa + GDF	326.613.938			Total de execução financeira (%)	44%	54%	56%	58%

U.H.* - Unidade Habitacional e TTS** - Trabalho Técnico Social

3.5.1.4.2 Mestre D'Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.232-26/2009

As intervenções previstas a serem executadas por meio desta operação de crédito relativa ao Setor Habitacional Mestre D'Armas, consistem das obras de drenagem e pavimentação

concluídas em 2010, com exceção de alguns trechos em que não houve possibilidade de execução, devido a problemas fundiários e ambientais.

Para a retomada da operação de crédito, procedeu-se em 2020 gestões entre esta Secretaria, por meio do setor de gerenciamento de recursos externos e a GIGOV/Caixa, para a utilização dos recursos na elaboração dos projetos executivos das obras remanescentes e na futura etapa de execução destas obras.

Em 2021 realizou-se o certame referente à revisão e readequação de projetos executivos de drenagem urbana, sendo celebrada a respectiva contratação destes serviços (Contrato nº 021/2021, no valor de R\$ 1.080.075,66). Assim, a documentação pertinente ao certame e a contratação foi apresentada à Caixa, tendo havido a devida aprovação. A partir do deferimento obtido, foram enviadas, em dezembro de 2021, as duas primeiras medições dos serviços realizados, no montante de R\$ 491.698,13, o que possibilitou obter desembolsos, por intermédio do financiamento, após longo período de 14 anos de interrupção dos repasses previstos.

3.5.1.4.3 Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009

Em relação a esta contratação, destaca-se que a tratativa envidada em 2020, formalizada junto à GIGOV/Caixa, por meio do Ofício nº 1574 – SODF/GAB/ASSESP, pleiteando o encerramento das metas ainda não realizadas e o respectivo encerramento contratual, restou indeferida, tendo em vista que em 2021 houve pronunciamento da GIGOV/Caixa, indicando como obrigatória a realização da meta referente ao Trabalho Técnico Social - TTS.

Assim, após reuniões com as equipes da Codhab e SUCAP/SEEC, formalizou-se solicitação de providências por parte da Codhab quanto à verificação da viabilidade na realização do TTS na região.

3.5.1.5 Emendas Parlamentares Federais – Contratos de Repasse (Orçamento Geral da União - OGU)

Em 2021 manteve-se a atuação na viabilização e na gestão de contratos de repasses e de convênios, cujos recursos financeiros são provenientes de Emendas Parlamentares Federais consignadas no Orçamento Geral da União - OGU.

Para a consecução desses instrumentos contratuais, são inseridos na "Plataforma+Brasil", gerenciada pelo Ministério da Economia, os Planos de Trabalho compatíveis com o objeto das respectivas emendas. A partir da aprovação desses planos de trabalho e emissão das respectivas Notas de Empenho nos valores autorizados pelos gestores dos programas, são assinados os Contratos de Repasse com a Caixa ou celebrados Convênios diretamente com entes da União.

O Quadro 7, a seguir, demonstra o montante relativo à celebração de Contratos de Repasse nos anos de 2019, 2020 e 2021. Observa-se que apesar do valor total contratado em 2021 apresentar-se inferior ao total captado em 2020, há que se considerar que, no ano de 2020, apenas duas Emendas Parlamentares destinadas por "Bancada" totalizavam valores que superam R\$ 26 milhões, quais sejam: Construção do Museu da Bíblia e Via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.

Quadro 7 – Emendas OGU – Captação (Valores em R\$)

Ano	Quantidades de Contratos	Valor Total (R\$)
2019	05	3.344.168,07
2020	08	31.122.991,93
2021	03	9.710.518,20
Total	17	44.177.778,20

Nos Quadros 8a e 8b, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse vigentes e as principais informações desses instrumentos:

Quadro 8a – Contratos de Repasse – OGU (Valores em R\$)

Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Status e andamento em 2021
922.411/2021	Cláusula suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal	Contrato de Repasse celebrado em 30/12/2021
922.902/2021	Cláusula suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal	Contrato de Repasse celebrado em 30/12/2021
922.919/2021	Cláusula suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal	Contrato de Repasse celebrado em 30/12/2021
906.560/2020	Cláusula suspensiva	1- Implantação de Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante	Documentação técnica enviada para análise da Caixa em 26/10/2021 (00110-00001102/2020-11). Prazo para retirada de condições suspensivas: 30/11/2022.
906.133/2020	Cláusula suspensiva	2- Construção e implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniqueira	Aguarda envio de projetos pela Administração Regional de Arniqueira (00110-00003356/2020-73). Prazo para envio da documentação à Caixa: 30/10/2022.
903.915/2020	Cláusula suspensiva	3- Construção da Primeira Etapa do Museu da Bíblia	Aguarda a realização de novo concurso pela SECEC/GDF, referente à seleção do projeto de arquitetura a ser adotado na construção do Museu, para que esta SODF proceda ao envio da documentação técnica à Caixa (00110-00000970/2020-83). Prazo para envio à Caixa: 30/10/2022.
900.764/2020	Cláusula suspensiva	4- Pavimentação no DF- Via de acesso a Granja Modelo - Riacho Fundo II	A execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pela SUPOP/SODF tendo em vista que a classificação funcional programática do recurso orçamentário não permite a execução de obras em área rural. Além disso, o parcelamento ainda não está apto para a aprovação de projeto viário na Seduh (00110-00000977/2020-03). O parlamentar, autor da Emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução.
899.769/2020	Cláusula suspensiva	5- Implantação da Praça do Bosque do Varjão	A execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pela SUPOP/SODF devido ao baixo valor disponibilizado e à dificuldade em se obter licenciamento ambiental para o projeto (00110-00000975/2020-14). O parlamentar, autor da Emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução.
899.775/2020	Cláusula suspensiva	6- Pavimentação no DF	A execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pela SUPOP/SODF devido ao baixo valor disponibilizado e à dificuldade de dar cumprimento ao normativo referente a ação 1D73 (00110-00000976/2020-51). O parlamentar, autor da Emenda, foi comunicado da impossibilidade de execução.
899.471/2020	Cláusula suspensiva	7- Construção da cobertura da quadra de esporte da SQN 104	A execução do contrato de repasse foi reportada como inviável pela SUPOP/SODF devido ao baixo valor disponibilizado, bem como dificuldade em se aprovar o projeto para cobertura, uma vez que a área está destinada para outro equipamento público conforme relatado no processo: 00110-00000974/2020-61, o parlamentar foi comunicado da impossibilidade de execução.
897.413/2019	Cláusula suspensiva	8- Pavimentação no DF	Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial solicitando a extensão do prazo para cumprimento de condição suspensiva, após decisão liminar, o contrato teve sua data para cumprimento estendida até 30/08/2022. (00110-00003529/2021-34).

Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Status e andamento em 2021
895.656/2019	Cláusula suspensiva	9- Implantação de campo de futebol em grama sintética no DF	Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial solicitando a extensão de prazo para cumprimento de condição suspensiva, após decisão liminar, o contrato teve sua data para cumprimento estendida até 30/08/2022. (00110-00003525/2021-56).
894.652/2019	Cláusula suspensiva	10- Reforma da Praça Teodoro Freire	Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial solicitando a extensão de prazo para cumprimento de condição suspensiva, após decisão liminar, o contrato teve sua data para cumprimento estendida até 30/08/2022. (00110-00003528/2021-90).
891.856/2019	Cláusula suspensiva	11- Reforma da Praça Salviano Guimarães, Setor Tradicional Centro Histórico	Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial solicitando a extensão do prazo para cumprimento de condição suspensiva, após decisão liminar, o contrato teve sua data para cumprimento estendida até 30/08/2022. (00110-00003526/2021-09)
884.905/2019	Em execução	12- Reabilitação e urbanização acessível de espaços urbanos no Recanto das Emas - DF.	Projetos aprovados pela Caixa. Intervenção em processo licitatório na Novacap (00110-00002646/2021-81).
879.216/2018	Em execução	13- Implantação de Campo de Futebol de Grama Sintética na Vila Planalto - DF	A obra foi licitada e contratada, entretanto, devido a problemas relacionados ao aceite da documentação na Plataforma+Brasil e devido à autorização do início de obras, o Contrato de Repasse foi custeado com recursos próprios do DF, conforme relatado nos processos 00110-00002411/2018-93, 00110-00000278/2021-36 e 00110-00001713/2021-40.

Quadro 8b – Contratos de Repasse – OGU (Valores em R\$)

Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Status e andamento em 2021	Valor (R\$)		Avanço Financeiro	
				Contratado	Pago		
859.116/2017	Em execução	13- Reforma de espaços esportivos no Parque da Cidade - DF	Contrato de obras em andamento.	1.401.752,76	247.597,97	1.165.702,37	17,52%
843.692/2017	Prestação de contas concluída	14- Implantação de Campo de Futebol em Grama Sintética - Santa Maria DF	Prestação de contas concluída e aprovada junto à Caixa.	793.461,12	634.652,08	243.921,49	72%
843.686/2017	Prestação de contas concluída	15- Implantação de campo de futebol de grama Sintética - Planaltina-DF	Prestação de contas concluída e aprovada junto à Caixa.	1.214.718,61	1.081.370,52	133.348,09	89%
765.046/2011	Prestação de contas em análise	16- Implantação da Praça da Juventude em Itapoã	Pagamento final de remanescente de medição do ano de 2020 e prestação de contas realizada e, em análise na Caixa.	2.191.057,35	1.834.262,18	356.795,17	83,72%
Total				5.600.989,84	3.797.882,75	1.899.767,12	47,18%

Nos Quadros 8a e 8b, acima, são apresentados os 20 Contratos de Repasse provenientes de Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União, sob a gestão desta Secretaria, que totalizam o montante de R\$ 51.176.537,80.

Destaca-se que, no ano de 2021, foram realizadas as prestações de contas finais de 03 contratos de repasse, sendo estes: 765.046/2011 - Praça da Juventude do Itapoã; 843.686/2017- Campo de Grama Sintética em Planaltina e 843.692/2017- Campo de Grama Sintética em Santa Maria.

Como tem sido mencionado nos relatórios de gestão desta Secretaria, a ausência de projetos de engenharia e demais questões técnicas não levadas em consideração antes da definição dos objetos das Emendas Parlamentares tem dificultado o avanço na execução dos Contratos de Repasse celebrados. Dentre as principais dificuldades, destacam-se:

- A interpretação dada pela Caixa à Portaria Interministerial nº 424/2016, que estabelece as normas de execução relativas às transferências de recursos da União, mediante convênios e contratos de repasse, em aspectos que tangem: a elaboração de projetos, questões de ordem fundiária e, situações constatadas na execução de obras, no que se refere a aditamentos considerados necessários para a conclusão de objetos pactuados;
- Recursos subdimensionados para execução dos projetos propostos e projetos inexequíveis, no âmbito da classificação funcional programática disponibilizada, bem como, não apresentação de projetos ao caderno de emendas por parte desta SODF no SIGER – Sistema de Gerenciamento de Recursos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
- Instabilidades verificadas na “Plataforma+Brasil”, bem como os prazos para correção de problemas;
- Implantação de um novo módulo na “Plataforma+Brasil”, sendo necessária a inserção manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade e retrabalho;
- Falta de agilidade da Caixa em relação aos problemas de ordem técnica, verificados na “Plataforma+Brasil”. A exemplo desta constatação, pode-se ressaltar situação ocorrida com o Contrato de Repasse nº 879.216/2018, especificada no Quadro 8a, o que levou o GDF a arcar com os custos totais de intervenção que contava para a sua execução, principalmente, com os recursos oriundos de repasse da União.
- Constantes mudanças no arcabouço legal, por parte da União, que regulamenta a execução de Contratos de Repasse, constatando-se diversas alterações em regras e prazos pertinentes à inscrição de recursos de Emendas em restos a pagar (empenhos), por meio da LDO, LOA e Decreto Federal nº 93.872/86;
- Falta de adequação do regramento legal disposto na Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas alterações, bem como na Instrução Normativa nº 2/2018/MPDG quanto à modalidade de obras por tamanho e complexidade, especialmente no que se refere aos prazos estabelecidos para cumprimento de cláusula suspensiva e execução e às situações específicas inerentes ao Distrito Federal, pertinentes aos aspectos fundiários;
- Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para investimentos em obras públicas, cujos normativos restritivos não abrangem e/ou não são capazes de sintetizar a realidade de execução de obras públicas para o Distrito Federal, quando em conjunção com os baixos valores de investimentos disponibilizados por parlamentares deste ente federativo;
- Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação em nível federal e, na adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União no DF, não obstante haver demandas com potencial de atendimento mediante esses recursos;
- Morosidade na liberação de recursos financeiros junto ao Ministério concedente, para o pagamento das medições vinculadas aos Contratos de Repasse em execução;
- Judicialização de vários temas conexos às transferências voluntárias que dificultam a previsibilidade das ações e a segurança jurídica.
- Ademais, foram realizados esforços no âmbito da SODF para a adesão ao denominado Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr, conforme orientação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
- Ressalta-se ainda que, além da administração dos Contratos de Repasse de responsabilidade desta Secretaria, o setor de gerenciamento de recursos externos tem prestado apoio técnico nas questões afetas à “Plataforma+Brasil” e as transferências voluntárias da União, para outros órgãos do GDF, como as Secretarias de Estado de Esporte e Cultura, Novacap e Administrações Regionais.

3.5.2 Considerações

Em 2021, buscou-se a melhora do desempenho da Carteira de Contratos de investimentos de responsabilidade desta Secretaria, em especial com a adoção das iniciativas implantadas pelo Planejamento Estratégico Institucional da SODF, o que resultou em avanços consideráveis nos percentuais de desembolsos, em comparação ao mesmo período de 2020.

De forma geral, houve progressos na evolução das obras, na elaboração de projetos, orçamentos e nos procedimentos licitatórios ao longo do ano de 2021. Ademais, ressalta-se o aumento dos preços dos insumos da construção civil, neste ano, o que demandou a celebração de aditamentos para reequilíbrios contratuais, que impactaram nos valores disponibilizados inicialmente para as obras em andamento e no custo previsto das intervenções a serem licitadas, o que tem ocasionado aumento substancial dos aportes de contrapartidas obrigatórias.

Em face da situação apresentada, realizou-se os procedimentos administrativos necessários junto à SUCAP/SEEC, objetivando que os empreendimentos a cargo desta Secretaria sejam contemplados em novas fontes de financiamentos previstas, a serem firmadas pelo GDF, para se obter, em 2022, a regularidade de desembolsos provenientes dos Contratos de Financiamento e também para possibilitar a programação de novas intervenções.

Ressalta-se, ainda, o trabalho de apoio exercido a outras Secretarias, mais especificamente no que se refere as rotinas de captações e execuções de Emendas Parlamentares Federais, devido à complexidade de operação da Plataforma+Brasil.

Por fim, cumpre destacar a importância dos convênios firmados com a Terracap, que atualmente representam uma grande fatia na carteira de recursos desta SODF, executados com rotinas e prazos previamente definidos e acordados entre as partes, assegurando a continuidade e lançamento de novas obras.

3.6 Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PROCIDADES

A SODF foi indicada para participar do Grupo Executivo para acelerar as ações do Programa Procidades na Operação Internacional de Crédito nº 2957-OC/BR firmada entre o GDF e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio do Decreto nº 39.630, de 16/01/2019.

O Procidades tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico descentralizado do Distrito Federal mediante melhorias no ambiente de negócios e da promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs. O Programa está estruturado em quatro componentes: 1 – Desenvolvimento Institucional Estratégico; 2 – Programa de Atração de Investimentos; 3 – Desenvolvimento Empresarial nas ADEs e 4 – Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs.

A SODF, enquanto integrante da execução do Programa, tem a possibilidade de ser contemplada com ações no âmbito do Componente I – Programa e Fortalecimento Institucional; e, portanto, foi inserida no Plano de Aquisições do Procidades. Diante dessa possibilidade, esta Secretaria buscou atuar em coordenação à SDE, visando a implantação da solução Building Information Modeling – BIM, que compreende a aquisição de servidor, switches e estações de trabalho (workstation), novos e em primeiro uso, além de solução de software de ferramenta BIM, transferência de conhecimento e consultoria (00110-00002463/2020-84).

Em 2021, esta Secretaria participou de todas as reuniões, coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, cujos esforços alavancaram a retomada do contrato com o BID, sendo continuadas as obras até então paralisadas e as licitações pendentes, levando o BID em recente reunião de avaliação a elogiar os esforços do GDF, culminando em nova prorrogação do prazo da operação de crédito até 10/09/2022.

3.7 Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento Básico

A SODF deu prosseguimento aos trabalhos de elaboração e implementação de políticas públicas que versam sobre saneamento básico no DF, bem como em processos de licenciamento e monitoramento ambiental de obras públicas. Atuou-se diretamente na

organização de 05 Reuniões Ordinárias do Conselho de Saneamento Básico do DF e em 03 Grupos de Trabalho criados no âmbito desse Conselho.

3.7.1 Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB

No ano de 2021, além do acompanhamento e gestão, junto aos responsáveis pelas demandas e ações exigidas nos Planos PDSB e PDGIRS, a Secretaria, visando o cumprimento de metas, provocou a criação, novamente, da Comissão Técnica a fim de atualizar e revisar os Planos, visto que os mesmos já possuem 04 anos de existência. Nesse sentido, por meio da Portaria Conjunta nº 08, de 28/06/21 foi instituída a Comissão Técnica para a revisão do PDSB e PDGIRS. E, posteriormente, a Portaria nº 112, de 09/08/21 designou os representantes de cada entidade para compor a Comissão Técnica. No segundo semestre foram realizadas reuniões, pela Comissão Técnica, visando o levantamento dos programas e indicadores que atualmente não foram cumpridos, a fim de verificar a necessidade de atualização das metas, no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; e prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

3.7.2 Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PDGIRS

Neste exercício, assim como o PDSB, o PDGIRS, instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, previsto na Lei nº 12.305/10, cujo objetivo principal é traçar diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos no DF, foi objeto de avaliação, visando à revisão e atualização dos programas e metas por meio da atuação da Comissão Técnica. Ocorreram reuniões no segundo semestre de 2021, e, as prestadoras de serviço (SLU e Novacap) avaliaram a minuta do Termo de Referência (TR) que subsidiou a contratação dos Planos em 2017 e realizaram proposta de novo TR, cujas tratativas serão discutidas em 2022.

3.7.3 Decretos Distritais, Comissões e Conselhos

3.7.3.1 Comitê Gestor do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Volumosos – CORC/DF

O CORC/DF, Comitê instituído pelo art. 14 da Lei nº 4.704 de 20/12/11, em seu § 2º “estabelece que o Serviço de Limpeza Urbana do DF e a Secretaria a que se vincula darão suporte técnico às atividades do comitê”. Diante da publicação do Decreto nº 41.693 de 05/01/21, que alterou o Decreto nº 39.610, de 01/01/19 e o Decreto nº 38.859, de 16/02/18, que passou a vinculação do Serviço de Limpeza Urbana do DF - SLU para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do DF – SEMA foi necessário ajuste na coordenação dos seguintes órgãos colegiados: Conselho de Limpeza Urbana - Conlurb e Comitê Gestor do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Volumosos do DF- CORC/DF, de modo a repassar a coordenação dos referidos órgãos colegiados à SEMA, órgão ao qual o SLU está atualmente vinculado. A SEMA acolheu os trâmites para a edição dos instrumentos essenciais à atualização dos diplomas, de modo a formalizar a assunção de competências atribuídas àquela Secretaria como gestora responsável pela política de gestão dos resíduos sólidos urbanos.

3.7.3.2 Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – CONSAB

O CONSAB é composto por 24 membros que representam quatro grupos: Administração Pública do DF; prestadores de serviço de saneamento básico; usuários de serviços de saneamento básico; e de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e entidades de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento. Em 2021 foram realizadas tratativas relacionadas aos seguintes temas: Mudanças do regime hidrológico no DF; Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas - SIMCURB; Zoneamento Ecológico-Econômico do DF - ZEE com foco em saneamento básico; Educação ambiental orientada ao saneamento básico; Projeto Acertar – Sistema utilizado para melhorar a qualidade da informação sobre o saneamento básico no Brasil; Atendimento de saneamento básico às populações informais e vulneráveis do DF; Atividades realizadas no ano de 2021 quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Criou-se 3 Grupos de

Trabalho (GT) do Conselho, quais sejam: GT de educação ambiental – criado com o objetivo de "propor diretrizes gerais e estratégicas para a educação ambiental orientada ao saneamento básico no DF." GT de populações vulneráveis – criado com o objetivo de "propor diretrizes gerais e estratégicas visando ao atendimento das populações informais e vulneráveis do Distrito Federal com serviços de saneamento básico". GT processo seletivo – criado com o objetivo de "apoiar na elaboração de Portaria instituindo os procedimentos de credenciamento, indicação e escrutínio dos membros da sociedade civil para composição CONSAB/DF em mandato de 2022 a 2024". Para o próximo ano, o desafio se configura em continuar fortalecendo o Conselho, de forma a desenvolver atividades de acompanhamento da execução, discutindo temas relevantes sobre a questão do saneamento básico voltados à gestão e prestação dos serviços públicos, além do acompanhamento dos programas, metas e indicadores previstos no Plano.

3.7.3.3 Acompanhamento Ambiental de Obras Públicas

3.7.3.3.1 Licenças, Acompanhamento de Execução e Outorgas

No ano de 2021 a Secretaria realizou a gestão e o acompanhamento ambiental de diversos empreendimentos no DF. A equipe técnica da Secretaria trabalhou em diversos procedimentos para a obtenção de autorizações e licenças ambientais de interesse, da Pasta, e de outros Órgãos, sendo as respectivas obras acompanhadas, em geral, por esta SODF, de forma a auxiliar na clara execução das atividades em conformidade com a legislação ambiental.

Na Tabela 1, abaixo, estão relacionadas as Licenças e Autorizações recebidas durante este exercício:

Tipo	Empreendimento	Interessada	Atividade Licenciada
ASV 2053.4.20 21.51346	Viaduto da EPIG e alças de acesso e infraestrutura urbana, no âmbito do Corredor Oeste	SODF	Supressão de Vegetação para instalação do viaduto da EPIG e alças de acesso.
ASV - Renovação 2053.4.20 20.25155	Túnel de Taguatinga e Viadutos acessórios na Av. Samdu e EPCT/EPTG	SODF	Corte de Árvores Isoladas associado à atividade licenciável (Obra de Arte Especial - Túnel de Taguatinga e Viadutos Acessórios na Avenida Samdu, EPCT/EPTG e Usina de Concreto).
AA 06/2021	ESPM até o Terminal da Asa Sul	Terracap	Extração de material de empréstimo (solo) na área do jôquei e Bota espera provisório oriundo das obras de implantação de infraestrutura da via da Estrada Setor Policial Militar Sul (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).
AA 031/2021	Recuperação Ambiental - Trecho 03 de Vicente Pires	Terracap	Execução do Plano de Recuperação Ambiental do Setor Trecho 03 - Vicente Pires.
LAS 02/2021	Via de ligação Guarã II e o Núcleo Bandeirante	Novacap	Implantação de obras de arte e duplicação da ligação entre o Guarã II e o Núcleo Bandeirante, inclusive passagens superiores sobre a Estrada de Ferro no acesso à vila EPVT, sobre a pista contorno do Guarã II e sobre o córrego Vicente Pires
LAS 07/2021		SODF	
LAS 08/2021	Av. Hélio Prates - Taguatinga	SODF	Implantação de faixa adicional contígua às faixas existentes, entendida como terceira faixa, sem relocação de população (Etapa 2)
LAS 30/2021	Túnel de Taguatinga	SODF	Túnel de Taguatinga e Viadutos acessórios na Avenida Samdu e EPCT/EPTG
LI 05/2021	Sol Nascente Trecho 02	Codhab	Complementação de drenagem pluvial e de pavimentação de vias do Trecho 02 do SHSN
LI 06/2021	Sol Nascente Trecho 03	Codhab	Regularização de núcleo urbano informal
LI 11/2021	Sol Nascente Trecho 01	Codhab	Regularização do parcelamento de solo urbano – Trecho 01 – Etapa 1 (ARIS Sol Nascente)
LI 15/2021	SOF SUL	Particular	Implantação e ampliação do sistema de drenagem pluvial e revitalização do pavimento asfáltico do SOF SUL e ampliação do sistema viário de acesso ao SOF SUL.
LI 24/2021	Sol Nascente Trecho 02	Codhab	Regularização de Parcelamento de Solo Urbano
LI 21/2021	Vicente Pires Trecho 03 (Gleba 01)	Terracap	Regularização de Parcelamento de Solo Urbano

Destaca-se, também, que a equipe técnica desta Secretaria atuou na manutenção das licenças ambientais vigentes, requerendo renovação ao órgão competente nos prazos legais estabelecidos e apresentando as informações técnicas necessárias à instrução de processos. E, em 2021, foi emitida a Outorga Prévia nº 20/2021, referente a um ponto de descarga no córrego do Guará, para o sistema de drenagem urbana do empreendimento “Rota de Segurança,” no SIN. Outro instrumento relevante para as ações desta Pasta, foi a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA, que desobriga automaticamente os empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do DF. Segue na Tabela abaixo as DLAs, alcançadas pela citada Resolução:

Tabela 2 - Quadro de Dispensa de Licenciamento Ambiental

Data	Objeto
20/01/2021	Requalificação da Av. Paranoá.
29/01/2021	Instalação de campo de futebol de grama sintética, Vila Planalto.
14/06/2021	Requalificação de duas praças nas QDs. 113 e 310, Recanto das Emas.
05/11/2021	Requalificação de calçadas na Av. W3 Sul, entre as QDs. 703 e 715.

Para a obtenção de todos os instrumentos elencados acima, na Tabela 1, a SODF atuou direta e indiretamente junto aos interessados e aos órgãos reguladores, de forma a instruir corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o monitoramento das atividades na esfera ambiental de acordo com as disposições previstas nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições.

Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SODF, quanto à temática ambiental:

- Setor Habitacional Vicente Pires - O Ibram emitiu a nova Licença de Instalação - LI nº 21/2021 – Ibram/PRESI referente ao Trecho 03 (Gleba 01), com validade de 4 anos. O Órgão ambiental, também se manifestou favorável à renovação tácita da LI nº 021/2016 que alcança as Glebas 2 e 4, que se tornou necessária, pois a vigência da referida licença terminaria em dez/2020. Por força da Instrução Normativa nº 20, de 02/06/20, emitida em virtude da pandemia da COVID-19, a LI (Corretiva) nº 042/2014 referente à Gleba 3 (Trecho 01), encontra-se tacitamente renovada até manifestação em definitivo pelo Ibram. Cabe ressaltar que as obras do empreendimento continuam em andamento, e por vezes há interferências com indivíduos arbóreos nas frentes de trabalho, os quais só podem ser suprimidos com Autorização de Supressão Vegetal – ASV, entretanto o prazo de validade da ASV, nº 03/2020, findou-se em 22/02/21. Portanto, a Secretaria realizou tratativas junto à Terracap e Ibram para emissão de manifestação pela dispensa de ASV ou a sua renovação, visando evitar a paralisação das obras de infraestruturas. Por sua vez, o Ibram emitiu parecer pela dispensa da ASV permitindo a supressão de indivíduos arbóreos até a conclusão das obras.
- Setor Habitacional Bernardo Sayão - Acompanhou-se as atividades finais dos Lotes 02 e 03 deste empreendimento. As licenças ambientais e as autorizações de supressão foram emitidas para todo o empreendimento em nome da Terracap.
- Setor Habitacional Sol Nascente (Trechos 01, 02 e 03) - A SODF atuou junto a Novacap para elaboração de Relatório de Cumprimento de Condicionantes da Licença de Instalação nº 15/2018 (Trecho 01 - Etapa 1); da Licença de Instalação nº 32/2018 (Trecho 03), e da Licença de Instalação nº 05/2021 (Trecho 02). E, ainda, atuou, junto à Codhab para que as informações fossem encaminhadas ao Ibram visando à renovação e/ou emissão de novas licenças ambientais, sendo essas: Licença de Instalação - LI nº 11/2021 (Trecho 01 - Etapa 1), Autorização Ambiental nº 49/2021 (Trecho 01 - Etapa 2), LI nº 24/2021 (Trecho 02), e LI - Corretiva nº 06/2021 (Trecho 03).
- ESPM (Estrada Setor Policial Militar) e ESPM - T15 (Corredor Eixo Oeste) - Obteve-se a Licença de Instalação – LI, realizou-se inventário florestal, elaborando os relatórios e plano de supressão junto ao Sinaflor-Ibama, e, encaminhou-se os documentos ao Ibram para emissão de autorização de supressão vegetal. Em relação ao T15, foi renovada a ASV até jul/2022.

- Túnel de Taguatinga (Corredor Eixo Oeste) - Acompanhou-se as atividades do Túnel de Taguatinga, por meio da Supervisora Ambiental, contratada de forma a atender a licença ambiental. A SODF tem monitorado as atividades ambientais da obra por meio da referida Supervisora que emite relatórios mensais.
- Praia Norte - realizado monitoramento das condicionantes ambientais contidas na Autorização Ambiental (AA) nº 031/2027, e desse trabalho foi elaborado o relatório de acompanhamento ambiental e encaminhado ao Ibram, visando o bom andamento do processo de licenciamento ambiental.
- Viaduto EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) - Obtida a autorização de corte de árvores isoladas, mediante realização de inventário florestal e com a complementação das informações oriundas da supervisora ambiental contratada. O inventário foi protocolado no Ibram, dando origem à autorização emitida. A SODF, por meio de sua equipe técnica atuou na orientação quanto à proteção da fauna dos indivíduos corujas-buraqueira, sendo solicitado que a empresa instalasse sinalizações de forma a evitar qualquer dano aos animais, até a mudança natural de habitat ou resgate por meios dos órgãos competentes.
- Drenagem SOF SUL - realizado o acompanhamento das atividades pertinentes à emissão de Licença de Instalação - LI SEI-GDF n.º 15/2021 - Ibram/PRESI. Obra de relevante interesse da população, tendo em vista as dificuldades recorrentes oriundas de alagamentos provocados pela ausência de um sistema eficiente de drenagem. Assim, desenvolveu-se um trabalho contínuo de acompanhamento do processo de licenciamento ambiental da intervenção programada.
- Via de Ligação Setor de Inflamáveis - realizada gestão perante o Ibram, DF Legal e a PMDF/DEMA para liberar as áreas de intervenção da obra que possuíam ocupações irregulares.

3.7.4 Gestão Ambiental

A Secretaria realizou ações no sentido de fortalecer a Gestão Ambiental e executou o gerenciamento de informações de obras contratadas junto ao Sistema e-RCC do SLU. As empresas contratadas foram habilitadas para emissão de Controle de Transporte de Resíduos - CTR vinculado aos seus contratos em execução. Esse sistema permite o acompanhamento do resíduo gerado por cada intervenção, quantitativo de material destinado na Unidade de Recebimento de Entulho - URE/SLU, acompanhamento de cobrança relacionada à recepção e ao gerenciamento de resíduos de construção civil pelo SLU. A habilitação da contratada cessa no prazo estipulado na execução contratual e/ou ao atingir limite de RCC previsto em contrato/projeto. A inclusão de novas obras e a habilitação das empresas executoras para abertura de CTR se dão conforme demanda apresentada pelo setor competente.

A Pasta recebeu por meio do Sinaflor 2 Autorizações de Supressão Vegetal, para as obras do Viaduto EPIG, ESPM-T15 e ESPM-T16, Sistema de Gestão de Solo de Escavação - SGSE. Verificou-se a necessidade de aprimorar a gestão do solo de escavação, uma classe de resíduo da construção civil, tendo buscado apoio dos setores competentes para a elaboração de um sistema de gestão do solo. Foi editada a Portaria nº 201/2021, instituindo o Sistema como ferramenta prioritária para a gestão do solo proveniente das obras de interesse desta Secretaria, como fonte primária de inserção de dados para a gestão do solo. Realizou-se, também, gestão junto ao Ibram, para fins de levantamento de áreas/jazidas licenciadas pelo órgão ambiental competente e apto a fornecer materiais como cascalho laterítico, argila, areias e pedras britadas, visando ao fornecimento do material para as obras desta Secretaria.

3.8 Principais situações que requereram avaliação da Assessoria Jurídico-Legislativa

Sobre a atuação, desta Pasta, no que tange a viabilidade jurídica, houve grande empenho neste exercício para destravar importantes procedimentos licitatórios e dar andamento em ações que viabilizaram o prosseguimento de grandes obras. Desta forma, atuou-se, diligentemente, em respostas às representações e questionamentos apresentados pelo Controle Interno e Externo (CGDF e TCDF); às ações propostas pelo MPDFT e às provenientes do Judiciário (TJDFT); bem como quanto ao acatamento das recomendações e determinações proferidas pela PGDF, atentando sempre para o interesse público na execução das obras e serviços de engenharia realizados por esta Secretaria.

Destaca-se que devido às variações de preços de insumos de obras, em 2021, houve a necessidade de se padronizar os procedimentos para avaliação igualitária da grande quantidade de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, que eram recebidos, assim, houve a necessidade de se instituir Grupo de Trabalho Interno - GTI para estudar e propor padronização de procedimentos a serem adotados para a análise e a aprovação dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiros dos contratos em vigência, nesta SODF (Portaria Interna nº 01, de 04/10/2021). Com a elaboração do "Manual de Metodologia de Revisão de Preços RV-3," pode-se analisar a viabilidade jurídica dos pleitos apresentados nos contratos: nº 14/2021 (Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras, ao longo, da Av. Hélio Prates), nº 20/2021 (Interseção da Rodovia DF-011 – EPIG, com a via de acesso ao Parque da Cidade e Setor Sudoeste), e nº 21/2021 (Projeto de Urbanização no Mestre D'Armas – Pró-Moradia).

Em observância a legislação vigente e as recomendações do TCDF (Despacho Singular nº 224/2021 – GCMM/TCDF), atuou-se na aprovação do Termo de Referência - TR e, em conjunto com a Novacap, formulou o Edital do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para licitar os serviços de readequação da EPIG, necessários para a implantação de Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no Sistema BRT (Bus Rapid Transit), do Corredor Eixo Oeste, bem como para atender ao Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF – PDTU/DF. E, por meio da Decisão nº 3756/2021 do TCDF foi determinado o prosseguimento do certame, condicionado ao saneamento de falhas, que foram corrigidas com a apresentação da identificação de documentos de Responsabilidade Técnica pelos Orçamentos Onerado e Desonerado.

Certames licitatórios foram desembaraçados e importantes obras puderam ser contratadas, tais como:

- Tomada de Preços nº 003/2019 – ASCAL/PRES/Novacap - Praça do Povo - Contrato 006/2021;
- Concorrência nº 009/2020 – ASCAL/PRES/Novacap - Infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato 019/2021;
- Concorrência nº 001/2019 - ASCAL/PRES/Novacap - Viaduto na interseção entre a DF-011 (EPIG) e o Parque da Cidade/Setor Sudoeste - Contrato 020/2021;
- Tomada de Preços nº 002/2020 - ASCAL/PRES/Novacap - Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana e OAE (travessias); Lote 01 e Lote 02 - Trecho 03 (Infraestrutura Urbana das Bacias 01 e 02 e Áreas Remanescentes), no Setor Habitacional Sol Nascente - SHSN - Contratos nº 015/2020 (Lote 1) e nº 016/2020 (Lote 2);
- Concorrência nº 012/2020 – ASCAL/PRES/Novacap - Infraestrutura dos serviços remanescentes do Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 2 - Contrato 015/2021.
- E, ainda, com relação ao Sol Nascente, foram adotadas providências para o andamento dos seguintes certames:
- Concorrência nº 009/2021 – DECOMP/DA/Novacap (Infraestrutura no SHSN, Trecho 01 e parte do Trecho 03, bacias e OAE que promoverá a ligação interna entre os Trechos 01 e 02) Suspensa, cautelarmente, pelo TCDF (Despacho Singular 532/2021-GCRR) para a adoção de medidas corretivas no tocante à ausência de Licença Prévia e impropriedades na elaboração do orçamento estimativo e na previsão do quantitativo de piso intertravado exigido na licitação.
- Concorrência nº 012/2021 - DECOMP/DA/Novacap (Infraestrutura no SHSN, Trecho 03 (Lote 01), incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e bacias de detenção) - Edital publicado (DODF de 16/12/21), com data prevista para a realização do certame em 18/01/22.
- Concorrência nº 013/2021 - DECOMP/DA/Novacap (Infraestrutura no SHSN, Trecho 03 - Lote 02) - Edital publicado (DODF de 16/12/21) com data prevista para a realização do certame em 19/01/22.

Importante destacar, também, a atuação das áreas técnicas, desta Pasta, no sentido de cumprir a Determinação Judicial, proferida em dez/2020 e sanar as pendências apontadas, para dar continuidade à execução dos serviços de construção da bacia de detenção, do Canal e Bueiro N.A.T.M (New Austrian Tunnelling Method), cerca viva e plantio de grama no km 4 da DF-290, em Santa Maria. No intuito de diminuir o impacto das referidas obras na população daquela localidade, apresentou à PGDF as providências adotadas com relação à decisão em

sede de Embargos de Declaração (Agravo de Instrumento nº 0700043-89.2021.8.07.0000), e diligenciou junto ao DER/DF, que tem jurisdição sobre a Rodovia (DF-290), para que promovesse a execução do envelopamento da AAB-SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.), o que possibilitou dar continuidade aos serviços contratados (Contrato nº 001/2020) e a obra foi concluída em junho/2021.

3.9 Controle Interno

A Unidade de Controle Interno – UCI/SODF, com o advento da Portaria nº 141/20-SODF, de 18/12/20, passou a executar análises, prévias, da conformidade da instrução de todos os processos, referentes aos aditivos contratuais e pagamentos dos contratos desta SODF, bem como, assegurar que os pagamentos decorrentes de alterações contratuais tivessem observância aos princípios da legalidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Este procedimento contribuiu para uma melhora expressiva na qualidade da instrução dos processos de pagamento e aditivos contratuais e uma maior adequação às normas vigentes. Atuou-se, ainda, no acompanhamento das Ações de Controle (Auditorias e Inspeções); nas manifestações do Secretário nos Informativos de Ações de Controle – IAC; nos Relatórios de Auditorias e Inspeções e nas Tomadas de Contas Especiais instauradas no âmbito desta Pasta ou das entidades supervisionadas.

3.10 Correição

Deu-se continuidade aos procedimentos administrativos instaurados em anos anteriores, sendo também instauradas novas apurações, totalizando 14 procedimentos administrativos, dos quais: 02 Sindicâncias e 02 Tomadas de Contas Especiais – TCE que estão em apuração; e 06 Sindicâncias; 02 Tomadas de Contas Especiais e 02 Procedimentos de Investigações Preliminares - PIP foram concluídos neste exercício. Ressalta-se, ainda, que estão sob análise a instauração de outros 12 procedimentos administrativos, quais sejam: 08 Sindicâncias, 03 Tomadas de Contas Especiais - TCE e 01 Procedimento de Apuração de Fornecedor – PAF.

3.11 Gestão Estratégica e Projetos

Gestão Estratégica

Ainda, neste exercício, acompanharam-se as metas do Planejamento Estratégico Institucional das Unidades desta SODF, com perspectiva de realizar em 2022, uma análise crítica das batalhas, iniciativas e ações com vistas a propor melhorias nos resultados alcançados.

Gestão de Riscos

O Processo de Gestão de Riscos desta SODF foi reestruturado, com redefinição do escopo, e, criada uma nova matriz de riscos, com elaboração do Plano de Ação de Prevenção e Monitoramento. Realizou-se, neste exercício, o mapeamento de Processos da Comissão Permanente de Licitação – CPLIC e da AGEPE, e para o próximo exercício há perspectiva de realização do monitoramento de riscos e criação de indicadores, em conjunto com as unidades da SODF.

Comitê Interno de Governança e Modelo de Excelência em Gestão de Transferências da União

Promoveu-se soluções para melhoria do desempenho institucional e para a implementação de boas práticas de governança e compliance. Atualizou-se a Portaria que instituiu o Comitê Interno de Governança Pública – CIG, criado com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva, nos

termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública – CGov. O Comitê, desta SODF incorporou as atribuições e competências tratadas no Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEGTr (Portaria nº 185, de 17/11/21, considerou a Portaria nº 66, de 31/03/17 e a Portaria nº 143, de 20/09/21). Considerou-se, também, a Resolução nº 03, de 06/10/21, do CGov incorporando novas competências ao CIG, em temas de governança correlatos às áreas de desburocratização, tecnologia da informação, inovação e mapeamento de processos.

Em 2021, o Modelo de Excelência em Gestão de Transferências da União (MEG-Tr) teve sua implantação iniciada na área de Gestão de Recursos Externos, desta SODF, sendo suas ações monitoradas e acompanhadas pela Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos – AGEP. E, neste exercício, a Secretaria alcançou a categoria Bronze 2 com a pontuação provisória de 36,27, demonstrando que apresenta melhorias na sua gestão, na prestação dos serviços, nos resultados decorrentes da priorização e adoção de boas práticas de gestão. Para o próximo ano a SODF irá acompanhar e executar as ações de melhorias propostas no âmbito do Instrumento MEG-Tr 100 Pontos, em conjunto com o setor de gerenciamento de recursos externos desta Secretaria.

Programa de Integridade de Pessoas Jurídicas

A Secretaria implantou o Programa de Integridade de Pessoas Jurídicas que consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios e fraudes, com base no Decreto nº 40.388, de 14/01/20 e na Lei Distrital nº 6.112 de 02/02/18, alterada pela Lei nº 6.308, de 13/06/19, que estabelece a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do DF, em todas as esferas de Poder, com valores globais iguais ou superiores a R\$ 5.000.000,00, e em consonância com as orientações da CGDF. Foram monitoradas as empresas que executam os seguintes contratos:

Contrato	Empreendimento
014/2021	Requalificação da Via MN1
015/2021	Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 02
022/2021	Reformulação do Sistema Viário na ESPM – Corredor de Transporte Urbano Eixo Oeste

Programa de Integridade Interna

Publicou-se, neste exercício o Regimento Interno de Ética da SODF (Portaria nº 142 de 27/09/21), e encontra-se em elaboração a Cartilha e o Código de Conduta dos Servidores Públicos desta Secretaria, com publicação prevista no início de 2022.

3.12 Ouvidoria

As manifestações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, foram registradas, em 2021, pelos canais de atendimento, 10.992 demandas, destinadas a esta Secretaria. No que concerne à quantidade de demandas quanto à classificação foi: 5.868 reclamações, 4.974 solicitações, 51 elogios, 59 sugestões, 40 informações, e nenhuma denúncia. As Regiões Administrativas que mais demandaram foram: Plano Piloto 1.663; Ceilândia 1.080; Taguatinga 976; Samambaia 761; Gama 670; Guará 601; Recanto das Emas 514; Planaltina 472; Santa Maria 415 e São Sebastião 392.

Entre os temas mais abordados estão: Funcionamento de Postes de Iluminação 9.012; Falta de Iluminação Pública 1.023; Instalação de Poste de Iluminação 444; Galeria de Águas Pluviais 61; Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 58; Remanejamento de Poste de Iluminação Pública 56; Pavimentação Urbana – Asfalto 38; Execução de Obras Públicas na Área de Infraestrutura Urbana 23; Construção de Calçadas e/ou meios fios 22; Serviço Prestado por Órgão/Entidade do Governo do DF 22.

Destaca-se que das 10.992 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SODF, o cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, que derivou na seguinte classificação: 64% Respondidas, 16,4% Não Resolvidas, 0,4% Não Resolvidas após a Resposta Complementar, 15,2% Resolvidas, 1% foram avaliadas como Resolvidas após a Resposta Complementar, e 3% se encontram em análise.

Em cumprimento à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, os pedidos, direcionados a esta Secretaria, somaram um total de 51 solicitações, no ano de 2021, impetrados 07 Recursos de Primeira Instância, representando 13,7% do total de pedidos. Registra-se, ainda, 406 atendimentos à imprensa, efetuados pela Assessoria de Comunicação, e com intuito de se aproximar, ainda mais da população do DF, criou-se o perfil da SODF no instagram (@sec_obras) por meio do qual o cidadão tem acesso direto aos trabalhos que estão sendo executados por esta Secretaria.

Pelo 6º ano consecutivo a Secretaria de Obras foi premiada por apresentar 100% de pontuação no Índice de Transparência Ativa (iTA), premiação concedida pela CGDF que estabeleceu, em 2016, o Índice de Transparência Ativa (iTA) para avaliar o grau de cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), e ranquear os Órgãos e Entidades do GDF que se destacam na publicação das informações de transparência ativa, em atendimento à Lei nº 4.990/2012.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

4.1 Panorama da Execução Orçamentária e Financeira

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura/SODF, a partir da edição da Lei Orçamentária Anual - LOA, (Lei nº 6.778, de 06/01/2021), obteve em seu Orçamento, no exercício financeiro de 2021, o valor fixado de R\$ 647.327.669,00, para a programação das despesas pertinentes à atuação da Pasta, que acrescido das movimentações orçamentárias, ao longo do ano, alcançou o montante de R\$ 739.557.170,91, a título de Despesa Autorizada.


Apresenta-se abaixo a distribuição dos valores alocados por Grupo de Despesas, desmembrados por Fontes de Recursos:

1- Recursos orçamentários alocados por Grupo de Despesas:

Grupo de Despesas	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	Empenho Liquidado / Despesa Autorizada (%)	Empenho Liquidado / Total Empenhado (%)
1 - Pessoal e Encargos	20.726.929,00	20.866.929,00	20.542.747,14	20.515.791,30	98,32%	99,87%
3 - Outras Despesas Correntes	245.876.934,00	254.131.306,23	249.647.354,97	217.935.333,18	85,76%	87,30%
4 - Investimentos	380.723.806,00	464.558.935,68	207.223.820,93	177.704.490,78	38,25%	85,75%
Total	647.327.669,00	739.557.170,91	477.413.923,04	416.155.615,26	56,27%	87,17%

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial, por Unidade Gestora - UG. Posição: 31/12/2021

Gráfico correspondente aos recursos alocados por Grupo de Despesas:

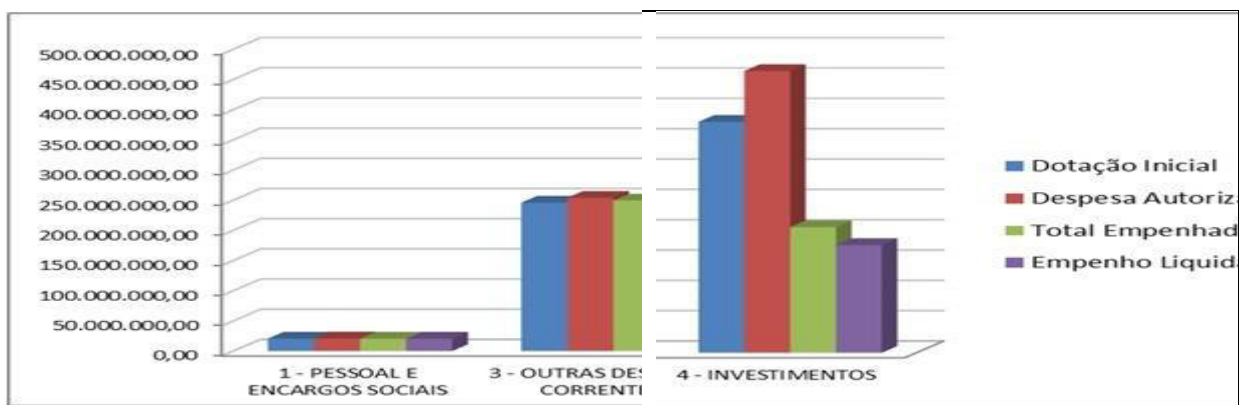

2 – Recursos orçamentários alocados por Grupo de Despesas, desmembrados por Fontes de Recursos:

Posição: 31/12/2021

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	Crédito Disponível	Empenho Liquidado / Despesa Autorizada (%)	Empenho Liquidado / Total Empenhado (%)
Pessoal e Encargos Sociais	1	100	Ordinário Não Vinculado	20.726.929,00	20.726.929,00	20.408.460,36	20.381.504,52	318.468,64	98,33%	99,87%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	0,00	140.000,00	134.286,78	134.286,78	5.713,22	95,92%	100,00%
		Total Grupo 1		20.726.929,00	20.866.747,14	20.542.747,14	20.515.791,30	324.181,86	98,32%	99,87%
Outras Despesas Correntes	3	100	Ordinário Não Vinculado	9.602.797,00	37.613.209,00	36.276.423,31	6.987.448,67	276.197,05	18,58%	19,26%
			Emendas Parlamentares Individuais	8.395.000,00	400.000,00	399.687,77	399.687,77	312,23	99,92%	100,00%
		111	Taxa de Expediente	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00%	0,00%
		120	Diretamente Arrecadados	11.696,00	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00	0,00%	0,00%
		121	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	980,00	12,15	12,15	967,85	1,24%	0,00%
		131	Convênios com Órgãos do GDF	0,00	500.000,00	300.000,00	126.629,79	200.000,00	25,33%	42,21%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	159.503.673,00	154.956.154,23	154.956.154,08	154.482.449,49	0,15	99,69%	99,69%
		135	Operações de Crédito Internas	0,00	5.237.383,00	2.629.511,33	1.285.348,39	2.607.871,67	24,54%	48,88%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	68.363.741,00	53.919.635,00	53.834.712,02	53.824.418,32	84.922,98	99,82%	99,98%
		321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	382.725,00	142.045,40	135.394,89	240.679,60	35,38%	95,32%
		332	Convênios Outros Órgãos - Exercícios Anteriores	0,00	181.081,00	181.079,28	176.056,08	1,72	97,23%	97,23%
		335	Operações de Crédito Internas	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	100,00%	100,00%
390	Contrapartida de Convênio - Tesouro	0,00	15.843,00	15.842,02	15.842,02	0,98	99,99%	100,00%		
821	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	395,00	394,43	394,02	0,57	99,86%	100,00%		

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	Crédito Disponível	Empenho Liquidado / Despesa Autorizada (%)	Empenho Liquidado / Total Empenhado (%)
		832	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	0,00	703.178,00	702.493,18	292.651,18	684,82	41,62%	41,66%
		Total Grupo 3		245.876.934,00	254.131.306,23	249.647.354,97	217.935.333,18	3.423.362,62	85,76%	87,30%
Investimentos	4	100	Ordinário Não Vinculado	8.000.000,00	29.132.015,00	28.854.240,18	25.578.905,84	277.774,82	87,80%	88,65%
			Emendas Parlamentares Individuais	16.843.000,00	2.160.604,00	1.153.297,11	1.076.839,39	507.306,89	49,84%	93,37%
		131	Convênios Outros Órgãos do GDF	87.297.760,00	93.529.369,00	31.965.449,79	28.165.552,82	61.563.919,21	30,11%	88,11%
		132	Convênios Outros Órgãos (Não Integrantes do GDF)	11.644.860,00	2.229.860,00	0,00	0,00	2.229.860,00	0,00%	0,00%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	4.388.232,00	2.935.748,52	2.935.748,18	953.048,60	0,34	32,46%	32,46%
		135	Operações de Crédito Internas	223.129.951,00	257.748.314,00	95.289.534,11	78.915.017,95	162.458.779,89	30,62%	82,82%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	1.880.671,00	25.383.280,16	25.383.278,49	22.332.860,48	1,67	87,98%	87,98%
		321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	172.858,00	0,00	0,00	172.858,00	0,00%	0,00%
		335	Operações de Crédito Internas	0,00	17.715.204,00	14.574.946,52	14.372.547,05	3.140.257,48	81,13%	98,61%
		390	Contrapartida de Convênio - Tesouro	0,00	6.012.351,00	5.998.757,43	5.998.757,43	13.593,57	99,77%	100,00%
		732	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	27.539.332,00	27.539.332,00	1.068.569,12	310.961,22	26.470.762,88	1,13%	29,10%
				Total Grupo 4		380.723.806,00	464.558.935,68	207.223.820,93	177.704.490,78	256.835.114,75
Total Grupos 1, 3 e 4 - R\$			647.327.669,00	739.557.170,91	477.413.923,04	416.155.615,26	260.582.659,23	56,27%	87,17%	

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial, por Unidade Gestora - UG.

Observa-se que a maior parte dos recursos correspondentes ao Grupo 3 – Outras Despesas Correntes, era vinculada à Contribuição para Iluminação Pública - CIP, oriunda da arrecadação do DF (Fonte 134), destinada à execução das ações de fornecimento de energia elétrica e de manutenção de Iluminação Pública no DF.

Também em relação aos recursos destinados a custear as ações de iluminação pública, cabe salientar que no exercício de 2021 ocorreu a transposição de dotações orçamentárias, originalmente alocadas no Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD desta Secretaria (Unidade Orçamentária 22.101), para a Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF (Unidade Orçamentária 19.101), mediante o Decreto nº 41.991, de 12/04/21 (DODF nº 68, de 13/04/21).

Por conseguinte, houve a necessidade de celebração de Portarias Conjuntas de descentralização de créditos orçamentários entre a SEEC/DF e esta SODF, no montante de R\$ 84.545.988,23, utilizados para efetivar as liquidações/pagamentos de despesas mensais dos contratos firmados por esta Pasta, pertinentes à execução de ações relacionadas à Iluminação Pública (CT nº 002/2017 e CT nº 004/2018). Todavia, com a edição do Decreto nº 42.657, de 26/10/21 (DODF nº 202, de 27/10/21), ocorreu uma nova transposição de dotações, que, inversamente ao Decreto nº 41.991/2021, retornou parte dos créditos alocados na SEEC/DF para o Orçamento desta Secretaria, restando desnecessária a continuidade dos procedimentos de descentralização de créditos entre as partes.

Além dos recursos vinculados à CIP, houve necessidade de aporte adicional nas fontes 100 e 183, para custear as despesas decorrentes da administração do Parque de Iluminação Pública do DF, relativas ao último bimestre de 2021, sendo obtido acréscimo de R\$ 31.164.003,00 apenas em 31/12/2021, com a publicação do Decreto nº 42.888/2021.

Frisa-se, no entanto, que montante substancial dos recursos adicionados ao Grupo 3 em 31/12/2021, restou não liquidado, uma vez que as despesas referentes à manutenção de iluminação pública do mês de dezembro/2021, terão suas medições apresentadas na segunda quinzena de janeiro/2022, e serão quitadas mediante saldo de notas de empenho inscritas em restos a pagar não processados.

Ainda sobre o Grupo 3, pondera-se em relação aos recursos alocados na fonte 100, que estes possibilitaram custear as despesas com a prestação dos serviços de consultorias técnicas especializadas, decorrentes dos contratos nºs 018/2020, 018/2021 e 025/2021, imprescindíveis para dar suporte à supervisão e o acompanhamento das seguintes obras: implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga; interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste, incluindo alças de acesso, calçadas, dois viadutos e infraestrutura urbana; e a reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar – ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto W3 Sul, para implantação de Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no Sistema BRT (Bus Rapid Transit), denominado Corredor Eixo Oeste.

Acerca dos recursos do Grupo 4 – Investimentos, verifica-se que aproximadamente 92% da dotação inicial estava vinculada às fontes de recursos previstas à conta de desembolsos de operações de crédito e de contratos de repasse, celebrados com a União, por intermédio da Caixa (Fontes 132, 135 e 732), bem como de convênios com órgãos integrantes da estrutura do GDF, (Fonte 131), na situação em tela, firmados com a Terracap.

Vale ressaltar que o desempenho obtido por grupos de despesas, indica haver menor eficiência na execução de recursos do Grupo 4 – Investimentos, evidenciando discrepância em relação aos demais grupos, todavia, há que se considerar, consignaçaõ acentuada nesse grupo de despesas, quanto aos recursos vinculados às fontes externas (financiamentos, contratos de repasse e convênios), que, para a efetiva realização é indispensável a conclusão de licitações de grande porte.

Especificamente sobre os empreendimentos que requerem a utilização de créditos lastreados por fontes de recursos externas, cumpre ressaltar que o valor estimado para alocação no Orçamento da Pasta é precedido de instrução por parte do setor interno que procede à gestão desses recursos, junto ao órgão financiador (Caixa). Porém, tem-se observado a impossibilidade de se aferir a previsão de execução desses créditos, linearmente, sobretudo, devido ao tempo transcorrido para se obter o desfecho de certames das intervenções vinculadas a essas fontes externas, o que tem ocasionado baixa execução orçamentária verificada nos últimos anos.

A propósito dessa constataçaõ, elenca-se no Quadro a seguir os montantes demandados para os procedimentos licitatórios, autorizados em 2021, com base nas alocações de fontes de recursos provenientes de operações de crédito/contratos de repasse. Depreende-se do estágio desses certames, que a maior parte terá prosseguimento e possível resultado no exercício subsequente de 2022:

Processo Administrativo	Intervençaõ/Serviço	Edital de Licitaçaõ	Estágio da Licitaçaõ em 31/12/2021	Valor Orçado - R\$
00110-00002590/2020-83	Desenvolvimento de projetos e execuçaõ de obras de readequaçaõ da Rodovia DF-011 – EPIG.	RDCI nº 01/2021 – DECOMP/DA	Em andamento	160.237.391,86
00110-00003128/2020-01	Elaboraçaõ e Readequaçaõ de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana – Drenar DF.	Tomada de Preços nº 001/2021 – DECOMP/DA	Em fase de homologaçaõ	3.428.735,52
00110-00001028/2021-13	Execuçaõ dos serviços da Etapa 02 da Avenida Hélio Prates em Taguatinga.	Concorrência nº 08/2021 – DECOMP/DA	Em andamento	54.072.842,50

Processo Administrativo	Intervenção/Serviço	Edital de Licitação	Estágio da Licitação em 31/12/2021	Valor Orçado - R\$
00110-00002366/2021-72	Execução das Obras de Infraestrutura Urbana Remanescentes no Trecho 01 e parte do Trecho 03, do Sol Nascente.	Concorrência nº 009/2021 - DECOMP/DA	Suspensa	53.104.205,21
00110-00002646/2021-81	Implantação de praça na Quadra 113, Recanto das Emas, RA XV, Distrito Federal.	Pregão Eletrônico nº 030/2021 - DECOMP/DA	Em fase de homologação	876.632,74
00110-00002474/2021-45	Execução das Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03/Lote 01.	Concorrência nº 012/2021 - DECOMP/DA	Em andamento	80.501.175,91
00110-00002965/2021-96	Execução das obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03/Lote 02.	Concorrência nº 013/2021 - DECOMP/DA	Em andamento	68.694.144,41
00110-00003137/2021-75	Execução das obras de infraestrutura urbana no Lote 01, do Setor Habitacional Bernardo Sayão, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e bacia de detenção.	Concorrência nº 016/2021 - DECOMP/DA	Em andamento	22.498.208,69
Valor total - R\$				443.413.336,84

Fonte: Dados extraídos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Relativamente aos recursos próprios, provenientes da arrecadação do DF, estes representaram aproximadamente 8% do total da dotação inicial (Fontes 100,183 e 134), dos quais 4% referiam-se aos créditos alocados por iniciativa do Poder Legislativo, consistindo de Emendas Parlamentares Distritais.

A despeito do baixo percentual alocado na dotação inicial, no que se refere aos recursos próprios, em especial na fonte 100, houve suplementação orçamentária na ordem de R\$ 30.189.634,00, o que possibilitou dar continuidade às obras de Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga (CT nº 004/2016), custeando os reajustamentos decorrentes dessa intervenção, e de Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul (Contrato nº 012/2020), assim como, efetivar a contratação das obras de Revitalização da Praça do Povo (CT nº 006/2021).

A suplementação obtida na fonte 100, Grupo 4, também permitiu a autorização de certames de demandas bastante reivindicadas nas regiões do Paranoá, do Setor de Oficinas Sul e na área central de Brasília, consistindo das obras de: Revitalização da Avenida Paranoá (Concorrência nº 05/2021 - DECOMP/DA), Requalificação Urbana do SOF Sul (Concorrência nº 010/2021 - DECOMP/DA) e Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul, Quadra 03 (Concorrência nº 011/2021 - DECOMP/DA).

Em relação à execução orçamentária dos créditos oriundos de emendas parlamentares distritais, salienta-se normativo afeto à matéria, editado em 2021, mediante o Decreto nº 41.919, de 19/03/21. O acompanhamento quanto à liberação desses recursos é exercido no âmbito do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP.

Nesse exercício de 2021, houve remanejamento da maior parte dos créditos de emendas parlamentares distritais, inicialmente alocadas nesta Unidade Orçamentária, tendo ocorrido liberação do montante de R\$ 2.560.604,00, por parte do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo.

Os recursos desbloqueados, procedentes de emendas, destinaram-se à execução de intervenções relacionadas às ações de iluminação pública no DF, sendo empenhados R\$ 1.552.984,88 por esta Secretaria, e efetivada descentralização orçamentária no valor de R\$

500.000,00, para a Administração Regional de Samambaia, em atendimento à solicitação do parlamentar, autor da emenda.

Salienta-se, ainda, a ocorrência de recursos liberados no montante de R\$ 507.619,12, que restou sem utilização programada pelo setor técnico competente, devido à ausência de limites nas contratações vigentes entre esta Secretaria e a CEB, além de problemas relatados por aquela Companhia quanto a questões contratuais da CEB Holding perante suas terceirizadas.

Segue abaixo o desempenho orçamentário de 2021 dos recursos oriundos das emendas parlamentares distritais:

Resumo da Execução Orçamentária - Emendas Parlamentares 2021	
Exercício 2021 (Posição: 31/12/2021)	Valor R\$
Dotação inicial	25.238.000,00
Remanejamentos efetivados por iniciativa dos Parlamentares, para outras finalidades governamentais (anulações)	21.731.396,00
Saldo consignado	3.506.604,00
Créditos bloqueados	946.000,00
Despesa autorizada	2.560.604,00
Total empenhado	1.552.984,88
Destaque concedido (descentralização orçamentária)	500.000,00
Créditos disponíveis na UG (não utilizados até o final do exercício)	507.619,12

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial, por Unidade Gestora - UG.

No tocante às descentralizações orçamentárias concedidas a outros órgãos por esta Secretaria, celebrou-se as Portarias Conjuntas nº 01 de 25/01/2021; nº 04 de 12/04/2021 e nº 05 de 11/05/2021, com a Novacap, no valor total de R\$ 690.588,64, destinadas ao pagamento de taxa ambiental; e a contratação de serviços de sondagens, ensaios técnicos, e inspeções cadastrais, rotineiras e especiais de Obras de Arte Especiais, e com a Administração Regional de Samambaia, no valor de R\$ 1.500.000,00 conforme as Portarias Conjuntas nº 11, de 15/10/2021 e nº 12, de 26/10/2021, para custear obras/serviços de iluminação pública dessa localidade.

Por último, ressalta-se o resultado global da execução orçamentária da Pasta, que demonstra uma realização de 56,27% da Despesa Autorizada, ou seja, do total de R\$ 739.557.170,91 houve liquidação do montante de R\$ 416.155.615,25.

4.2 Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício

Os resultados apresentados neste Relatório, evidenciam os impactos das ações da SODF diretamente na melhoria da qualidade de vida dos brasilienses, com a implantação de importantes obras de infraestrutura. Desta forma, o Relatório apresenta breve histórico e síntese da estrutura organizacional da SODF; as realizações dos diversos programas de governo; e, informações complementares, tais como: descritivo dos diversos empreendimentos sob a responsabilidade da SODF, convênios firmados com órgãos do GDF e da União, contratos de financiamento e de repasse, acompanhamento ambiental e políticas de saneamento básico, além de outros aspectos como o panorama da execução orçamentária e financeira no exercício de 2021 e o presente diagnóstico do desenvolvimento desta Unidade.

Diante da restrição orçamentária quanto aos recursos oriundos da arrecadação do Distrito Federal, esta Secretaria manteve como meta prioritária em 2021, programar a execução de intervenções previstas a serem custeadas a partir de recursos de financiamentos, celebrados em gestões anteriores, que ao longo dos anos não apresentavam perspectiva de efetiva concretização, o que impedia o ingresso dos recursos provenientes de operações de crédito à disposição do governo, para implementar ações específicas que restavam desatendidas, principalmente, as vinculadas à implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste.

Além disso, objetivando ampliar a possibilidade de atendimento de demandas, esta Secretaria manteve a parceria com a Terracap, mediante convênios firmados que tem contribuído para a realização de obras relevantes para o Distrito Federal, tais como, a Construção da Rota de Segurança no Setor de Inflamáveis, a Revitalização da W3 Sul e a Implantação de Infraestrutura nos Setores Habitacionais Bernardo Sayão e Vicente Pires. Constatam-se em

2021, desembolsos de recursos de convênios com a Terracap, na ordem de R\$ 32 milhões, aplicados nos objetivos pactuados nesses termos.

Sobre o tratamento de procedimentos apuratórios, deu-se continuidade, por meio da Assessoria de Correição, aos procedimentos administrativos já iniciados, sendo também instauradas novas ações de apuração. Ressalta-se a conclusão ao longo deste exercício de: 5 Sindicâncias; 2 Procedimentos de Investigação Preliminar - PIP e 2 Tomadas de Contas Especiais - TCE.

No que se refere às iniciativas do Controle Interno, cumpriu-se a exigência da CGDF, com relação à obrigatoriedade de análise prévia de todos os processos de aditivos contratuais e de pagamentos, vinculados às obras dos Setores Habitacionais Sol Nascente e Vicente Pires, não obstante, esta Secretaria ter adotado este procedimento de verificação, por parte do Controle interno, para todos os processos de pagamentos, com a edição da Portaria Nº 141/2020-SODF, DODF de 29 de dezembro de 2020. A realização destes trabalhos tem demonstrado uma melhora na qualidade da instrução desses processos e da conformidade com as normas vigentes.

Com o objetivo de padronizar a análise dos pleitos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborou-se, a partir da criação de Grupo de Trabalho, o Manual de Metodologia de Revisão de Preços, aprovado por meio da Portaria nº 149 de 08 de outubro de 2021.

Para que este órgão obtenha maior agilidade nas ações programadas, que requerem a contratação de obras e serviços de engenharia, instituiu-se, em 2021, por meio da Ordem de Serviço nº 01, DODF de 27/10/2021, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, que conta com o suporte da Comissão Interna de Apoio Técnico - CIAT (Portaria nº 193, DODF de 23/11/21), para atender as demandas da Comissão, referentes aos certames de obras e serviços realizados por esta SODF.

Outra ação identificada como fundamental para a melhoria na qualidade da instrução processual, refere-se à implementação de mudanças nos trâmites da documentação relativa às medições de obras e serviços de engenharia, empreendidas no âmbito de coordenação específica de análise e conferência de medições, que atua antes dos processos serem submetidos aos Executores de Contratos, o que tem permitido constatar e corrigir impropriedades verificadas na documentação apresentada pelas empresas contratadas, subsidiando, assim, os executores em sua tomada de decisão quanto à liberação do montante a ser atestado, evitando pagamentos indevidos.

Destaca-se em 2021, a atuação diligente da Pasta nas respostas às representações e questionamentos, apresentados pela Corregedoria Geral do Distrito Federal, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Ministério Público do Distrito Federal e nas ações provenientes do Judiciário, atentando-se sempre pelo interesse público na execução e programação das obras a cargo desta Secretaria.

Buscou-se em 2021, o avanço na implementação da Gestão de Riscos, todavia, a partir da reestruturação e redefinição de escopo, sendo criada uma nova matriz de riscos, com a elaboração do Plano de Ação de Prevenção e Monitoramento. Para 2022, tem-se como perspectiva pela área de Gestão Estratégica, em conjunto com as Subsecretarias e Chefias da SODF, o estabelecimento de indicadores para a realização do monitoramento de riscos.

No ranking de Transparência Ativa, esta Secretaria de Obras manteve a premiação recebida no ano anterior por apresentar 100% de pontuação no Índice de Transparência Ativa (ITA).

Assim, em 2021, a Secretaria de Obras procedeu à instrução técnica necessária para a realização de 36 licitações de projetos, de obras e também de serviços de engenharia que visam dar suporte à supervisão de grandes obras. Há expectativa de que, com as intervenções sob a gestão desta Pasta, sejam criados mais de 40 mil empregos, beneficiando toda a população do Distrito Federal.

Quanto aos empreendimentos entregues à população em 2021, destaca-se a conclusão de 7 intervenções, com investimentos de R\$ 29 milhões, 540 mil pessoas beneficiadas e 748 empregos gerados, a saber:

1. W3 Sul (Quadras 502 a 508 e 513 e 514) – Incluída no Plano de Governo desta Gestão, a primeira etapa de Revitalização da W3 Sul está perto de ser concluída. Fruto de parceria entre o GDF e a Câmara de Dirigentes Lojistas do DF, as obras começaram em 2019 pelas Quadras 511 e 512. Em 2020, as Quadras 509 e 510 foram totalmente recuperadas. Já em 2021, as Quadras 502 a 508 e 513 e 514, receberam as melhorias. No total, foram investidos em 2021 cerca de R\$ 15 milhões para a reorganização dos estacionamentos, arborização e paisagismo, revitalização dos becos entre os blocos, recuperação e troca de piso das calçadas existentes, entre outros serviços. A complementação da revitalização da W3 Sul dar-se-á com a finalização das obras, em execução, nas Quadras 515 e 516 e com as contratações programadas para 2022, das obras de requalificação de calçadas – Quadras 703 a 715 e de execução de pavimento rígido ao longo da W3 Sul.
2. Obra de Arte Especial nº 2 (Vicente Pires) – Outra importante obra desta gestão, foi a entrega à população da ponte sobre o córrego Samambaia, que liga a Rua 4 direto à Av. da Misericórdia. Foram investidos R\$ 2 milhões na construção desta intervenção que conta com 82 metros de extensão e 13,8 metros de largura.
3. Via de Ligação do Setor de Inflamáveis – Essa importante rota de saída do Setor de Inflamáveis foi entregue à população do DF em novembro/2021. No local, foram investidos R\$ 12 milhões para a construção de duas novas pistas paralelas à via férrea até o Conjunto Lúcio Costa, onde se incorporam à via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Cada uma das duas novas vias tem duas faixas de rolamento (mão dupla), com 7 metros de largura, calçadas e ciclovia, numa extensão total de 3,7 km.
4. Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS) – O Setor, localizado na área central de Brasília está revitalizado. No local foram investidos R\$ 4,5 milhões para a readequação do sistema viário, melhorias do sistema de drenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização vertical e horizontal, além de calçadas, com ênfase na acessibilidade para privilegiar pedestres e pessoas com deficiência.
5. Drenagem da DF-290 (Santa Maria) - As obras de drenagem no Km 4 da DF-290, em Santa Maria, estão concluídas. No local foi ampliada a bacia de detenção existente, gabiões, o canal de entrada do túnel e o próprio túnel, no método N.A.T.M. O investimento foi de R\$ 5,5 milhões.
6. Setor Comercial Sul (Praça do Povo) – A Praça está revitalizada e no local foram investidos R\$ 1,6 milhões na criação de novas possibilidades de utilização dos espaços públicos, transformando becos em praças, permitindo a multifuncionalidade do local, para prática do skate e apresentação de espetáculos e também, para ordenamento de áreas para quiosques.
7. Campo de Grama Sintética (Vila Planalto) – O tão aguardado campo de grama sintética, situado na Praça Rabelo, com dimensão de 89m de comprimento por 54,5m de largura, incluindo 3m de afastamento, em relação ao perímetro do campo, destinado a cobrança de laterais e escanteios, foi entregue à população, com investimento de R\$ 900 mil.

Foram retomadas as obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente, iniciadas pelo Trecho 2, com investimento de R\$ 16,2 milhões, para a execução de serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, meios fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além da readequação das bacias de detenção. E, a contratação das empresas responsáveis pela elaboração dos projetos executivos, para dar continuidade às obras nos Trechos 1 e 3, visando também a retomada e conclusão dessas obras, cujos certames já se encontram na praça. São estimados investimentos de R\$ 202 milhões, para a contratação das obras remanescentes em licitação.

Destaca-se, também, no Setor Habitacional Vicente Pires, a contratação de obras remanescentes dos serviços que não puderam ser executados nos contratos firmados em 2015/2016. Desse modo, foram contratados em junho de 2021, as obras remanescentes dos antigos Lotes 2, 5, 8 e 9. Com a nova contratação, parte da Rua 5, por exemplo, já está pavimentada. Na Rua 10, encontra-se em execução a construção da rede de drenagem. A previsão é de que as obras remanescentes, contratadas, estejam concluídas em 2022. Para a contratação de demais obras pendentes no Vicente Pires, o setor de projetos desta Pasta

trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e OAEs em áreas remanescentes de obras naquele Setor.

No âmbito do Programa Corredor de Transporte Eixo Oeste, seguem relacionadas as importantes intervenções contratadas, que integram esse Programa:

- Túnel de Taguatinga - O túnel terá 1.010m de extensão e vai contar com duas pistas paralelas, cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido. O investimento é de, aproximadamente, R\$ 275 milhões. Os recursos são oriundos de contrato de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa. A previsão é de que a obra seja concluída em 2022.
- Viaduto da EPIG – O viaduto está em construção na intersecção da EPIG com o Sudoeste e o Parque da Cidade, local por onde passam, em média, 25 mil veículos por dia. Com a mudança, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais que passar por semáforos e retornos. Seguirá direto para a Av. das Jaqueiras, passando sob a EPIG. A obra também permitirá sair do Sudoeste, na altura da Avenida e acessar a EPIG, sentido Plano Piloto e vice-versa, sem a necessidade de retorno. O investimento previsto é de R\$ 29,6 milhões.
- Revitalização da Av. Hélio Prates (Etapa 1) – A primeira etapa das obras de revitalização da Av. Hélio Prates estão em andamento. No local serão investidos cerca de R\$ 16 milhões em obras de pavimentação, drenagem, calçadas, estacionamentos, arborização, além da inclusão de faixa de rolamento e de via marginal em um trecho de 1,7km de extensão, entre o entroncamento da Avenida com a via N3, próximo ao Sol Nascente, até o cruzamento com a Via M1, próximo ao Hospital Regional de Ceilândia. A revitalização da Avenida Hélio Prates está prevista para ser realizada em 03 etapas, a segunda etapa já se encontra em licitação e a terceira etapa em fase de desenvolvimento de projetos.
- Viadutos da ESPM - As obras de construção do viaduto na Estrada Setor Policial Militar (ESPM), no trecho localizado na altura do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar até o Terminal da Asa Sul (TAS), estão em andamento. Foram executadas a escavação do terreno onde serão construídos os pilares dos viadutos e as pistas exclusivas para o transporte público. O investimento será de R\$ 10,4 milhões.
- Requalificação da ESPM – Iniciadas em outubro deste ano, a segunda etapa das obras de requalificação da ESPM vão trazer cara nova à região. Isso porque serão investidos R\$ 48 milhões na execução de serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de detenção.
- Ampliação da bacia de contenção da Asa Sul - O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê uma série de benefícios para a infraestrutura de Brasília. Um deles é a ampliação da bacia de contenção localizada na 912/913, região do Parque da Cidade, que recebe águas das chuvas da Faixa 13 da Asa Sul, além do Sudoeste e Setor de Indústrias Gráficas. Estão sendo investidos R\$ 2,9 milhões na escavação de 113.000m³, na execução de 570m² de gabiões, no plantio de 5.073m² de grama e de 289 unidades de cercas vivas. O reservatório da bacia teve sua capacidade dobrada passando a suportar 200.000m³ de água.

Ainda, sobre o Corredor de Transporte Eixo Oeste, encontra-se em fase de finalização o certame relativo à atualização dos projetos de drenagem urbana dos Lotes 2 e 3 da Região Administrativa de Taguatinga – Programa Drenar-Taguatinga, tendo em vista que as licitações realizadas, em gestões anteriores foram revogadas, em 2020 e 2021, devido a questões jurídicas e técnicas. Além da reavaliação da rede existente e da readequação dos projetos de drenagem, a contratação a ser efetivada em 2022 objetiva apontar soluções para a recomposição do pavimento asfáltico. O custo estimado é de R\$ 1,2 milhão.

Seguem, também, em execução outras importantes obras, quais sejam: a Revitalização da W3 Sul (Quadras 515 e 516), consistindo das últimas quadras a receberem as melhorias programadas, e a Reforma de 27 quadras poliesportivas, do vestuário da Piscina de Ondas, no Parque da Cidade de Brasília, Sarah Kubitschek, previstas para serem concluídas no início de 2022.

Ressalta-se, ainda, a contratação, prevista para o início de 2022 da Revitalização da Av. Paranoá, uma das principais vias para a mobilidade urbana da Região Administrativa do Paranoá, que será totalmente revitalizada e requalificada pelo Governo do Distrito Federal. A licitação foi concluída. No local, serão investidos R\$ 16 milhões e gerados cerca de 150 empregos diretos e indiretos.

Em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB) e com a Secretaria de Segurança Pública/DF, realizou-se, neste ano, demandas previstas no denominado "Programa Luz que Protege", sendo investidos R\$ 13 milhões na melhoria da Iluminação Pública do Distrito Federal, por intermédio das contratações em vigor, celebradas por esta Secretaria. Desse montante, R\$ 4,4 milhões foram aplicados na ampliação do atual Parque de Iluminação do DF; e, R\$ 8,6 milhões no programa de efficientização energética e na revitalização e melhoria dos espaços públicos. Ao todo, foram trocadas 11.284 luminárias convencionais por luminárias de LED, mais modernas, eficientes e econômicas, aumentando, assim, a segurança da população. Esses investimentos resultaram na economia de 35% no gasto com iluminação pública.

Por fim, esta gestão avalia que em 2021, esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF, empreendeu relevantes iniciativas, tendo logrado êxito, principalmente, no planejamento das obras que visam melhorar a mobilidade urbana no Distrito Federal, avançando nas ações para a efetiva Implantação do Corredor de Transporte Coletivo - Eixo Oeste, bem como no planejamento das ações para a conclusão das obras remanescentes de infraestrutura e urbanização dos Setores Habitacionais Vicente Pires e Sol Nascente.
