

**1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS****Legislação Atualizada e Síntese das Competências**

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF, Órgão integrante da Estrutura da Administração Pública do Governo do Distrito Federal (Decreto nº 39.610, de 01/01/2019), que tem a missão de proporcionar infraestrutura urbana, contribuindo para o desenvolvimento econômico, socioambiental e para melhoria da qualidade de vida da população, sendo de sua competência:

- I - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas;
- II - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana;
- III - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e
- IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal.

Desde sua edição, o Decreto nº 41.383, de 26/10/2020, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da SODF, sofreu alterações, sendo as de 2024 advindas dos Decretos Distritais nº 45.714/2024; 45.748/2024; 45.784/2024; 45.888/2024; 45.956/2024; 46.350/2024; 46.432/2024; 46.451/2024; 46.579/2024 e 46.685/2024.

Cumpra destacar a alteração de toda a estrutura administrativa desta Secretaria promovida, a partir da edição do Decreto nº 46.097 de 05/08/2024, DODF nº 149, de 06 de agosto de 2024.

Adiante, a situação atual quanto aos órgãos vinculados a esta Secretaria:

- I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap);
- II - Companhia Energética de Brasília (CEB);
- III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (Caesb) e,
- IV - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) - A inclusão do DER, como autarquia vinculada a esta Secretaria ocorreu por meio do Decreto nº 46.173, de 22/08/2024, DODF nº 162.

**FORÇA DE TRABALHO**

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	9	8	16	4	37
Comissionados sem vínculo efetivo	69	47	0	0	116
Requisitados de órgãos do GDF	13	10	2	1	26
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	1	1
Estagiários	0	0	2	0	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	91	65	20	6	182
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	6	3	9
Total Geral	91	65	14	3	173

O Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, em 2024, foi incrementado por servidores da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, sendo reforçado o quadro de efetivos desta Secretaria com 7 servidores: 2 Gestores e 5 Analistas.

Importante registrar que esta Secretaria encerrou o exercício de 2024, com a tão esperada nomeação de 10 servidores aprovados no concurso público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo, DODF nº 101-B de 26/12/2024, pg 12. Esses servidores, engenheiros e arquitetos, irão fortalecer o corpo técnico de efetivos desta SODF. Apesar da nomeação em tela, o déficit de servidores do quadro permanente continua defasado, principalmente da atividade fim, o que justifica a necessidade de ingresso de maior quantitativo de servidores da citada carreira.

**2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA****0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS****Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO</b>	<b>687500,0</b>	<b>540817,00</b>	<b>447069,30</b>	<b>447069,30</b>
0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL	687500,0	540817,00	447069,30	447069,30
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>254000,0</b>	<b>1587989,00</b>	<b>1545797,79</b>	<b>1366097,79</b>

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	254000,0	1587989,00	1545797,79	1366097,79
<b>9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>840000,0</b>	<b>933750,00</b>	<b>923650,0</b>	<b>914250,0</b>
0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	840000,0	933750,00	923650,0	914250,0
<b>9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO</b>	<b>800000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO--DISTRITO FEDERAL	800000,0	0,00	0	0
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>2581500,00</b>	<b>3062556,00</b>	<b>2916517,09</b>	<b>2727417,09</b>

- Programação Orçamentária Realizada

Neste Programa Temático foram realizadas despesas referentes às liquidações de Licenças Prêmio, indenizações a servidores e pagamentos de indenizações de transporte relativas às atividades externas realizadas por servidores, a saber:

**Ação/Subtítulo 9041.0021** - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Inativo: Indenizou-se 6 servidores até maio/2024 e 5 servidores aposentados receberam as parcelas conforme disposto no § 1º do Artigo 17 do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019 licença prêmio em pecúnia.

**Ação/Subtítulo 9050.0073** - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal: Procedeu-se à indenização de 165 servidores com o pagamento das diferenças de: 1/3 Férias (rescisão); férias proporcionais e de férias vencidas, referentes ao acerto de contas de competência do exercício. Ademais houve o ressarcimento de salários a 2 servidores cedidos para esta SODF, sendo: 1 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e 1 da Companhia Energética de Brasília - CEB.

**Ação/Subtítulo 9093.0032** - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: Executou-se pagamentos de Indenizações de Transporte para 36 servidores, sendo:

Carreiras	Quantidade
Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Decreto nº 24.217 de 13 de novembro de 2003)	04
Indenização de Transporte CLT - Comissionados (Decreto 13.447 de 17 de setembro de 1991)	31
Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DER	1
Total	36

- Programação Orçamentária Não Executada

**Ação/Subtítulo 9127.0043** - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia – Servidor Ativo:

Em 2024, não houve despesas com o pagamento de conversão em pecúnia de licença prêmio, devido a Indisponibilidade de recursos para pagamentos relativos à conversão da licença-prêmio conforme orientações da Secretaria de Estado de Economia/SEEC-DF, contidas no Ofício Circular nº 25/2024 - SEPLAD/GAB, de 20/01/2024.

## 6206 - ESPORTE E LAZER

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>40000,0</b>	<b>33000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	40000,0	33000,0	0	0
<b>3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>40000,0</b>	<b>240000,0</b>	<b>200000,0</b>	<b>0</b>
9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	40000,0	240000,0	200000,0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>1937000,0</b>	<b>2950989,00</b>	<b>2915743,42</b>	<b>1656627,69</b>
0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	1937000,0	1950989,00	1915743,42	1656627,69
0013 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	0	1000000,0	1000000,0	0
<b>3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>50000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>2067000,00</b>	<b>3223989,00</b>	<b>3115743,42</b>	<b>1656627,69</b>

#### Posição SAG 6º Bimestre/2024

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6206	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado
Campo de futebol society de grama sintética, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo (Contrato nº 28/2023)	Pôr do Sol	0037	Concluída	100%

No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas e de lazer.

- Programação Orçamentária Realizada**

#### Ação/Subtítulo 1079.0009 - Construção de Espaços Esportivos:

- Implantação de campo de futebol society de grama sintética, compreendendo a execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, no Pôr do Sol - **Contrato nº 28/2023**: Intervenção concluída com 100% dos serviços executados.

A demanda para a implantação de campo de futebol society na Região Administrativa do Pôr do Sol surgiu a partir de solicitação da população local, considerando a falta de mobiliário urbano destinado ao esporte e lazer na região. O projeto contemplou a implantação de calçadas, bancos, lixeiras e paraciclo, que organiza o uso do espaço público, garantindo acessibilidade e conforto aos usuários.



Contrato nº 28/2023 - Implantação de campo de futebol

#### Ação/Subtítulo 3902.9472 - Reforma de Praças Públicas e Parques:

- Recursos destinados a custear parte das despesas das obras objeto do Contrato nº 31/2023 - Lote 1 (Requalificação da Praça do Relógio), em execução a partir de recursos descentralizados pelo Fundurb, conforme Resolução nº 3/2023 - CAF/FUNDURB, DODF nº 158, de 21/08/2023 (Etapa 0013 - Fundurb).

O objetivo do empreendimento é revitalizar a Praça do Relógio, transformando-a em um espaço público modernizado, funcional e acessível, que atenda às necessidades da população de Taguatinga e áreas adjacentes. Obras em andamento normal e com 68,28% dos serviços executados até o 6º bimestre.



Contrato nº 31/2023 - Requalificação da Praça do Relógio

**Ação/Subtítulo 1079.0013** - Construção de Espaços Esportivos no Distrito Federal - Créditos orçamentários oriundos da Portaria Conjunta nº 08, de 27/11/2024 (DODF nº 228, de 29/11/2024), (157299817), relativa à descentralização orçamentária à Novacap, efetivada no montante de R\$ 1.000.000,00, destinada a custear as demandas a partir de recursos provenientes de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Distrital Chico Vigilante referentes a campos de grama sintética em localidades da Ceilândia.

• **Programação Orçamentária Não Executada**

**Ação/Subtítulo - 1950.1040** - Construção de Praças Públicas e Parques e **Ação/Subtítulo - 3048.0012** - Reforma de Espaços Esportivos: Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio destas Ações.

**6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**

**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>3800000,0</b>	<b>2699790,00</b>	<b>644704,00</b>	<b>63171,42</b>
0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL	3800000,0	699790,00	644704,00	63171,42
0019 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DE DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO SETOR DE MANSÕES - SOBRADINHO II	0	2000000,0	0	0
<b>TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>3800000,00</b>	<b>2699790,00</b>	<b>644704,00</b>	<b>63171,42</b>

**Posição SAG 6º Bimestre/ 2024**

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado
Execução de serviços geotécnicos/geológicos - Lote 1 e de controle tecnológico/laboratorial - Lote 2, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras (Contrato nº 16/2023).	DF	0005	Paralisada	43,02%

• **Programação Orçamentária Realizada**

**Ação/Subtítulo - 1968.0018** - Elaboração de Projetos: Nesta Ação foram custeadas a prestação de serviços técnicos de topografia, geotécnicos, geológicos, dentre outros:


- Execução dos serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (Lote 2), destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras - Contrato nº 16/2023: Esta contratação encerra o exercício com status paralisada e com 43,02% dos serviços realizados até o 6º bimestre. Principais serviços realizados no âmbito da contratação:

- Lote 1: Realizado os serviços de sondagens e poços exploratórios e; Lote 2: Realizado os serviços de ensaios de Laboratório e Controle Tecnológico, Viga "Benkelman".

Os estudos e/ou ensaios geológico-geotécnicos, abrangidos por esta contratação, visam à caracterização dos solos do ponto de vista das condições de fundação (OAE), das obras e do dimensionamento dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, identificação do nível d'água, identificação de material terroso e granular servível, bem como identificação e delimitação de material inservível (para fundação e estruturas de pavimento), estudos de subleito, de revestimento primário, jazidas, areais, resíduos da construção civil e outros.

Já os estudos e/ou ensaios afetos ao controle tecnológico do concreto, constantes da contratação em tela, visam garantir o desempenho das estruturas, bem como a qualidade dos insumos utilizados, de forma a evitar patologias que possam comprometer sua vida útil, assim como o controle tecnológico e ensaios em materiais betuminosos a serem empregados nas obras de infraestrutura, de modo a promover caracterização de sua composição, além de garantir emprego que satisfaça às especificações previstas nas Normas Técnicas.

Entretanto, devido a questões técnico-administrativas relacionadas a erro material identificado na unidade de medida contida no Orçamento Sem Desoneração do Edital de Licitação, referente ao item vinculado ao ensaio de viga "Benkelman", a contratação finaliza 2024 com status de paralisada, sem previsão de continuidade.

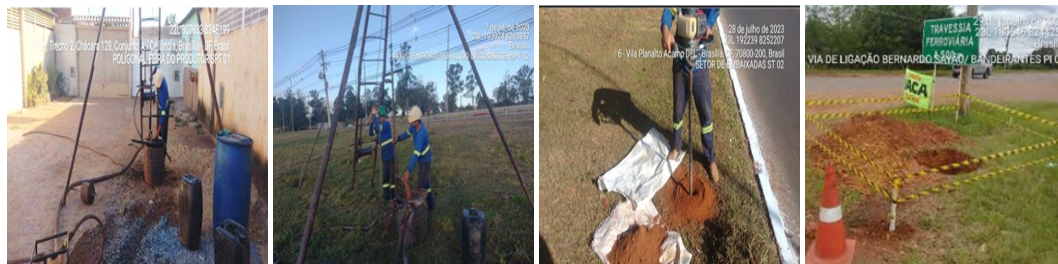

- Elaboração/readequação de projeto executivo de infraestrutura urbana no Pôr do Sol – Contrato nº 17/2024: Após longo período de certame a contratação foi efetivada em 23/12/2024, estando a ordem de serviço prevista a ser emitida no início de 2025. Os trabalhos a serem executados compreendem: a implantação e readequação de meios-fios, calçadas, vias e ciclovias, desenvolvimento de geometria/terraplenagem, pavimentação, drenagem pluvial (contemplando redes, todos os dispositivos necessários para o funcionamento do sistema, como por exemplo, bocas de lobo, poços de visita, estruturas de lançamentos/dissipadores e Lagoas/Bacias de Detenção e demais que forem desenvolvidos pela Contratada, readequação/atualização de projetos existentes, quando houver, nas áreas de contribuição do Ribeirão Taguatinga), sinalização viária, projeto de desvio de trânsito, plano de execução/ataque de obra, construção da matriz de riscos, paisagismo, supressão vegetal, recuperação florestal, na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol – RA SOL, especificamente em poligonal do Pôr do Sol, ilustrada no mapa a seguir:



Contrato nº 17/2024 - Mapa geral da poligonal dos projetos a serem elaborados destinados a futura urbanização a ser implantada no Pôr do Sol:

## 6209 - INFRAESTRUTURA

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>	<b>47335623,0</b>	<b>95762418,00</b>	<b>59864815,68</b>	<b>47471022,09</b>
0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	30613623,0	82754808,00	59826815,68	47471022,09
0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	3572000,0	38000,0	38000,0	0
1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	13150000,0	12969610,00	0	0
<b>1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>18045000,0</b>	<b>2423612,00</b>	<b>2418611,33</b>	<b>69322,05</b>
0014 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2024 - DISTRITO FEDERAL	0	195000,0	195000,0	0
0012 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0	1110000,0	1110000,0	0
0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	14045000,0	368612,00	363611,33	69322,05
0125 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO DF-DISTRITO FEDERAL	0	600000,0	600000,0	0
7124 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO DF - 2024	4000000,0	0,0	0	0
0124 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA DA QUADRA 103, RESIDENCIAL OESTE, SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL	0	150000,0	150000,0	0
<b>1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF</b>	<b>30100000,0</b>	<b>31125515,00</b>	<b>717640,04</b>	<b>602553,06</b>
0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL	30100000,0	31125515,00	717640,04	602553,06
<b>3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b>	<b>89002455,0</b>	<b>91364131,00</b>	<b>48640397,13</b>	<b>42697585,14</b>
0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	18984115,0	23038652,00	6123509,66	5196983,40

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	70018340,0	68325479,00	42516887,47	37500601,74
<b>3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA</b>	<b>67202323,0</b>	<b>110391903,00</b>	<b>91256991,16</b>	<b>90221229,97</b>
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA	11139347,0	11139347,00	227366,92	57367,02
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	52462976,0	95702556,00	91029624,24	90163862,95
0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - ARAPOANGA	3600000,0	3550000,00	0	0
<b>3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS</b>	<b>21037070,0</b>	<b>21037070,0</b>	<b>10662987,24</b>	<b>10662987,24</b>
0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO	21037070,0	21037070,0	10662987,24	10662987,24
<b>3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS</b>	<b>6386044,0</b>	<b>4894841,00</b>	<b>4894838,94</b>	<b>3718951,35</b>
0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	6386044,0	4894841,00	4894838,94	3718951,35
<b>5034 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA INFRA/DF</b>	<b>14756080,0</b>	<b>14507084,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA - DISTRITO FEDERAL	14756080,0	14507084,00	0	0
<b>3205 - REMANEJAMENTO DE REDE</b>	<b>45000,0</b>	<b>2202778,00</b>	<b>2202777,33</b>	<b>0</b>
0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL	45000,0	202778,00	202777,33	0
0003 - REMANEJAMENTO DE REDE- READEQUAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA-DISTRITO FEDERAL	0	2000000,0	2000000,0	0
<b>8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>277870855,0</b>	<b>218028716,00</b>	<b>215823234,88</b>	<b>200688381,24</b>
6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	273570855,0	218028716,00	215823234,88	200688381,24
6586 - APOIO A MANUTENCAO E EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	4000000,0	0,0	0	0
6587 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	300000,0	0,0	0	0
<b>9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>10000,0</b>	<b>46004989,0</b>	<b>45994989,00</b>	<b>40078754,70</b>
0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL	10000,0	46004989,0	45994989,00	40078754,70
<b>3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO</b>	<b>282000,0</b>	<b>682000,00</b>	<b>546266,23</b>	<b>496251,75</b>
0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	282000,0	682000,00	546266,23	496251,75

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>572072450,00</b>	<b>638425057,00</b>	<b>483023548,96</b>	<b>436707038,59</b>

**Posição SAG 6º Bimestre / 2024**

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 04 (Contrato nº 28/2022).	P. Piloto	0004	Concluída	100%
Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (Contrato nº 24/2022).	Guará	0007	Normal	45,40%
Duplicação da Via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante (Contrato nº 23/2023).	DF	0008	Normal	59,80%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 1 (Contrato nº 3/2022).	Taguatinga	0043	Normal	92%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 2 (Contrato nº 4/2022).	Taguatinga	0044	Normal	93%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4 (Contrato nº 1/2023).	B. Sayão	0009	Atrasada	17,30%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1 (Contrato nº 5/2023).	B. Sayão	0010	Paralisada	8,28%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 (Contrato nº 21/2016).	V. Pires	0011	Concluída	100%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (Contrato nº 19/2021).	V. Pires	0012	Normal	97,50%
Implantação de Obra de Arte Especial - OAE 3 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires (Contrato nº 14/2023).	V. Pires	0013	Paralisada	6,98%
Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF (Contrato nº 29/2023).	V. Pires	0014	Normal	16,75%
Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (Contrato nº 21/2021).	Planaltina	0015	Normal	97%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3 (Contrato nº 17/2022).	Sol Nascente	0017	Normal	46%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 1 (Contrato nº 22/2022).	Sol Nascente	0018	Normal	72%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 (Contrato nº 23/2022).	Sol Nascente	0019	Normal	73%
Restauração de pavimento da Avenida W 3 Sul (Contrato nº 16/2022).	P. Piloto	0020	Paralisada	45%
Supervisão e apoio no desenvolvimento de projetos e na execução da obra da readequação da EPIG (Contrato nº 19/2022).	Região Central	0021	Normal	76%
Realização de estudos topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras - Lote 2 (Contrato nº 3/2023).	DF	0022	Concluída	95,42%
Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a fiscalização/acompanhamento de obras (Suaf) - Contrato nº 8/2023.	DF	0023	Paralisada	7%
Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante (Contrato nº 17/2023).	DF	0026	Normal	91%
Realização de gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento do DF (pagamento de taxas/tarifas).	DF	0038	Concluída	-
Monitoramento de níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste (Contrato nº 11/2023).	DF	0039	Concluída	100%
Implantação de rede elétrica de média e baixa tensão e mitigação de riscos na rua 1 e na rua principal do assentamento 26 de setembro (Contrato nº 13/2024)	V. Pires	0069	Normal	27,5%
Restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3A e 12 da DF-009 - Lago Norte (Contrato nº 9/2024).	Lago Norte	0071	Normal	1%

As alocações orçamentárias do Programa Temático 6209 representam a maior parte dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas desta Secretaria, pertinentes às ações previstas a serem executadas a partir de recursos próprios (Fonte 160 e 161); dos recursos provenientes de Operações de Crédito (Fontes 135, 136, 321, 335 e 390); de Contratos de Repasse celebrados com a União (Fonte 732), e de Convênios firmados com a Terracap (Fonte 131). Desse modo, os resultados das Ações/Subtítulos que integram este programa constam evidenciados a seguir:

- Programação Orçamentária Realizada

**Ação/Subtítulo 1110.0147** – Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal:

- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 05 - **Contrato nº 20/2022**: Requalificação concluída com 100% dos serviços realizados até o 2º bimestre.

O projeto de requalificação da Quadra compreendeu a recuperação do pavimento existente, sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e implantação de mobiliário. Esta intervenção se insere no contexto da estratégia de revitalização de Conjuntos Urbanos, contida no novo PDOT.



Contrato nº 20/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 5

- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 04 - **Contrato nº 28/2022**: Requalificação concluída com 100% dos serviços realizados até o 2º bimestre. Os serviços executados em 2024 na Quadra compreendem a implantação de mobiliário com a instalação de bancos de concreto com régua de madeira plástica, conjuntos de mesa com 2 bancos, remoção de tapume e limpeza superficial com jato de alta pressão.



Contrato nº 28/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 4

- Requalificação Urbana, incluindo a execução de drenagem pluvial, lagoa de retenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas, estacionamentos e duas praças internas (entre as quadras 5/6 e 10/11), no Setor de Oficinas Sul - SOF Sul - **Contrato nº 24/2022**: Obra em andamento normal com 45,40% dos serviços executados até o 6º bimestre. Os serviços principais realizados em 2024 compreendem a execução de Bacia, implantação de drenagem pluvial e pavimentação.

Ao longo do exercício foram identificadas intercorrências que impediram maior avanço, quais sejam:

- Após o levantamento topográfico, verificou-se a necessidade da realização de escavações mais profundas para a devida implantação do sistema de drenagem previsto em projeto.
- Quando da execução da rede 1500mm e da rede 2000mm foi encontrado um emissário de rede esgoto da Caesb. Diante do achado, e para viabilizar a execução da rede de entrada das lagoas, foi necessária a readequação da galeria sob a rede de esgoto da Caesb.
- Com o impedimento de se executar as redes de drenagem antes da efetiva adequação da planilha orçamentária, iniciou-se a escavação das bacias. Após início da execução das lagoas 2 e 3, verificou-se excessivo afloramento de água, impossibilitando a execução das bacias em tempo hábil.
- No lançamento final, que envolveria a passagem da rede sob o metrô, foi necessário modificar o projeto para, assim, possibilitar o lançamento e ajustar a rota para se adequar a uma passagem de bueiro já existente.



Contrato nº 24/2022 - Setor de Oficinas Sul

- Execução das obras de duplicação entre a Avenida Contorno do Guará II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante - **Contrato nº 23/2023**: Intervenção em andamento normal e com 59,80% dos serviços executados até o 6º bimestre. A realização das obras de duplicação da via que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Avenida Contorno, na altura da Quadra 38 do Guará, objetiva melhorar o fluxo da região, além de promover segurança viária aos usuários, assim como maior conforto e fluidez ao tráfego local.



Contrato nº 23/2023 - Duplicação da via Guará - Núcleo Bandeirante (Subtrecho entre a Av. Contorno do Guara II e a DF- 079)





Planta de localizao das Intervenes da Via de Ligaao Guar - Ncleo Bandeirante (Subtrecho entre a Av. Contorno do Guara II e a DF- 079)

Contrato n	% at o 6 Bim de 2023	% at o 6 Bim de 2024	Situao da Obras - 6 Bim de 2024	Principais intercorrncias que impediram maior avano da execuo ao longo do exerccio de 2024/Evoluo das Obras/Servios	Anlise da situao atual frente ao cronograma fsico-financeiro e perspectiva para 2025
23/2023	1,00	59,80	Andamento Normal	<p>Ao longo da execuo foram constatadas algumas intercorrncias que impactaram no andamento da obra, com destaque para: necessidade de elaborao de novo projeto da OAE (ponte); ausncia de projetos executivos aprovados, principalmente de drenagem pluvial, que dificultaram a abertura de frentes de servios, mas que foram resolvidos com o andamento da obra; interferncias com a rede eltrica de distribuo da Neoenergia; descoberta de solo mole instvel para pavimentos, o que impossibilitou a execuo de um pequeno trecho de subleito levando  substituo do material por racho.</p> <p>Com a rede eltrica interferindo em pequeno trecho onde ser a rea de acelerao prxima  ponte antiga, foi necessrio o remanejamento de postes.</p> <p>Com a chegada das chuvas, houve danos irreversveis na rea ao lado da futura ponte, sendo definido pela reprogramao da execuo das fundaes intermedirias referentes ao vo central da ponte para o perodo de chuvas escassas. Quanto  drenagem pluvial, executou-se o possvel, sendo planejado a execuo do ltimo trecho para o perodo final da obra.</p>	<p>Para o ano de 2025 a perspectiva  positiva, pois a etapa principal ser na rea da OAE (Ponte). O planejamento adotado mostrou-se eficiente.</p> <p>A maior parte do trecho correspondente  pavimentao foi executada no perodo de seca e a execuo da ponte ficou para a poca de chuvas.</p> <p>A obra deve ser finalizada no prazo pactuado.</p>

- Restauroo/recuperao de pavimento nos segmentos 3A e 12 da DF-009 - Lago Norte: **Contrato n 9/2024** - Interveno em andamento normal e com 1% dos servios executados at o 6 bimestre.

**Ao/Subttulo 1948.0001** - Implantao do Programa Drenar - DF - Reestruturao do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras Complementares:

As contrataes para a elaborao e readequao de projeto executivo de Infraestrutura Urbana - Drenar - DF, na Regio Administrativa de Taguatinga - TAG, no DF, apresentaram as seguintes evolues:

- Reviso dos projetos executivos de drenagem nas reas de contribuo das bacias denominadas I, II, III, IV, V, VI, VII e verificao de contribuo nas Bacias do Taguaparque - **Contrato n 3/2022 - Lote 01**: Produtos elaborados pela contratada em anlise no Detran. Contratao em andamento normal e com 92% dos servios executados at o 6 bimestre.

- Reviso dos projetos executivos de drenagem nas reas de contribuo das bacias denominadas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII verificao de contribuo nas Bacias do Taguaparque e elaborao de projeto urbanstico das vias transversais entre as Av. Comercial e SAMDU - **Contrato n 4/2022 - Lote 02**: Produtos elaborados pela contratada e em anlise no Detran e Seduh. Contratao em andamento normal e com 93% dos servios executados at o 6 bimestre.

Contrato n	% at o 6 Bim de 2023	% at o 6 Bim de 2024	Situao da execuo dos projetos - 6 Bim de 2024	Andamento/Principais intercorrncias que impediram maior avano da execuo ao longo do exerccio de 2024/Evoluo dos Servios	Anlise da situao atual frente ao cronograma fsico-financeiro e perspectiva para 2025
3/2022	85%	92%	Normal	Morosidade na entrega de produtos de revises por parte da empresa contratada.	
04/2022	85%	93%	Normal	<p>Morosidade na anlise dos rgos responsveis pela aprovao.</p> <p>O produto de drenagem se encontra em fase de reelaborao pela empresa contratada, tendo em vista as ltimas exigncias da Novacap que indicam a necessidade de modificao do projeto.</p> <p>O projeto de Sinalizao Viria se encontra em anlise pelo Detran, desde agosto de 2024.</p> <p>Aprovado o projeto de pavimentao.</p>	<p>A complexidade na execuo dos contratos de projetos se d em especial pela morosidade na anlise dos rgos, que por legislao devem se manifestar e aprovar os produtos desenvolvidos.</p> <p>H a expectativa de continuidade e concluso do processo ainda no primeiro semestre de 2025.</p>


**Ação/Subtítulo 3023.0073** - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Amiqueira/Bernardo Sayão - Distrito Federal:

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4, incluindo a execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical - **Contrato nº 1/2023**: Obra atrasada com apenas 17,30% dos serviços executados até o 6º bimestre.



Contrato nº 1/2023 - Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e bacia de detenção - **Contrato nº 5/2023**: Obra paralisada com 8,28% dos serviços executados até o 6º bimestre.

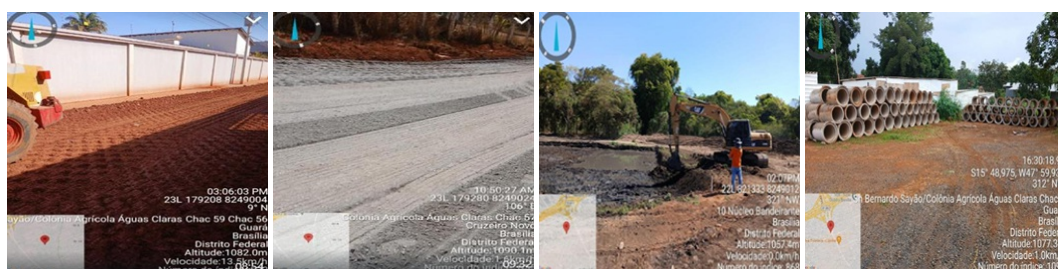

Contrato nº 5/2023 - Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 1

Contrato nº	% até o 6º Bim de 2023	% até o 6º Bim de 2024	Situação da Obras - 6º Bim de 2024	Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do exercício de 2024/Evolução das Obras/Serviços	Análise da situação atual frente ao cronograma físico-financeiro e perspectiva para 2025
1/2023	1,71	17,30	Atrasada	<p>Identificada a necessidade de execução de serviços que são de responsabilidade da Caesb, incorrendo em atrasos devido a grande dificuldade para acionamento da Concessionária.</p> <p>Em 4 de setembro de 2024, houve um acontecimento na área da Chácara 13, onde se executava a bacia de detenção que gerou o colapso de 1 casa e o comprometimento de estrutura de outras 3 casas. Por se tratar de um acidente totalmente extemporâneo, não se tem determinada a causa do colapso da casa, mas uma investigação técnica foi iniciada pela empresa contratada, com a participação de técnicos especializados para realização de todos os estudos necessários, de forma a serem identificadas as causas. O trecho da bacia foi interditado pela Defesa Civil e determinado o reaterro emergencial da área.</p> <p>O processo de investigação se encontra em fase final e já foram elaborados relatórios tanto de ações quanto de possíveis serviços de prevenção desse tipo de colapso. Com a interdição do trecho da bacia, foi dada ênfase no ataque dos serviços em volta do Parque Denner, onde havia frente de execução de terraplenagem, pavimentação em CBUQ, confecção de calçadas, assentamento de meios-fios.</p>	<p>Há necessidade urgente de ação da Caesb para execução de remanejamento de redes de água e esgoto.</p> <p>A Terracap foi acionada para que, em virtude de assinatura do Contrato 113/2024 - Terracap/Caesb, proceda gestões com a Caesb para a realização dos serviços necessários, o que irá possibilitar a continuidade da execução das obras.</p> <p>A solução para o trecho da bacia requer a desinterdição da área e a contenção e proteção das casas próximas a bacia, sendo necessário a apresentação desse projeto de solução pela Contratada.</p>
5/2023	4,78	8,28	Paralisada	<p>A execução da obra enfrentou desafios significativos, como a alteração no consórcio contratado. Além disso, as interferências causadas por residências construídas nas áreas de passagem da rede de água pluvial, bem como conflitos com redes de água, energia e telefonia existentes, ocasionaram atrasos no cronograma inicial, caracterizando uma obra de alta complexidade por se tratar de uma requalificação em área já consolidada.</p>	<p>Embora o cronograma esteja atrasado devido às complexas interferências encontradas durante a execução, como redes de utilidades existentes e construções irregulares nas áreas de intervenção, as ações necessárias para o progresso estão sendo realizadas com responsabilidade técnica e planejamento estratégico.</p> <p>A conclusão prevista para 2026 reflete a cautela necessária para assegurar a qualidade dos serviços, respeitando as condições do local e as soluções técnicas adotadas. Destaca-se que a equipe de gerenciamento e o consórcio executor estão comprometidos com o cumprimento das metas, priorizando a eficiência financeira e a entrega de uma infraestrutura de excelência para a população.</p>

**Ação/Subtítulo 3023.0077** - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional - Vicente Pires.

- Execução de obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 - Contrato nº 21/2016: Intervenção concluída com 100% dos serviços executados até o 4º bimestre.

Realizada a pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial no Trecho da Colônia Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8.



Contrato nº 21/2016 - Infraestrutura no Vicente Pires

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato nº 19/2021 - Intervenção em andamento normal e com 97,50% dos serviços executados até o 6º bimestre.



Contrato nº 19/2021 - Infraestrutura no Vicente Pires

- Implantação de Obra de Arte Especial, OAE 3, ponte sobre o córrego Vicente Pires/DF, com extensão aproximada de 180,00 m e 13,20 m de largura, bem como, para execução do acesso e encabeçamento da ponte junto às Ruas 01 (Jóquei) e Rua 03 B - Contrato nº 14/2023: Obra paralisada com 6,98% dos serviços referentes à instalação do canteiro e administração da obra executados até o 6º bimestre.

- Infraestrutura Urbana Remanescente, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de lançamento direto) - Contrato nº 29/2023: Intervenção em andamento normal e com 16,75% dos serviços executados até o 6º bimestre. A figura abaixo indica a poligonal onde se darão as intervenções:



Contrato nº 29/2023 - Planta de localização da poligonal referente ao Lote 2 - SHVP



Contrato nº 29/2023 - Infraestrutura no Vicente Pires

\* Apresenta-se, a seguir, o panorama atual dos contratos do Setor Habitacional Vicente Pires com vigência/andamento em 2024:

Contrato nº	% até o 6º Bim de 2023	% até o 6º Bim de 2024	Situação da Obras - 6º Bim de 2024	Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do exercício de 2024/Evolução das Obras/Serviços	Análise da situação atual frente ao cronograma físico-financeiro e perspectiva para 2025
21/2016	97,02	100,00	Concluída	Houve a necessidade de readequação do projeto executivo; tempo entre análise e aprovação dos aditivos financeiros e para o uso de fragmentadores para realização de "Tunnel Liner" presente na Rua 08; chuvas; remoção de hidrantes; remoção de poste; supressão vegetal; liberação para execução dos serviços dentro dos condomínios.  Grande dificuldade em se escavar o "Tunnel Linner" da Rua 08, onde se realizou a detonação com material pirotécnico devido a ocorrência de rocha (material de 3ª categoria) e escavação com rompedores pneumáticos em razão de detonação de material pirotécnico colocar em risco a estrutura da portaria e residências.	Obra Concluída
19/2021	93,32	97,50	Andamento Normal	Necessidade de execução dos rebaixamentos das redes de água potável pela Caesb.	Atrasada devido a inexecução dos rebaixamentos das redes de água potável pela Caesb.
14/2023	1,18	6,98	Paralisada	Após reexame do projeto de adequação do escoramento para a obra de arte constatou-se custo estimado acima de 25% para sua execução, incompatível com as condições de licitação.	Em trâmites procedimentos administrativos para a rescisão contratual.
29/2023	A ser iniciada	16,75	Andamento Normal	Por se tratar de área com ocupação desordenada, as ruas são muito estreitas, dificultando o acesso de máquinas e caminhões bem como a operação destes equipamentos, não sendo possível a execução de desvio para que o local de trabalho fique isolado.  O fluxo de pessoas e veículos é intenso, ocasionando atrasos na execução da obra. Necessidade de realizar aditivo de quantitativos devido à constatação de solo de 3ª categoria na Rua Misericórdia.	Andamento normal, com perspectiva de conclusão em 2026.

- Restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3A e 12 da DF-009 - Lago Norte - **Contrato nº 9/2024**: Intervenção em andamento normal e com 1% dos serviços executados até o 6º bimestre.

A restauração da DF-009 tem como objetivo recuperar o pavimento da rodovia prolongando a sua vida útil e reestabelecendo as condições de segurança, conforto e trafegabilidade. Devido a extensão da rodovia foi necessária a divisão em segmentos homogêneos, com base em critérios visuais e deflectométricos. Tais segmentos visam a melhor solução técnica/econômica para o trecho a ser implantado no valor do recurso disponibilizado para execução do objeto. Encerra o exercício com a execução de serviços topográficos e a instalação do canteiro de obras.



Contrato nº 9/2024 - Restauração/recuperação de pavimento

**Ação/Subtítulo 3058.0002** - Execução de Obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Mestre D'Armas

- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas - **Contrato nº 21/2021**: Revisão e readequação dos projetos executivos em andamento normal e com 97% dos serviços executados até o 6º bimestre.


A contratação visa complementar os projetos de infraestrutura para posterior realização das obras de conclusão do Setor, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que irão promover a regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Serviços técnicos em andamento, restando pendente para a conclusão a aprovação do projeto de drenagem, em análise na Novacap, de forma a permitir o lançamento do certame das obras.

Contrato nº	% até o 6º Bim de 2023	% até o 6º Bim de 2024	Situação da execução dos projetos - 6º Bim de 2024	Andamento/Principais intercorrências que impediram maior avanço na execução ao longo do exercício de 2024/Evolução dos Serviços	Análise da situação atual frente ao cronograma físico-financeiro e perspectiva para 2025
3/2022	85%	92%	Andamento Normal	Há morosidade na entrega de produtos de revisões pela empresa contratada e também por parte de órgãos responsáveis pela análise e aprovação.  Constata-se diversas dilatações de prazos de entregas e análises, ocasionando a necessidade de aditamentos de prorrogação de prazos contratuais (atualmente o Contrato tem seguimento de acordo com o 11º Termo).  O produto de drenagem se encontra em fase de reelaboração por parte da empresa contratada, a partir das últimas exigências da Novacap que indicam a necessidade de modificação do projeto.  O projeto de Sinalização Viária se encontra em análise pelo Detran desde agosto de 2024, sem uma resposta prévia ainda.  Foi aprovado o projeto de pavimentação.	Há expectativa de continuidade e conclusão no primeiro semestre de 2025.

**Ação/Subtítulo 3058.0003** - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - **Contrato nº 17/2022:** Intervenção em andamento normal e com 46% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Compreendem a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, instalação de meios fios, construção de calçadas, sinalização horizontal e vertical, bacias de retenção e a construção de uma ponte, já finalizada, responsável pela ligação interna entre os Trechos 1 e 2. Durante o ano de 2024 foram executados os serviços de escavação das lagoas; implantação de rede de drenagem; pavimentação; meios-fios; muro gabião e calçadas.

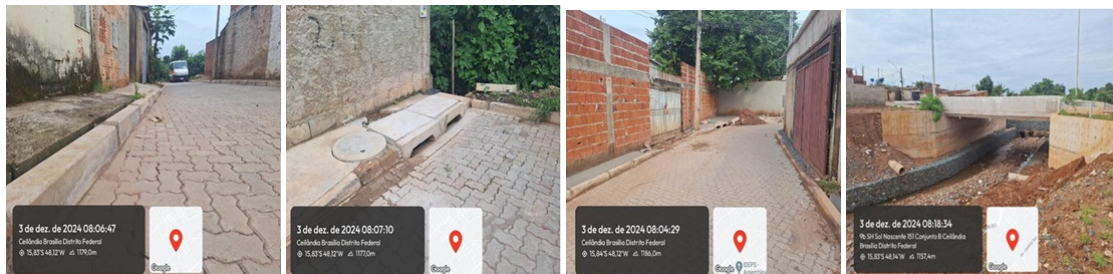

Contrato nº 17/2022 - Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, remanescentes, Trecho 3 - Lote 1 - **Contrato nº 22/2022:** Intervenção em andamento normal, e com 72% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Consiste da implantação de rede de drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de retenção. Durante o ano de 2024 foram executados os serviços de terraplanagem; execução da lagoa das bacias 1-D, 1-C, 1-B e 1-A; pavimentação; implantação de rede de drenagem.



Contrato nº 22/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente no trecho 3 - Lote 1

- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 - **Contrato nº 23/2022:** Intervenção em andamento normal e com 73% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Compreendem a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além de bacias de retenção. Durante o ano de 2024 foram executados os serviços de terraplanagem; dispositivos de concreto; pavimentação e implantação de redes de drenagem.



Contrato nº 23/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2

⇒ Apresenta-se, a seguir, o panorama dos contratos do Setor Habitacional Sol Nascente em 2024:

Contrato nº	% até o 6º Bim de 2023	% até o 6º Bim de 2024	Situação da Obras - 6º Bim de 2024	Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do exercício de 2024/Evolução das Obras/Serviços	Análise da situação atual frente ao cronograma físico-financeiro e perspectiva para 2025
17/2022 - Trecho 1 e Trecho 3	18	46	Andamento Normal	Interferências nas redes de água e esgoto; ocupação desordenada e período de chuvas além do esperado.	Finalização do escopo do Contrato prevista para o segundo semestre de 2025.
22/2022 - Trecho 3 - Lote 1	34	72			
23/2022 - Trecho 3 - Lote 2	24	73			

**Ação/Subtítulo 3089.0002** - Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos - Avenida W3 - Plano Piloto:

- Restauração de Pavimento Rígido na W 3 Sul - **Contrato nº 16/2022**: Intervenção paralisada por 120 dias, a partir de 5/11/2024, devido ao período chuvoso. Executados 45,00% dos serviços até o 6º bimestre.

Importante projeto que prevê o desenvolvimento e a execução de obras de readequação da faixa exclusiva de ônibus na avenida W3 Sul, que compreende aproximadamente 6 Km entre o viaduto do Eixo Monumental e o Setor Hospitalar Sul, ao longo das Quadras "700" e o trecho de aproximadamente 6 Km compreendido entre a Quadra 516 e o viaduto do Eixo Monumental, ao longo das Quadras "500", com extensão total de 12 Km de pavimento rígido, que visa trazer maior conforto aos usuários, além de mais segurança e economicidade em manutenções.

O pavimento rígido em implantação na Avenida W3 Sul, que é uma das vias mais movimentadas da capital, visa sanar problema crônico na região, que devido ao intenso fluxo de ônibus, tem seu pavimento deformado e em muitas ocasiões, erodido devido ao desgaste.

Dentre as vantagens do pavimento rígido, podemos citar: durabilidade, baixa manutenção, resistência a cargas pesadas, melhora na dispersão das cargas para o subleito, trazendo economia também no tratamento do subleito.



Contrato nº 16/2022 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul

**Ação/Subtítulo 3856.0001** - Gestão da Fiscalização e Supervisão de Obras - DF:

Por meio dos recursos desta Ação são realizadas diversas atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros, em apoio imprescindível à execução dos empreendimentos sob a gestão desta Secretaria.

- Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - **Contrato nº 19/2022**: Contratação com andamento normal e com 76% dos serviços técnicos de supervisão realizados até o 6º bimestre.

Considerando que esta Secretaria de Obras não possui corpo técnico, laboratórios e equipe de topografia suficientes para o acompanhamento integral desta intervenção foi necessária a contratação de Supervisora para subsidiar a execução das obras, objeto do Contrato nº 21/2022.

Relaciona-se a seguir, os principais serviços realizados em 2024:

- Acompanhar as diversas etapas de revisão e adequação dos projetos básicos e executivos, inclusive aprovação e verificação da qualidades técnicas quanto à correta utilização das normas técnicas vigentes;
- Acompanhar os estudos e da revisão/rea adequação dos projetos em fase de obras;
- Prestar informações e esclarecimentos à SODF quanto aos projetos de engenharia e outros projetos necessários, inclusive informando se estes atendem às normas técnicas;
- Acompanhar o Diário de Obras quanto à elaboração e verificação dos serviços realizados em relação às especificações técnicas e projetos contratados;
- Acompanhar e supervisionar a execução de cada etapa dos serviços, inclusive aferindo os quantitativos executados para fins de elaboração de medições, avaliação técnica qualitativa e aprovação dos serviços componentes do projeto executivo;
- Aprovar e liberar por escrito cada etapa de projeto e obra e apresentar relatórios de término das etapas;
- Propor soluções para os problemas construtivos e imprevistos surgidos, com anuência desta SODF, devendo ser registradas as ocorrências no Diário de Obras e no relatório eventual;
- Verificar os ensaios tecnológicos realizados pela empresa executora da obra, em conformidade com a norma técnica vigente e realizar ensaios de contraprova (se necessário);
- Verificar toda a instrumentação geotécnica a ser implantada;
- Executar o controle físico financeiro da obra;
- Executar levantamentos topográficos cadastrais e documentação técnica para subsidiar a SODF na elaboração dos processos desapropriatórios, caso ocorra e seja necessário;
- Acompanhar as condições de segurança durante as obras;
- Prestar informações sobre o andamento dos projetos e das obras via web; e
- Elaborar a emissão de relatórios de aprovação de projetos que podem ser mensais, parciais, eventuais e finais.



Contrato nº 19/2022 - Supervisionar as obras de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG)

- Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a fiscalização/accompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria - **Contrato nº 8/2023**:

Os estudos e/ou ensaios geológico-geotécnicos, abrangidos por esta contratação, visam à caracterização dos solos do ponto de vista das condições de fundação (OAE), das obras e do dimensionamento dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, identificação do nível d'água, identificação de material terroso e granular sensível, bem como identificação e delimitação de material inservível (para fundação e estruturas de pavimento), estudos de subleito, de revestimento primário, jazidas, areais, resíduos da construção civil e outros.

Já os estudos e/ou ensaios afetos ao controle tecnológico do concreto, constantes da contratação em tela, visam garantir o desempenho das estruturas, bem como a qualidade dos insumos utilizados, de forma a evitar patologias que possam comprometer sua vida útil, assim como o controle tecnológico e ensaios em materiais betuminosos a serem empregados nas obras de infraestrutura, de modo a promover caracterização de sua composição, além de garantir emprego que satisfaça às especificações previstas nas Normas Técnicas.

Entretanto, devido a questões técnico-administrativas relacionadas a erro material identificado na unidade de medida contida no Orçamento Sem Desoneração (131909466) do Edital de Licitação (79176246), do item vinculado ao ensaio de viga "Benkelman", a contratação finaliza 2024 com status de paralisada. Realizado 7% dos serviços até o 6º bimestre.

Dentre os serviços realizados destacam-se (158937622): Lote 1: 485 unidades de serviços geotécnicos e ensaios e 1.490 m de sondagem; Lote 2: 622 unidades de serviços de controle tecnológico laboratorial e 760m de ensaio de viga "Benkelman" (permite avaliar a condição e o desempenho do pavimento ao longo do tempo).



Contrato nº 8/2023 - Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2)

- Ação/Subtítulo 3856.0001 - Remanejamento de Rede - Readequação /implantação de infraestrutura de Energia Elétrica.

- Implantação de rede elétrica de média e baixa tensão e mitigação de riscos na rua 1 e na rua principal do assentamento 26 de setembro - **Contrato nº 13/2024**: A readequação/implantação da rede visa garantir os parâmetros mínimos de segurança e qualidade no fornecimento de energia elétrica regular na região. Intervenção em andamento normal, e com 27,5% dos serviços executados até o 6º bimestre

- **Ação/Subtítulo 3855.0001** - Gestão Ambiental na Execução de Obras e na Implantação da Política de Saneamento - DF: Até o 6º Bimestre foram realizados os pagamentos das seguintes taxas:

Esta Secretaria, no ano de 2024, realizou a gestão ambiental de diversos empreendimentos e atuou nos procedimentos para a obtenção de autorizações e licenças ambientais de interesse desta Pasta e de outros Órgãos, cujas obras têm sido acompanhadas de forma a auxiliar na clara execução das atividades em conformidade com a legislação ambiental. Na tabela abaixo, estão relacionadas as Licenças e Autorizações recebidas/renovadas durante o ano de 2024:

Obra	Licença/Autorização Ambiental	Tipo de Pagamento	Valor (R\$)
Corredor Eixo Oeste - EPIG - Trecho 1	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (1 taxa) e Taxa de Análise da Autorização (1 taxa).	396.348,75
Corredor Eixo Oeste - EPIG - Trecho 5 e 6	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (1 taxa) e Taxa de Análise da Autorização (1 taxa).	
Corredor Eixo Oeste - EPIG - Trecho 4	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (1 taxa) e Taxa de Análise da Autorização (1 taxa).	
Corredor Eixo Oeste - EPIG - Trecho 2	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (1 taxa) e Taxa de Análise da Autorização (1 taxa).	
Corredor Eixo Oeste - EPIG	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (1 taxa).	
SOF Sul	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (1 taxa), Taxa de Análise da Autorização (1 taxa) e Compensação Florestal - Ibram.	
Parque do Cortado	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (2 taxas) e Taxa de Análise da Autorização (1 taxa).	
Sol Nascente - Trecho 1	Autorização de Supressão Vegetal	Taxa de Análise da Autorização.	
Sol Nascente - Trecho 3	Autorização de Supressão Vegetal	Taxa de Análise da Autorização.	
Via de ligação entre o Guará II e o Núcleo Bandeirante	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam e Compensação Florestal - Ibram.	
Setor Habitacional Mestre D'Armas	Licença Única (Em elaboração no Ibram)	Taxa de Licenciamento (1 taxa) e Taxa de Análise da Licença (1 taxa).	
Estrada Setor Policial Militar - ESPM (Lançamento T16)	Autorização de Supressão Vegetal	Compensação Florestal - Funam (2 taxa).	
Praia Norte - Lago Norte	Taxa de Análise da Autorização - Implantação de gabiões para taludes	Implantação de gabiões para taludes - Praia Norte.	

- Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste no Distrito Federal - **Contrato nº 11/2023**. Foram monitorados, até o 4º bimestre de 2024, 140 pontos de ruídos, isso corresponde a 100% dos serviços executados.

A contratação em tela tem como objetivo acompanhar o cumprimento da legislação e condicionantes das licenças ambientais das obras do Corredor Eixo Oeste, de forma a cobrar das empresas responsáveis pelas respectivas obras o atendimento ao nível de ruído máximo permitido. Os relatórios apresentados pela Contratada subsidiaram o cumprimento desta Secretaria à legislação ambiental, no que se refere à poluição sonora. Eventuais ruídos constatados em desacordo com a legislação foram devidamente reportados aos responsáveis para que providências fossem tomadas e os ruídos fossem minimizados.



Contrato nº 11/2023 - Monitoramento dos níveis de ruídos

## ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Posição SAG 6º Bimestre/2024 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF.

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapas SAG	Situação	Executado
Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização - Etapa 2 (Contrato nº 14/2022).	DF	0025	Concluída	-
Manutenção de Parque de Iluminação (Contrato nº 4/2018)	DF	0027	Concluída	-
Fornecimento de Energia Elétrica para o Sistema de Iluminação do Distrito Federal (Contrato nº 6/2023).	DF	0028	Concluída	-
Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (Contrato nº 1/2024)	DF	0063	Concluída	-

**Ação/Subtítulo 1836.0023** - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF

- Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar a expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF - **Contrato nº 14/2022**: Realizado em 2024, Implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias.

- Execução do Contrato nº **14/2022** finalizada no 2º Bimestre (25/03/2024), conforme estabelecido na Cláusula 9.3, do Contrato de Concessão com a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A (128370626), que obteve a sua eficácia com a emissão de Ordem de Serviço em 25/03/2024 (136788732)

⇒ **EMENDAS PARLAMENTARES:**

Emendas Parlamentares			
Programa de Trabalho	Descrição dos serviços realizados	Localidade	Quantidade
15.752.6209.1836.0012	Implantação de rede de iluminação Pública no Núcleo Rural Olhos D'Água	Gama	83
	Implantação de rede de Iluminação Pública no Núcleo Rural Monjolo	Recanto da Emas	31
	Implantação de Iluminação Pública na Rua Primavera - Ponte Alta	Ponte Alta Norte	24
	Implantação de Iluminação Pública na SQS 216 Sul	Plano Piloto	265
	Implantação de Iluminação Pública no Campo Sintético da QS 20	Riacho Fundo II	8
15.451.6209.1836.0014	Implantação de Iluminação Pública no CAUB II	Riacho Fundo II	66
	Implantação de Iluminação Pública na Via Principal entre a QNQ e o Sol Nascente - Trecho 3	Sol Nascente	51
25.752.6209.1836.0124	Implantação de Iluminação Pública na Quadra 103, Residencial Oeste	São Sebastião	62
15.752.6209.1936.0125	Implantação de Iluminação Pública na Vila Cauhy	Núcleo Bandeirante	8
	Implantação de Iluminação Pública no Viaduto sobre a EPIA Sul, trecho do Setor de Postos e Motéis	Candangolândia	34
	Implantação de Iluminação Pública na Via NB - 01, trecho entre a EPNB até a Av. do Contorno.	Núcleo Bandeirante	73

Apresenta-se adiante os registros fotográficos dos serviços realizados:

- **Ampliar pontos de Iluminação no DF - 15.752.6209.1836.0012:**



Implantação de iluminação pública no Núcleo Rural Olhos D'Água - Gama - Emenda Parlamentar - Obra Concluída em 30/12/2024



Implantação de rede de Iluminação Pública no Núcleo Rural Monjolo





*Implantação de Iluminação Pública na Rua Primavera - Ponte Alta*



*Implantação de iluminação pública na SQS 216 – Plano Piloto – Emenda Parlamentar - Obra Concluída em 30/12/2024.*



*Implantação de Iluminação Pública no Campo Sintético da QS 20 - Riacho Fundo II*

**- Ampliar pontos de Iluminação Pública no DF - 25.752.6209.1836.0125:**



*Implantação de iluminação pública na Vila Cauhy*



*Implantação de Iluminação Pública no Viaduto sobre a EPIA Sul, Candangolândia*



*Implantação de Iluminação Pública na Via NB-01 - Núcleo Bandeirante*

Para a utilização dos recursos oriundos de Emendas Parlamentares Distritais destinados à intervenções no Parque de Iluminação Pública, tem sido adotado o apostilamento ao Contrato de Concessão celebrado com CEB Iluminação Pública e Serviços S/A – CEB IPE, com eficácia a partir de 25 de março de 2024.

**Ação/Subtítulo 8507.6471** - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Regiões Administrativas - DF.

- Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP -**Contrato nº 4/2018**: A execução do Contrato foi finalizada no 2º Bimestre (25/03/2024), conforme estabelecido na Cláusula 9.3, do Contrato de Concessão com a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A (128370626), que obteve a sua eficácia com emissão de Ordem de Serviço em 25/03/2024 (136788732).

- Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal -**Contrato nº 6/2023**: No Quadro abaixo são apresentadas as realizações dos serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF, no âmbito das respectivas contratações:

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)			
Mês	Contrato nº 4/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP)		Contrato nº 6/2023 (Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal)
	Quantidade de Pontos Mantido	Luminárias Eficientizadas	Consumo de Energia (kwh)
Janeiro	310.450	248	32.460.752
Fevereiro	310.640	1.263	30.162.867
Março	310.450	3.277	29.109.987
Abril	-	-	24.519.844
Maió	-	-	25.320.891
Junho	-	-	24.418.516
Julho	-	-	24.827.819
Agosto	-	-	24.751.548
Setembro	-	-	24.659.702
Outubro	-	-	24.436.006
Novembro	-	-	23.466.874
Dezembro	-	-	24.253.167

**Ação/Subtítulo 9128.0002** - Prestação dos serviços de Iluminação Pública - Parceria Público Privada - DF.

⇒ **CONTRATO DE CONCESSÃO:**

Ações implementadas no âmbito do Contrato de Concessão Administrativa dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, com base na Lei nº 7.275/2023 e no Decreto nº 45.033/2023, que outorgou a concessão do serviço de iluminação pública do Distrito Federal à CEB Iluminação Pública e Serviços S/A – CEB IPES, formalizada por meio do Contrato de Concessão, celebrado em 4 de dezembro de 2023, em que se delega a prestação dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal, incluindo as atividades de planejamento, investimento e gestão da implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoria, eficiência, expansão, operação e manutenção dos ativos que integram o sistema de iluminação pública no território do Distrito Federal.

O Contrato de Concessão foi firmado entre o DF, por meio desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF e da então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD, denominado Poder Concedente e a CEB IPES, denominada Concessionária.

O Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal é o terceiro maior Parque de Iluminação Pública do país, com mais de 250 mil pontos luminosos. Desde a assinatura, tanto a Concessionária quanto o Poder Concedente realizaram as diligências necessárias para alcançar a eficácia do contrato.

Assim, a Concessionária e o Poder Concedente, no início de 2024, realizaram diversas diligências, tais como a formalização dos seguintes instrumentos:

- (i) Plano de Transição Operacional;
- (ii) Contrato de Administração de Contas;
- (iii) Termo de Transferência de Bens Reversíveis;
- (iv) Termo de Transferência de Documentos, Dados e Informações;
- (v) Termo de Cessão; e
- (vi) Termo Aditivo ao Convênio de Repasse da CIP com a Distribuidora.

Em 25 de março de 2024, o referido Contrato de Concessão entrou em eficácia com a emissão da Ordem de Serviço.

A Concessionária apresentou os Planos previstos no Contrato de Concessão, nos prazos estipulados e adequados à data da emissão da ordem de serviço, que foram devidamente aprovados pelo Poder Concedente, estando as datas de aprovações especificadas a seguir:

- Em 04 de setembro de 2024, esta Secretaria aprovou os seguintes Planos, com o Adendo do Quadro sinótico de ajustes:

- a) Plano de Implantação do Centro de Controle Operacional (PICCO);
- b) Plano de Implantação de Manutenção (PMAN);
- c) Plano de Implantação do Sistema Central de Gerenciamento; e
- d) Plano Implantação do Call Center.

- Em 25 de outubro de 2024, a SODF aprovou os seguintes Planos, com o Adendo do Quadro sinótico de ajustes:

- e) Plano de Gestão Socioambiental (PGS);
- f) Plano de Implantação do Sistema de Telegestão (PIST);
- g) Plano de Iluminação de Destaque (PID); e
- h) Plano de Modernização e Eficiência (PME).

Assim, com a aprovação dos Planos, a Concessionária pôde seguir com a implementação dos serviços contratados conforme cronograma. Frisa-se que, no ano de 2024, o Centro de Controle Operacional foi devidamente implantado e se encontra ativo. Da mesma maneira, o Call Center teve a sua implementação completamente realizada, oportunizando à sociedade maior acesso às demandas diárias e as suas soluções.

A transposição tecnológica de todas as luminárias convencionais para LED está prevista para ocorrer em 40% do Parque de Iluminação Pública do DF ainda em 2025. Os outros 60% do Parque estão previstos para serem concluídos da seguinte forma: 30% até 2026 e 30% até 2027, conforme previsto no Contrato de Concessão. A implantação do Sistema de Telegestão, com monitoramento de 15 dos pontos luminosos 24 horas por dia, deverá ocorrer em 7,5% dos pontos luminosos até o final do mês de março de 2026. Os outros 7,5% deverão ser implementados até o final do mês de março de 2027.

Será realizada a iluminação de destaque dos seguintes monumentos, conforme o Plano de Iluminação de Destaque - PID:

Monumentos elegíveis para iluminação pública de destaque	
<b>Monumentos Religiosos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catedral de Brasília.</li> <li>• Igreja da 108 Sul.</li> <li>• Igreja Nossa Senhora da Paz.</li> </ul>	<b>Monumentos Culturais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biblioteca Nacional.</li> <li>• Memorial e Monumentos a JK.</li> <li>• Memorial Povos Indígenas.</li> </ul>
<b>Conjuntos Arquitetônicos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palácio da Justiça.</li> <li>• Palácio do Buriti.</li> <li>• Esplanada dos Ministérios.</li> </ul>	<b>Pontes e Viadutos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponte JK.</li> <li>• Ponte das Garças.</li> <li>• Ponte Honestino Guimarães.</li> </ul>

#### ⇒ Manutenção Corretiva e Preventiva:

A manutenção corretiva e preventiva do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal é realizada pela CEB-IPES, e em 2024, desde o início da concessão, foram realizados 93.649 atendimentos a 94.434 pontos, por meio de 105.677 aberturas de protocolo.

Os locais que mais concentram os chamados para manutenção são:

1. - Plano Piloto/Brasília, com 18.672 atendimentos realizados;
2. - Ceilandia, com 8.371 atendimentos realizados; e
3. - Recanto das Emas, com 6.145 atendimentos realizados.

#### ⇒ Eficientização da Iluminação Pública:

A eficientização da Iluminação Pública realizada pela CEB-IPES, trata da substituição de luminárias com tecnologias antigas (vapores metálicos e LEDs de baixa eficiência) por luminárias de LED mais eficientes (mais de 150 lm/w).

Nesse cenário ao longo de 2024 foram investidos R\$ 18.087.812,63 na eficientização da iluminação pública, com a substituição de 22.190 luminárias em 20 Regiões Administrativas.

#### • Programação Orçamentária Não Executada

#### Ação/Subtítulo 1110.0306 - Execução de Obras de Urbanização - Pôr do Sol:

A programação da intervenção para implantação de Infraestrutura urbana (geométrico, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meio fio) na localidade do Pôr do Sol requer a elaboração de projetos executivos, contratados no final do bimestre (Contrato nº 17/2024), no âmbito do Programa Trabalho 15.451.6208.1968.0018 - Elaboração de Projetos - Distrito Federal (00110-00001440/2023-03).

#### Ação/Subtítulo 1110.1322 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - DF:

O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbra à época de elaboração do então PLOA 2024, a necessidade de que a ação/subtítulo 1110.1322 restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador (Caixa) por intermédio da operação de crédito nº 175.749-27/2006. Em 31/10/2024 a Caixa formalizou notificação ao DF acerca do encerramento da operação, mediante o vencimento antecipado da dívida, conforme os termos do Ofício nº 0092/2024/GIGOV/BR (155164425). Houve agendamento de reuniões técnicas com equipes do GDF e da Caixa a serem realizadas no início de 2025 para prosseguimento de tratativas a serem envidadas no âmbito do processo 00010-00001815/2024-54.

#### Ação/Subtítulo 3058.0001 - Execução de obras de Urbanização Programa Pró-Moradia - Arapoanga - Planaltina:

De modo igual à Ação 1110.1322, O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbra à época de elaboração do então PLOA 2024, a necessidade de que a ação/subtítulo 3058.0004 restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador (Caixa) por intermédio da operação de crédito nº 262250-51/2009. Em 31/10/2024 a Caixa formalizou notificação ao DF acerca do encerramento da operação, mediante o vencimento antecipado da dívida, conforme os termos do Ofício nº 0096/2024/GIGOV/BR (155164569). Houve agendamento de reuniões técnicas com equipes do GDF e da Caixa a serem realizadas no início de 2025 para prosseguimento de tratativas a serem envidadas no âmbito do processo 00010-00001815/2024-54.

#### Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10877 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	METRO		01/01/2001	Anual	32540,00	35699,00	X		X		X		SUAF/SODF, DU/NOVACAP E GEREN/DITEC/TERRACAP
<b>Justificativa:</b> 2024 - Os resultados alcançados refletem o desempenho da SODF e da Terracap na execução de obras de drenagem no ano de 2024. Esses resultados são decorrentes da execução das seguintes obras de infraestrutura:- SODF:• Urbanização dos Setores Habitacionais: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022 e CT 17/2022); Vicente Pires (CT 29/2023 e CT 19/2021); Bernardo Sayão (CT 1/2023); Requalificação do SOF/SUL (CT 24/2022) e Via de Ligação Guará- Núcleo (CT 23/2023).- Terracap:• Infraestrutura na QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58- Guará II; Drenagem e pavimentação asfáltica para os Lotes 01 e 02 do Centro Comercial da QI 28, no Lago Sul; Drenagem e pavimentação no Residencial Tamandua - Recanto das Emas e; Complementação do sistema viário e de drenagem do Setor Noroeste, no Plano Piloto (160040856).No que concerne às ações da SODF, importante ressaltar, que, devido a questões técnicas, informadas pelos Executores das contratações referentes ao Setor Bernardo Sayão e registradas no Relatório de Gestão, o resultado esperado para 2024, afeto a essas intervenções, não ocorreu como planejado, o que irá requerer reprogramação das ações previstas. De outro modo, as intervenções no Setor Habitacional Sol Nascente se destacaram na contribuição para o resultado obtido.													
10878 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	METRO QUADRADO		01/01/2001	Anual	451150,00	517256,00	X		X		X		SUAF/SODF, DU/NOVACAP E GEREN/DITEC/TERRACAP
<b>Justificativa:</b> 2024 - Os resultados alcançados refletem o desempenho da SODF, da Novacap e da Terracap na execução de obras de drenagem no ano de 2024. Esses resultados são decorrentes da execução das seguintes obras de infraestrutura:- SODF:• Urbanização dos Setores Habitacionais: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022 e CT 17/2022); Vicente Pires (CT 29/2023, CT 19/2021 e CT 21/2016); Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023); Requalificação do SOF/SUL (CT 24/2022) e Via de Ligação Guará- Núcleo (CT 23/2023).- Novacap:• Obras diversas no Distrito Federal (160989133).- Terracap:• Infraestrutura na QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58- Guará II; Drenagem e pavimentação asfáltica para os Lotes 01 e 02 do Centro Comercial da QI 28, no Lago Sul; Drenagem e pavimentação no Residencial Tamandua - Recanto das Emas e Complementação do sistema viário e de drenagem do Setor Noroeste, no Plano Piloto (160040856).No que concerne às ações da SODF, importante ressaltar, que, devido a questões técnicas, informadas pelos Executores das contratações referentes ao Setor Bernardo Sayão e registradas no Relatório de Gestão, o resultado esperado para 2024, afeto a essas intervenções, não ocorreu como planejado, o que irá requerer reprogramação das ações previstas. De outro modo, as intervenções no Setor Habitacional Sol Nascente e as obras de pavimentação executadas no Distrito Federal, sob a gestão da Novacap, se destacaram na contribuição para o resultado obtido.													

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS</b>	<b>50000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO-TAGUATINGA	50000,0	0,0	0	0
<b>4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO</b>	<b>58400,0</b>	<b>4890400,0</b>	<b>4827429,00</b>	<b>3654873,99</b>
0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO-AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA	58400,0	4890400,0	4827429,00	3654873,99
<b>3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL</b>	<b>1005000,0</b>	<b>16557178,00</b>	<b>13946768,18</b>	<b>10666481,89</b>
0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA	1005000,0	16557178,00	13946768,18	10666481,89
<b>3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)</b>	<b>175020003,0</b>	<b>189272959,00</b>	<b>114632167,76</b>	<b>110589316,73</b>
0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)- - REGIÃO OESTE	175020003,0	189272959,00	114632167,76	110589316,73
<b>3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>	<b>50000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL	50000,0	0,0	0	0
<b>5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>	<b>50000,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL	50000,0	10000,0	0	0
<b>TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA</b>	<b>176233403,00</b>	<b>210730537,00</b>	<b>133406364,94</b>	<b>124910672,61</b>

## Posição SAG 6º Bimestre/ 2024

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6216	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado
Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar, trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W 3 Sul (Contrato nº 22/2021).	Região Central	0034	Normal	95%
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (Contrato nº 9/2022).	Rrgião Oeste	0035	Atrasada	56,5%
Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (Contrato nº 21/2022).	Região Central	0036	Normal	42,51%
Operação do Túnel Rodoviário - Avenida Central - Taguatinga (Contrato nº 30/2023).	Taguatinga	0024	Concluída	-
Fornecimento e Instalação de Tela Metálica antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga (Contrato nº 7/2023).	Taguatinga	0030	Concluída	87,65%

Fornecimento e instalação de sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 15/2023).	Taguatinga	0031	Normal	88%
Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 18/2023).	Taguatinga	0032	Concluída	100%
Reservatório de Detenção do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 24/2023).	Taguatinga	0033	Concluída	100%
Infraestrutura para implantação do Corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS (Contrato nº 2/2024).	P. Piloto	0062	Normal	97%


O Programa Temático 6216, em 2024, apresentou a maior parte dos recursos consignados com destinação para custear as intervenções vinculadas à Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Ação/Subtítulo 3119.0004), tendo em vista que estes empreendimentos integram o Escopo/Quadro de Composição de Investimentos de operações de crédito celebradas com a Caixa, com o Banco do Brasil e o BNDES. Em 2024, os percentuais alocados nessas Ações corresponderam a 45% da Dotação Inicial (Lei) e 83% da Despesa que restou Autorizada. Destacam-se, a seguir, as Ações do Programa 6216 em 2024:

- **Programação Orçamentária Realizada**

**Ação/Subtítulo 4071.0001** - Operação de Túnel Rodoviário - Avenida Central - Taguatinga

- Serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga/DF, com reposição de materiais - Contrato nº 30/2023:

Realizados serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga/DF, em regime permanente, com reposição de materiais, visando assegurar o atendimento dos serviços de manutenção preventiva de maneira contínua, pois são serviços imprescindíveis e essenciais, que se interrompidos poderão comprometer a continuidade das atividades visto que a ausência afetaria significativamente a ligação do tráfego da EPTG com as regiões administrativas de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Ao longo de 2024 foram realizados: monitoramento da passagem subterrânea com seis faixas de rolamento, segurança do complexo viário e manutenção do CCO. Por se tratar de serviço contínuo, ao final do exercício a Etapa 0024 restou concluída no SAG e será efetivado novo registro para acompanhamento ao longo de 2025.

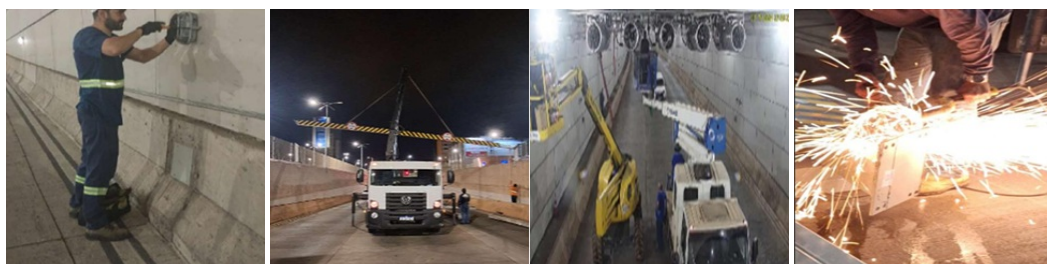


Contrato nº 30/2023 - Operação de Túnel Rodoviário

**Ação/Subtítulo 3054.0002** - Construção de Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.

- Fornecimento e instalação de tela metálica antifusante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga - **Contrato nº 7/2023**: O Executor do Contrato deu por concluída a execução dos serviços com 87,65% dos serviços realizados até o 3º bimestre.

- Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 24/2023**: Intervenção concluída com 100% dos serviços realizados até o 5º bimestre.

A intervenção consiste na construção de reservatório de detenção com volume aproximado de 5.033m<sup>3</sup>. Instalado o canteiro de obras, iniciada a escavação da bacia e a readequação do projeto. Intervenção em andamento concluída e com 100% dos serviços realizados até o 5º bimestre.



Contrato nº 24/2023 - Construção de reservatório de detenção

**Ação/Subtítulo 3119.0004** - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste:

O Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste (Linha Verde), com 38,7 quilômetros de extensão, é considerado o principal eixo de transporte público coletivo do Distrito Federal. Atende a 53% da demanda total do transporte coletivo do DF. Formam a bacia de alimentação do sistema tronco-alimentador do Eixo Oeste, as regiões Administrativas de Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, Guará e Brasília. Será, portanto uma conexão entre o Sol Nascente e a área central do Plano Piloto, passando pelas Avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, Centro de Taguatinga e EPTG (Estrada Parque Taguatinga), e se desmembrando em duas vias: a EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) e a ESPM (Estrada do Setor Policial Militar).

A concepção do projeto se baseia na implantação de um sistema integrado de transporte público com eixos estruturantes, servidos por linhas troncais, circulares, de ligação e alimentadores/distribuidores, visando à redução dos tempos de espera e de viagens nas linhas alimentadoras e troncais, com o mínimo de superposição de itinerários. Nesse contexto, para o cumprimento da finalidade de redução de tempo de viagens e de causas típicas de atrasos, como congestionamentos e tempos de paradas em cruzamentos viários, o Sistema BRT deve operar em via exclusiva no modelo de corredor de ônibus e ter prioridades no sistema viário, especialmente nas interseções viárias.

Para tanto, o Programa de Transporte Urbano do DF – PDTU/DF previu a realização de diversas intervenções viárias neste eixo, que é composto pela seguintes vias/intervenções:

1. EPIG – Estrada Parque Indústrias Gráficas;
2. ESPM – Estrada do Setor Policial Militar;
3. Avenida Hélio Prates;
4. Avenida Comercial;
5. Avenida Central;
6. Avenida SAMDU;
7. EPCT – Estrada Parque Contorno (Pistão Norte e Sul);
8. EPCL – Estrada Parque Ceilândia;
9. Via Interbairros;
10. Via do Parque Nacional;
11. Via do Centro Administrativo; e
12. Estações de transferência;

Ressalta-se que para a implantação do Corredor, até o ano de 2018, havia a necessidade de revisão dos projetos de engenharia pertinentes à maioria das intervenções. Entretanto, os diversos setores desta Secretaria, em especial a de projetos, empreendeu esforços, o que possibilitou dar continuidade a certames que sofreram interrupções em anos anteriores. No Quadro a seguir, demonstra-se a evolução dos empreendimentos que compõem o Corredor de Transporte Eixo Oeste:

Corredor de Transporte Eixo Oeste				
Empreendimentos principais	Intervenção	Contrato nº	Estágio	Ano de Conclusão
1 - TÚNEL DE TAGUATINGA	Construção do Túnel de Taguatinga	4/2026	Concluída	2023
	Fornecimento e instalação de tela metálica antifusca em nos emboques voltados para a EPTG	7/2023	Concluída	2024
	Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel	13/2023	Concluída	2023
	Reservatório de detenção	24/2023	Concluída	2024
	Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel	18/2023	Concluída	2024
2 - ACESSO SOL NASCENTE / HÉLIO PRATES	Via de acesso ao Sol Nascente/Hélio Prates 2	22/2016	Concluída	2019
3 - AVENIDA HÉLIO PRATES	Requalificação - Etapa 1	14/2021	Concluída	2023
	Requalificação - Etapa 2	9/2022	Atrasada - 56,50%	-
	Requalificação - Etapa 3	-	Necessidade de reformulação com mudança de concepção. (146736550)	-
4 - AVENIDAS SAMDU E COMERCIAL NORTE E SUL	Alargamento do Viaduto EPTG/EPCT	1/2017	Concluída	2021
5 - TRANSVERSAIS SAMDU E COMERCIAL	Incluído no Lote 2 do Drenar - DF (projetos)	4/2022	-	-
6 - DRENAR TAGUATINGA	Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) - Lote 1	3/2022	Andamento Normal - 92%	-
	Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) - Lote 2	4/2022	Andamento Normal - 93%	-
7 - VIADUTO EPTG/EPCT (Alargamento)	Alargar o Viaduto da Interseção da EPTG-EPCT (DF001), em Taguatinga	1/2027	Concluída	2020
8 - EPIG - VIADUTO DO PARQUE DA CIDADE	Viaduto da EPIG	20/2021	Concluída	2023
9 - EPIG - TRECHO SIG	Intervenção compreendida no Contrato nº 21/2022	21/2022	Andamento Normal - 42,51%	-
11 - ESPM - ENTRE A EPIG E O VIADUTO DA W 3	Reformulação da ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto W 3 Sul	22/2021	Andamento Normal - 95%	-
12 - ESPM - VIADUTO W 3	Construção viaduto ESPM/Viaduto W 3	34/2013	Concluída	2014
13 - ESPM - ENTRE O VIADUTO DA W 3 E O TERMINAL DA ASA SUL - TAS	Complementação do sistema viário da ESPM	9/2020	Concluída parcialmente - 77,00%	2023
	Infraestrutura para implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo revitalização de OAE.	2/2024	Andamento Normal - 97%	-

Restam pendentes para lançamento de certames, apenas as seguintes intervenções: Requalificação Urbana da Avenida Hélio Prates - Etapa 3; Transversais Samdu e Comercial e Obras de Drenagem em Taguatinga/Ceilândia - Drenar - DF. Desse modo, em 2024, nota-se evolução nas providências objetivando a efetiva implementação do Corredor de Transporte Eixo Oeste no Distrito Federal, que já contava com recursos específicos oriundos de operação de crédito vigente desde 2014. A seguir são relacionados os empreendimentos que fazem parte do Corredor, com execução/contratação/conclusão até 2024:

- Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W 3 Sul **Contrato nº 22/2021** - Obra em andamento normal e com 95% dos serviços executados até o 6º bimestre.

As obras de reformulação do sistema viário da ESPM parte das diretrizes globais de priorização do transporte coletivo, do transporte não motorizado e da mobilidade a pé e está em consonância com as diretrizes do PDTU/DF, dentre as quais a implantação de sistema integrado de transporte público de passageiros e a implantação, recuperação e adaptação de infraestrutura de transporte voltada a atender a mobilidade urbana. Os principais serviços realizados ao longo do ano de 2024 contemplam, principalmente, o plantio de grama; "tunnel liner"; implantação de redes de drenagem; meios-fios e pavimentação em concreto. Obra em andamento normal e com 95% dos serviços executados até o 6º bimestre.



Contrato nº 22/2021 - Reformulação da ESPM

- Requalificação da Avenida Hélio Prates, Etapa 2 - Pistão Norte, Taguatinga - **Contrato nº 9/2022**:

As obras de reformulação do sistema viário da Avenida Hélio Prates parte das diretrizes globais de priorização do transporte coletivo, do transporte não motorizado e da mobilidade a pé e está em consonância com as diretrizes do PDTU/DF. A intervenção busca também solucionar problemas urbanos tais como: edificações implantadas em cotas de soleiras distintas; calçadas com variados obstáculos (desníveis, alambrados, muretas, avanços das edificações, exposições de mercadorias, etc) e sem acessibilidade; redes de energia e iluminação implantadas na circulação de pedestres e de veículos; estacionamentos desordenados e sem sinalização; como também a falta de arborização.

Foram executados ao longo de 2024 o remanejamento do Mirante do Parque do Cortado; conclusão dos gabiões das lagoas de retenção; execução do pavimento rígido do BRT no trecho entre o cruzamento do setor QI e o cruzamento da Av. Comercial e; execução da galeria de drenagem até próximo do cruzamento da Av. Samdu. As obras

se encontram conforme disposto na tabela abaixo:

Contrato nº	% até o 6º Bim de 2023	% até o 6º Bim de 2024	Situação da Obras - 6º Bim de 2024	Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do exercício de 2024/Evolução das Obras/Serviços	Análise da situação atual frente ao cronograma físico-financeiro e perspectiva para 2025
9/2022	47,53	56,50	Atrasada	Problemas financeiros da Contratada, interferências com o comércio local e desvios de trânsito necessários.	Obras em ritmo lento.



Contrato nº 9/2022 - Requalificação da Avenida Hélio Prates , Etapa 2

- Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - Contrato nº 21/2022. As obras de readequação se encontram com andamento normal e com 42,51% dos serviços executados até o 6º bimestre.


A intervenção que em seu escopo prevê o desenvolvimento de projetos e a execução de obras de readequação da Rodovia DF 011 (EPIG), com extensão, aproximadamente de 6km em cada sentido, interligando a via EPTG ao Eixo Monumental. A proposta de intervenção consiste na readequação da via para implantação do corredor exclusivo para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit/Ônibus de trânsito Rápido) nos dois sentidos, Taguatinga/Plano Piloto e Plano Piloto/Taguatinga.

O projeto de readequação da EPIG foi desenvolvido em 2014 e contempla 4 interseções viárias compostas de 12 viadutos, estações BRT, sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões refletivos, iluminação pública e placas orientativas de trânsito, além de passagens e vias para pedestres e ciclistas interligando todos os trechos, possibilitando rotas contínuas e acessíveis na região. Ponto relevante a ser ressaltado é a modalidade de contratação (RDCI), que permite flexibilidade na elaboração dos projetos e escolha das intervenções que serão utilizadas pelo consórcio contratado, podendo-se exemplificar a adoção da técnica de "whitetopping", definida e aprovada no projeto de pavimentação do Trecho 1, no qual o concreto de cimento "Portland" é aplicado diretamente sobre o revestimento existente na via, exigindo assim, poucos serviços de reparação prévia do pavimento asfáltico.

Considerando que a EPIG está inserida em meio urbano consolidado e divide um bairro habitacional de um parque urbano, busca-se ainda, com a proposta de readequação da via, maior integração das áreas urbanas, de forma que o pedestre tenha prioridade sobre os demais modais.

Com a implantação do corredor exclusivo de transporte coletivo no sistema BRT e as soluções para as áreas de interseção da EPIG com vias do Setor Sudoeste, Parque da Cidade, ESPM, dentre outras, busca-se a racionalização do trânsito de veículos privados e a diminuição de tempo de viagem de transporte coletivo, que tende a beneficiar a população do Plano Piloto e as Regiões Administrativas do Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, Guará, Brazlândia e áreas do entorno, como os municípios de Águas Lindas/GO e Padre Bernardo/GO.

Para permitir a programação da obra por fases, o projeto da EPIG foi dividido em trechos, conforme figura abaixo. Em 2024, foram desenvolvidos serviços no Trecho 01, Trecho 02, Trecho 04, Trecho 05 e Trecho 06, conforme pontuados a seguir: Obras de Arte Especiais OAE 01; OAE 03; OAE 06; OAE 07 e OAE 12; projetos; pavimento rígido (concreto); implantação de drenagem; desvio de trânsito; ciclovia e passeio.



Contrato nº	% até o 6º Bim de 2023	% até o 6º Bim de 2024	Situação da Obras - 6º Bim de 2024	Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do exercício de 2024/Evolução das Obras/Serviços	Análise da situação atual frente ao cronograma físico-financeiro e perspectiva para 2025
21/2022	8,00	42,51	Normal	Ao longo da execução foram constatadas várias intercorrências que impactaram no andamento da obra, com destaque para a ausência de projetos executivos aprovados, que impossibilitaram a abertura de frentes de serviços; interferências com a rede elétrica de distribuição de 34,50kva; com a rede elétrica de média tensão de 15kva; com a rede adutora de água potável e de drenagem de águas pluviais; cabeamento de fibra óptica; entre outros.	Novas frentes de serviços para execução do pavimento rígido foram iniciadas e com previsão de execução em 2025.



Contrato nº 21/2022 - Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG)

- Execução da Obra de Infraestrutura Urbana de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS - **Contrato nº 2/2024**: Intervenção com andamento normal com 97% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

Importante intervenção que em seu escopo prevê o desenvolvimento de projetos e a execução de obras de ligação da via EPTG até o Terminal da Asa Sul. Principais serviços executados: reconformação de taludes; reconformação de terreno com escavação; plantio de gramas por hidrossemeadura em taludes; fresagem de pavimentos; execução de pavimento em concreto; drenagem pluvial; e assentamento de meios-fios.



Planta de localização da poligonal onde foram executadas a intervenção, em fase de conclusão, de acesso ao TAS - Contrato nº 2/2024



Contrato nº 2/2024 - Infraestrutura para implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS

• **Programação Orçamentária Não Executada**

**Ação/Subtítulo 2316.0002** - Conservação de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - Túnel Rodoviário Taguatinga:

- Não houve demanda a ser atendida mediante recursos do Programa de Trabalho em tela, ademais, cabe ressaltar que a operação do Túnel de Taguatinga/DF, é realizada por intermédio do Contrato nº 30/2023 (142216798), Etapa SAG 0024, cujo escopo prevê, dentre outros serviços, a execução de serviços de manutenção.

**Ação/Subtítulo 3361.4356** - Construção de Pontes - DF:

- Houve a necessidade de se manter a Ação de Construção de Pontes, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de ações. Importante registrar que esta Secretaria, em 2024, iniciou a execução de ponte (OAE) sobre o Córrego Vicente Pires, no âmbito do Contrato nº 23/2023. A realização se deu à conta da Ação/Subtítulo 1110.0147 - Execução de Obras de Urbanização.

**Ação/Subtítulo 5902.7778** - Construção de Viaduto - DF

- Houve a necessidade de se manter a Ação/Subtítulo de Construção de Viaduto, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de intervenções. Cumpre registrar, que, apesar de não ter havido utilização de recursos desta ação/subtítulo, em 2024 esta Secretaria manteve a construção, com previsão de conclusão em 2025, de importantes viadutos (OAE 1 e OAE 3), localizados na DF - 011 (EPIG) - Contrato nº 21/2022. A realização se deu à conta da Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste.





Contrato nº 21/2022 - Readequação da EPIG

## 6219 - CAPITAL CULTURAL

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>14291250,0</b>	<b>14156611,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- MUSEU DA BÍBLIA- DISTRITO FEDERAL	14291250,0	14156611,00	0	0
<b>TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>14291250,00</b>	<b>14156611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Programação Orçamentária Não Executada**

**Ação/Subtítulo 5968.0007** - Construção de Espaço Cultural:

A intervenção a ser executada por intermédio desta ação se refere à Construção do Museu da Bíblia. Os recursos previstos são vinculados ao Contrato de Repasse nº 903.915/2020, celebrado com a Caixa em 2020, cujo prazo atual para cumprimento de Cláusula Suspensiva é até 30/10/2025, conforme Carta Reversal Nº 097/2024/GIGOV/BR (158397226).

Destaca-se em 2024 a homologação do resultado do Concurso Público Nacional de Projeto Legal de Arquitetura do Museu da Bíblia efetivada em 14/10/2024 pela Secretaria de Cultura do DF (SECEC) e, em 14/11/2024 a SECEC, por meio de Parecer nº 3/2024 - SECEC/SUPAC (156227712) e Ofício Nº 2182/2024 - SECEC/G (156228404), apresentou a esta SODF o projeto vencedor do certame, procedimento essencial que possibilitou a elaboração da documentação técnica e o respectivo envio à Caixa, em 29/11/2024, para análise visando a retirada de Cláusula Suspensiva (160162299).

Até o encerramento do exercício não houve a conclusão da referida análise. Outras informações constam expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 - Informações Complementares.

## 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>23024475,0</b>	<b>23655692,00</b>	<b>23350416,38</b>	<b>23298966,38</b>
0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	23024475,0	23655692,00	23350416,38	23298966,38
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>1283772,0</b>	<b>1144397,00</b>	<b>1115654,87</b>	<b>1111654,87</b>
7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	1283772,0	1144397,00	1115654,87	1111654,87
<b>8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>2773580,0</b>	<b>2101012,00</b>	<b>1898629,17</b>	<b>1419961,48</b>

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL	2773580,0	2101012,00	1898629,17	1419961,48
<b>1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>217500,0</b>	<b>127500,00</b>	<b>92143,25</b>	<b>92143,25</b>
0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	217500,0	127500,00	92143,25	92143,25
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>590000,0</b>	<b>525000,00</b>	<b>423060,84</b>	<b>406431,96</b>
2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	590000,0	525000,00	423060,84	406431,96
<b>4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>55000,0</b>	<b>55000,00</b>	<b>51600,0</b>	<b>48360,0</b>
0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	55000,0	55000,00	51600,0	48360,0
<b>3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	<b>40000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	40000,0	0,0	0	0
<b>2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>56000,0</b>	<b>16000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	56000,0	16000,00	0	0
<b>TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>28040327,00</b>	<b>27624601,00</b>	<b>26931504,51</b>	<b>26377517,94</b>

• **Programação Orçamentária Realizada**

**Ação/Subtítulo 8502.0092** - Administração de Pessoal: As despesas realizadas nesta ação se referem à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, substituições, contribuições previdenciárias, pagamento de atualização de correção monetária e juros de mora sobre parcelas de pagamento de pessoal.

**Ação/Subtítulo 8504.7003** - Concessão de Benefícios a Servidores: Efetuou-se pagamentos relativos a auxílios: creche/pré escola, alimentação e transporte.

**Ação/Subtítulo 8517.0091** - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: Em 2024, foram adquiridos materiais de consumo, tais como: aquisição de gêneros de alimentação, material de expediente, informática, copa e cozinha, limpeza, manutenção de bens imóveis/instalações, manutenção de bens móveis, elétrico e eletrônico, proteção e segurança, ferramentas, sinalização visual, com aquisição de material permanente, e serviços como: energia elétrica, água e esgoto, passagens aéreas, dedetização, manutenção preventiva, corretiva em ar condicionado, dentre outros.

**Ação/Subtítulo 1471.0033** - Modernização do Sistema de Informação:

Com a finalidade de auxiliar nos processos conduzidos pelos diversos Setores que compõem a estrutura desta Secretaria, foram realizadas as seguintes aquisições de soluções tecnológicas no exercício de 2024, conforme a seguir:

Descrição	Valor (R\$)
Aquisição de computadores do tipo NOTEBOOK completos, todos novos e em primeiro uso, com garantia e assistência técnica on-site.	87.103,25
Aquisição de 2 Tablets.	5.040,00
<b>Total</b>	<b>92.143,25</b>

**Ação/Subtítulo 2557.2570** - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação:

Na rubrica de gestão da informação, foram custeados diversos serviços e novas aquisições, tais como:

- Contratações de Licenças da solução completa do software Autodesk Architecture,
- Licenças do softwares - Business Intelligence - BI,
- Licença de uso do banco de dados online - FGV-DADOS;
- Fornecimento de licença de acesso à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública; suporte do ponto eletrônico;
- Serviços de Outsourcing de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva e aquisição de peças em impressora Plotter;
- Serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; e
- Aquisições de HD, memória RAM, cabos e outros itens de informática e instalações.

**Ação/Subtítulo 4088.0066** – Capacitação de Servidores:

Destaca-se em 2024 a capacitação de 71 servidores nos cursos oferecidos pela Escola de Governo nas modalidades presenciais e à distância e 6 servidores nos cursos a distância da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP e Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED. Foram aportados na ação 0066 - Capacitação de Servidores, o total de R\$ 51.600,00, para treinamento de: 5 servidores, no curso de EFD- REINF/E-SOCIAL X DCTF WEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS – Teoria e Prática na Administração Pública e na participação no Seminário: 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 49º Reunião Anual de Pavimentação (RAPV), realizados nos dias 19 a 22 de agosto, em Aracaju, na qual participaram 9 engenheiros civis desta Secretaria. E ainda, em 168 horas de Consultoria/Implementação/Capacitação/Mentoria do software de Business Intelligence (BI).

1 - Cursos da Escola de Governo	Quantidade
Processo Disciplinar	5
Curso a distância: Ética e serviço público	3
Curso a distância: Transparência, ética e controle social	2
Curso a distância: Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa	2
Curso a distância: Redação oficial - Turma 1	2
Lei Complementar nº 840/2011	1
Curso a distância: Gestão de projetos	2
Tomada de Contas Especial - Módulo I	2
Sistema de Controle de Emendas Parlamentares (SISCONEP)	1
Técnicas de organização e condução de reunião	1
Curso a distância: Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - Módulo Usar	10
Programa de formação em ouvidoria - Módulo: Qualidade da Resposta de Ouvidoria	1
Administração orçamentária, financeira, patrimonial e contábil - Módulo I	1
Acompanhamento e fiscalização da execução de contratos - Módulo III	1
Programa de Formação em Ouvidoria Módulo: Painel de Ouvidoria	1
Instrução processual de aposentadoria	1
Programa de Desenvolvimento de Líderes Públicos do Governo do Distrito Federal	4
Elaboração de projeto básico para contratação direta de cursos	1
Nova Lei de Licitações nº 14.133	15
Mapeamento de processos	3
Gestão de riscos	2
Tomada de Contas Especial	5
Sindicância administrativa	5
Total 1	71
2 - Outras Instituições	6
Gestão de Riscos no Setor Público - ENAP	1
Introdução ao Orçamento Público - ENAP	2
Nova Lei de Licitações - ENAP	2
Licitações e Contratos - ABED	1
Total 2	6
3 - Outros Cursos	
FD-REINF/E-SOCIAL X DCTF WEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS – Teoria e prática na Administração Pública	5
Seminário: 26º ENACOR e 49º RAPV – Encontro Nacional de Pavimentação	9
Consultoria/Implementação/Capacitação/Mentoria do software de Business Intelligence (BI)	168 horas
Total 3	14
<b>TOTAL (1 + 2+ 3)</b>	<b>91</b>

- **Programação Orçamentária Não Executada**

**Ação/Subtítulo 3903.0002** - Reforma de Prédios e Próprios - Distrito Federal: Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.

**Ação/Subtítulo 2396.5292** - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas do Distrito Federal: Como informado no exercício anterior, os serviços de conservação necessários são realizados, prioritariamente, pela equipe integrante da Gerência de Manutenção Predial desta Secretaria ou, conforme situação específica, em conjunto com profissionais disponibilizados pela Novacap. Este procedimento, também ocorrido em 2024, tem evitado o dispêndio de recursos para efetivar as manutenções.

### 3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Realizações extraordinárias.

#### A - CONVÊNIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES

##### A.1 CONVÊNIOS

###### 1. Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap

Esta Secretaria deu continuidade na gestão administrativo-financeira dos Convênios pactuados com a Terracap, tendo realizado reuniões periódicas para tratar os assuntos mais relevantes decorrente da execução das obras previstas nesses instrumentos, visando dar andamento às demandas que surgiram ao longo do ano de 2024.

Estes Convênios são imprescindíveis para custear as despesas decorrentes de medições, reajustamentos e materiais betuminosos, de forma rotineira e mensal, gerando um acompanhamento dos dados consolidados por convênio, o que torna o fluxo dos processos mais céleres dentro de uma metodologia pré-estabelecida.

No exercício de 2024, finalizaram-se os Convênios de nº 59/2019 – Rota de Segurança; o de nº 36/2020 – W3 Sul e o de nº 90/2016 – Lote 3 - Vicente Pires, sendo concedidos os Termos de Recebimentos Definitivos de Obras e as aprovações das Prestações de Contas Finais pela Terracap.

A seguir, apresenta-se no Quadro 01, a situação dos convênios vigentes:

**Quadro 01 - Convênios Terracap - Em execução (vigentes)**

Convênios Terracap e os respectivos desembolsos - Em execução										
Convênio nº	Objeto	Valor Total (R\$)	Tipo de Desembolso	Valor Desembolsado (R\$/Ano)						Vigência/Situaç
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
42/2019	Complementar a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e obras de artes especiais - Lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 - Vicente Pires. Obs.: Convênio reduzido em R\$ 49.103.879,95, passando do montante de R\$ 152.221.902,05 para R\$ 103.118.022,10.	103.118.022,10	Medições (Valor Original)	8.122.247,16	3.572.131,22	1.349.585,25	0,00	4.260.821,92	11.212.883,98	Vigência: 31/12/2026
			Reajustamentos de Medições	5.426.315,65	10.570.113,52	7.154.019,38	5.889.092,47	4.163.104,80	709.434,38	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	2.138.351,81	3.039.723,11	1.607.509,10	567.875,68	0,0	
			<b>Subtotal</b>	<b>13.548.562,81</b>	<b>16.280.596,55</b>	<b>11.543.327,74</b>	<b>7.496.601,57</b>	<b>8.991.802,40</b>	<b>11.922.318,36</b>	
41/2020	Complementar a execução de serviços de pavimentação de drenagem / urbanização - Lotes 01, 02, 03, 04 e 05, no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no DF.	20.275.970,37	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	1.048.837,80	844.278,18	2.279.994,47	449.685,39	Vigência: 31/12/2026
			Reajustamentos de Medições	0,00	65.091,21	200.469,81	132.579,61	782.377,78	10.740,89	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	57.606,05	0,00	0,0	
			<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>65.091,21</b>	<b>1.249.307,61</b>	<b>1.034.463,84</b>	<b>3.062.372,25</b>	<b>460.426,28</b>	
25/2022	Execução das obras de implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul.	30.047.744,74	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	0,00	1.871.319,44	6.680.442,26	10.646.834,77	Vigência: 30/09/2025
			Reajustamentos de Medições	0,00	0,00	0,00	0,00	513.063,23	184.058,06	
			* Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.319,44</b>	<b>7.193.505,49</b>	<b>10.830.892,83</b>	
<b>Total (R\$)</b>		<b>153.441.737,21</b>	<b>Total</b>	<b>13.548.562,81</b>	<b>16.345.687,76</b>	<b>12.792.635,35</b>	<b>10.402.384,85</b>	<b>19.247.680,14</b>	<b>23.213.637,47</b>	
				<b>95.550.588,38</b>						

**A.2 CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES - ATIVIDADES E RESULTADOS REFERENTES ÀS EXECUÇÕES**

**1. CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS**

**1.1. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)**

**1.1.1. PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades - EIXO OESTE**

Assim como no exercício de 2023, em 2024 houve a necessidade do aumento dos valores e das quantidades de intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, tendo em vista que o Contrato de Financiamento precisou ser aditivado financeiramente, passando de R\$ 544,6 milhões de financiamento e R\$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF para o valor total de R\$ 623.411.343,00, sendo R\$ 517.477.350,00 de financiamento e R\$ 105.933.993,00 o valor de contrapartida do GDF, repactuado no ano de 2024.

Cabe ressaltar, que, o aporte de contrapartida, poderá ser superior ao montante atual repactuado, tendo em vista o aumento dos custos das obras públicas nos últimos anos.

No tocante à implantação do Corredor Eixo Oeste, realizou-se diversas reuniões de ponto de controle com a Caixa Econômica Federal, com a Comissão de Acompanhamento das Obras do Contrato nº 20/2021 (CAOC), com executores desta pasta e órgãos do GDF, objetivando uma boa execução das ações que impactam na evolução do Programa.

Em 2024, foi assinado novo contrato referente às obras remanescentes do T15, cujo objeto é a execução de infraestrutura urbana de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul – TAS.

Cumpre destacar, que ao longo de 2024 ocorreu a finalização e entrega de duas obras complementares do Túnel de Taguatinga, quais sejam: calçadas do Túnel e o Reservatório de detenção do Túnel.

Nesse contexto, vale ressaltar que o Eixo Oeste manteve a trajetória de avanço nas obras e serviços com execução financeira e evolução de aproximadamente 12% no exercício de 2024.

O Quadro 02, abaixo, demonstra as obras e serviços custeados pelo contrato de financiamento e as respectivas atividades realizadas no ano de 2024 e seus resultados.

**Quadro 02 - Eixo Oeste**

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste									
Obra	Valor disponibilizado		Ações realizadas em 2024	Status 31/12/2024	Execução Financeira acumulada (%)				
	Caixa (R\$)	GDF (R\$)			2020	2021	2022	2023	2024
1. Viaduto de interseção da ESPM, via W3 Sul - Contrato nº 34/2013	1.357.418,27	13.195.854,00	-	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%
2. Via de ligação Av. Hélio Prates/Sol Nascente (T1) - Contrato nº 22/2016	2.700.570,36	729.791,00	-	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%

3. Alargamento do viaduto da EPCT/EPTG (T10) – Contrato nº 1/2017	3.012.500,58	1.472.828,00	-	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%
4. Bacia do Parque da Cidade – Contrato nº 3/2021	2.871.168,49	0,00	-	Obra finalizada	0%	54%	100%	100%	100%
5. Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar - ESPM, até o terminal da Asa Sul (TAS) - T15 – Contrato nº 9/2020	10.848.362,00	0,00	-	Contrato parcialmente executado, restando rescindido, obra remanescente, em execução, mediante nova contratação.	3%	35%	78%	78%	78%
6. Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga – Contrato nº 4/2016	210.674.972,00	0,00	-	Obra finalizada	8%	44%	72%	100%	100%
7. Energia redundante do Túnel – Contrato nº 13/2023	1.940.467,00	0,00	-	Serviços finalizados	0%	0%	0%	100%	100%
8. Alambrados do Túnel – Contrato nº 22/2023	122.558,00	0,00	-	Serviços finalizados	0%	0%	0%	100%	100%
9. Tela antiofuscante do Túnel – Contrato nº 7/2023	475.944,00	0,00	-	Serviços finalizados	0%	0%	0%	100%	100%
10. Calçadas Boulevard do Túnel - Contrato nº 18/2023	3.604.155,00	0,00	Execução de Obra	Obra finalizada	0%	0%	0%	36%	100%
11. Reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel – Contrato nº 24/2023	3.075.877	0,00	Continuidade e conclusão de obras	Obra finalizada	0%	0%	0%	0%	100%
12. Viaduto da EPIG – Contrato nº 20/2021	33.372.636,00	0,00	-	Obra finalizada	0%	9%	40%	100%	100%
13. Av. Hélio Prates - Etapa 1 – Contrato nº 14/2021	15.229.434,00	0,00	-	Obra finalizada	0%	16%	73%	100%	100%
14. Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM (T16) – Contrato nº 22/2021	70.946.449,00	7.068.592,00	Continuidade das obras	Obra em andamento - 40ª medição	0%	0,25%	19%	61%	70%
15. Drenagem em Taguatinga - Lote 1 - Contrato nº 3/2022	1.189.370,00	0,00	Continuidade dos serviços	Projeto Executivo em andamento – 5ª medição	0%	0%	58%	79%	89%
16. Drenagem em Taguatinga - Lote 2 - Contrato nº 4/2022	1.587.905,00	0,00	Continuidade dos serviços	Projeto Executivo em andamento – 6ª medição	0%	0%	49%	76%	90%
17. Av. Hélio Prates - Etapas 2 - Contrato nº 9/2022	22.870.799,00	27.000.000,00	Execução de Obra	Obra em andamento - 20ª medição	0%	0%	12%	47%	55%
18. Readequação da Via EPIG - Contrato nº 21/2022	118.495.336,56	38.489.236,00	Continuidade das obras	Obra em andamento - 21ª medição	0%	0%	0%	8%	33%
19. Av. Hélio Prates - Etapa 3	10.031.373,35	17.977.692,00	Em fase de Projeto Executivo	Em atualização de projetos e orçamento	0%	0%	0%	0%	0%
20. Av. Samdu e da Av. Comercial (Taguatinga)	3.070.056,44	0,0	Em fase de atualizações dos projetos	Em atualização de projetos e orçamento	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Total Financeiro</b>	<b>517.477.350,10</b>	<b>105.933.993,00</b>	<b>% Total da Execução Financeira</b>		<b>9%</b>	<b>24%</b>	<b>39%</b>	<b>66%</b>	<b>71%</b>
<b>Caixa + GDF</b>	<b>623.411.343,00</b>								

### 1.1.2. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas

Em seguimento às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações de crédito contratadas no ano de 2014 a SODF, em 2024, atuou na esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Vicente Pires e de Bernardo Sayão.

Torna-se necessário reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses financiamentos, decorrente da dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados obtidos no ano de 2024, foram satisfatórios. Os contratos de financiamentos abrangidos por este programa são identificados a seguir.

### 1.1.3. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.836-22/14

Os desembolsos realizados no exercício de 2024, vinculados a esta operação de crédito referente às obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e Obras de Artes Especiais em Vicente Pires, constam no Quadro 03, que também apresenta os valores que restaram atribuídos às obras e serviços contratados:

**Quadro 03 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R\$)**

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Vicente Pires									
Lote	Contrato	Valor disponibilizado		Atividades Realizadas	Execução Financeira Acumulada (%)				
		Caixa (R\$)	GDF (R\$)		Até 2024	2020	2021	2022	2023
1	8/2015	40.345.611,41	8.747.071,33	Obra finalizada	59%	60%	60%	60%	100%
2	9/2015	744.346,41	161.376,93	Obra finalizada	30%	100%	100%	100%	100%
2	14/2020	219.802,48	47.653,95	Serviço técnico finalizado	100%	100%	100%	100%	100%
3	10/2015	18.113.223,25	3.927.010,90	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%
4	8/2016	31.505.662,94	6.830.539,22	Obra finalizada	72%	100%	100%	100%	100%
5	19/2016	38.408.297,26	8.327.054,78	Obra finalizada	53%	66%	66%	85%	100%
6	4/2015	16.693.440,28	3.619.196,93	Obra finalizada	57%	100%	100%	100%	100%
7	7/2015	27.636.376,93	5.991.664,32	Obra finalizada	52%	52%	52%	52%	100%
8	3/2018	10.150.979,94	2.200.768,37	Obra finalizada	84%	100%	100%	100%	100%
9	20/2016	33.853.211,54	7.339.496,07	Obra finalizada	77%	100%	100%	100%	100%
10	21/2016	60.280.302,84	13.068.982,98	Obra finalizada	69%	76%	81%	84%	85%
11	6/2016	16.674.422,95	3.615.073,90	Obra finalizada	44%	49%	95%	99%	99%
12	19/2021	29.298.982,74	6.352.123,15	Obra em andamento	0%	8%	51%	76%	78%
OAE 3	14/2023	18.814.989,62	4.079.156,34	Obra paralisada	0%	0%	0%	1%	4%
Intitulado lote 2	29/2023	48.373.349,15	10.487.513,29	Obra em andamento	-	-	-	0%	0%
M	Intervenções remanescentes	6.848.364,06	1.484.749,57	A Licitar	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>397.961.363,79</b>	<b>86.279.432,04</b>	<b>% Total da Execução Financiamento</b>	<b>60%</b>	<b>64%</b>	<b>67%</b>	<b>72%</b>	<b>76%</b>

Observa-se no quadro acima, que o Programa obteve desembolso financeiro acumulado de aproximadamente 76%, o que em valores representa R\$ 369.624.348,95.

Destaca-se, em execução, as obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo pavimentação asfáltica, rotatórias, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e implantação de uma galeria subterrânea, em Tunnel Liner (remanescente, denominado lote 12), com previsão de término no primeiro semestre de 2025. No que se refere à intervenção relativa à Obra de Arte Especial 3, esta se encontra em fase de discussão de projeto.

Quanto à Obra de Arte Especial 01, devido à necessidade de atualização de projetos, o certame e o início das obras estão previstos para o ano de 2025. Esta intervenção será custeada com os recursos relativos ao denominado item M, especificado no Quadro 03.

#### 1.1.4. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (CF) nº 0399.840-83/14

A operação de crédito em tela prevê investimento no valor total de R\$ 69.152.875,78, sendo o valor de R\$ 47.622.498,29, previstos no financiamento (FGTS) e R\$ 21.530.377,49 correspondentes ao aporte de Contrapartida a cargo do Distrito Federal.

Há que se salientar o Convênio nº 041/2020 firmado com a Terracap, no valor R\$ 20.275.970,37, fundamental para assegurar os desembolsos financeiros por parte da Caixa.

Em relação aos Lotes: 2, 3 e 5 (bacias), houve a entrega e conclusão das obras. No que se refere ao Lote 5 (infraestrutura), ainda se encontra em fase de atualização de projetos para posterior licitação.

Segue abaixo o Quadro 04, que demonstra os dados atuais referentes a esta operação de crédito:

**Quadro 04 - Bernardo Sayão (Valores em R\$)**

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão									
Lote	Contrato	Valor disponibilizado		Atividades Realizadas em 2024	Execução Financeira Acumulada (%)				
		Caixa (R\$)	GDF (R\$)		2020	2021	2022	2023	2024
1	5/2023	12.340.714,07	5.579.300,58	Obra paralisada	0%	0%	0%	1%	1%
2	1/2018	2.619.799,96	1.184.425,10	Obra finalizada (2021)	48%	100%	100%	100%	100%
3	4/2017	5.445.558,10	2.461.964,95	Obra finalizada (2021)	50%	99%	99%	100%	100%
4	1/2023	16.744.679,17	7.570.355,96	Obra atrasada	1%	1%	1%	2%	20%
5	Obras de Infraestrutura (Bacias) - Contrato nº 6/2022	6.601.425,13	2.984.538,41	Aguardando nova licitação	0%	0%	0%	0%	0%
5		3.870.321,85	1.749.792,50	Obra finalizada (2023)	0%	0%	40%	100%	100%
<b>Total</b>		<b>47.622.498,28</b>	<b>21.530.377,50</b>	<b>% Total da Execução Financiamento</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>37%</b>

Em relação ao Quadro 04, projeta-se para o ano de 2025 aumento dos desembolsos do Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014, bem como do Convênio nº 41/2020 com a Terracap.

#### 1.2. Pró-Moradia I - Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006

Como mencionado em relatórios anteriores, esta operação de crédito, assinada em 2006 e executada em anos anteriores a 2023, integra o denominado Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de equipamentos públicos comunitários e execução de Trabalho Técnico Social - TTS, em diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, tendo a Caixa como agente financeiro. Conforme manifestado, por ocasião do encerramento de diversos exercícios, ainda restam itens em aberto e sem comprovação de funcionalidade perante o órgão financiador, devido às dificuldades de finalização das metas das obras à época contratadas.

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2024, providências envidadas objetivando a retomada do referido Contrato, sendo realizadas diversas reuniões de ponto de controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas e, com isso o cronograma de ações para o término das obras foi atualizado. Dessa forma, na Tabela 01, seguem especificadas as metas que a Caixa considera em aberto:

**Tabela 01 - Itens em Aberto (Valores em R\$)**

Detalhamento dos Itens	Região	Valor Contratado	Valor Desembolsado até 2024	Saldo
Drenagem / Pavimentação	Arapoanga - Planaltina	225.855.764,54	203.162.035,33	22.693.729,21
	Mestre D'armas - Planaltina			
	Vila Vicentina Planaltina			

Em relação às metas de obras em aberto, conforme a tabela 1 acima, cabe salientar que houve a conclusão dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D'armas, por meio do Contrato nº 21/2021. Em 2024 os referidos projetos foram encaminhados à Caixa Econômica Federal para análise técnica de engenharia, sendo contratadas pendências, submetidas às áreas competentes desta Secretaria para conhecimento e providências necessárias.

Em relação às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social das regiões de Águas Claras, Arapoanga, Brazlândia, Ceilândia, Itapoã (Norte e Sul), Mestre D'Armas, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Vale do Amanhecer e Vila Vicentina, estas ainda se encontram em fase de negociação com a Caixa e o Ministério, e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação em 2025, entretanto, ainda, existem problemas fundiários, a cargo da Codhab, Sedhu e PGDF que impedem o avanço de obras na região.

Torna-se importante evidenciar, também, que em outubro de 2024, a Caixa formalizou notificação ao Governo do Distrito Federal acerca do encerramento do Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006 - Pró-Moradia, mediante o vencimento antecipado da dívida, conforme os termos do Ofício nº 92/2024/G1GOV/BR (155164425), cuja cópia se encontra acostada no âmbito do Processo nº 00110-00001815/2024-54.

No final do exercício de 2024 procedeu-se agendamento de reuniões técnicas a serem realizadas no início de 2025, com a participação de equipes do GDF e da Caixa, no intuito de possibilitar a continuidade de tratativas objetivando a adoção da melhor alternativa possível a ser envidada.

#### 1.3. Pró-Moradia II

O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente Financeiro. Tem por objetivos principais a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, construção de unidades habitacionais e a execução de Trabalho Técnico Social - TTS, nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina - DF. Constam a seguir descritas as atividades essenciais e os desembolsos ocorridos em 2024 dos respectivos programas.

##### 1.3.1. Pró-Moradia II - Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009

As intervenções previstas no Programa Pró-Moradia no Setor Habitacional Sol Nascente, envolvem recursos a serem aplicados nos Trechos 1, 2 e 3. O Contrato de financiamento, celebrado em 2009 junto à Caixa Econômica Federal (Caixa), perfaz o valor total atualizado, até 2024, de R\$ 363.399.515,00, sendo R\$ 208.960.870,00 de financiamento (FGTS) e R\$ 154.738.645,00 de contrapartida (GDF). Importante ressaltar que o Governador do Distrito Federal, no exercício de 2024, assinou nova Declaração de Contrapartida ao Contrato, com valor excedente, assegurando o aporte orçamentário adequado para a continuidade da execução desta operação de crédito.

Ao longo do ano de 2024, assim como em anos anteriores, foram realizadas gestões com a Caixa, agente financiador da operação de crédito, por meio de reuniões de ponto de controle com a participação de órgãos governamentais que participam da execução das metas do contrato de financiamento, tendo ocorrido também reuniões internas de governo com as equipes técnicas da SODF, Terracap, SEEC/SUCAP, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa Civil, DF Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, objetivando: o recebimento das metas de Unidades Habitacionais por parte da Codhab, de acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes.

Desta forma, no que tange à meta de infraestrutura urbana, no ano de 2024 ocorreu considerável evolução na execução dos contratos de infraestrutura referentes às obras remanescentes, quais sejam: Contrato nº 17/2022 (Trecho 1 e parte do Trecho 3), Contrato nº 22/2023 (Remanescentes no Lote 1 e Trecho 3) e Contrato nº 23/2023 (Trecho 3 - Lote 2).

Em relação à meta de construção de Unidades Habitacionais (UHs), de responsabilidade da Codhab, o contrato que prevê a construção de 420 UHs teve aditivos e dilação de prazos de execução, com previsão de encerramento em maio de 2025. Assim, não há diligências que impeçam os desembolsos de recursos para as obras relativas às Unidades Habitacionais, bem como para a continuidade dos serviços de Trabalhos Técnicos Sociais (TTS).

Por fim, considerando as situações das intervenções e serviços sob a gestão da SODF e da Codhab, constatam-se em 2024 avanços positivos na execução financeira dos

contratos, que resultaram em aumento de 18% em relação à execução obtida no exercício anterior.

O Quadro 05 a seguir contempla o panorama de execução em 2024 e outros exercícios:

**Quadro 05 - Setor Sol Nascente**

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Sol Nascente									
Obra/Meta	Valor Disponibilizado		Ações realizadas em 2024	Estágio Dezembro/2024	Execução Financeira - Acumulada (%)				
	Caixa (R\$)	GDF (R\$)			2020	2021	2022	2023	2024
1 - Trecho 1 - Contrato nº 015/2014	18.267.588,00	31.204.344,00	-	Emitido o recebimento definitivo das obras	84%	84%	84%	84%	84%
2 - Trecho 2 - Contrato nº 002/2015	30.956.023,00	25.979.423,00	-	Emitido o recebimento definitivo das obras	58%	58%	58%	58%	58%
3 - Trecho 3 - Contrato nº 003/2015	12.592.469,00	8.216.096,00	-	Emitido o recebimento definitivo das obras	32%	32%	32%	32%	32%
4 - Projetos Executivos (Lotes 1 - Contrato nº 015/2020 e Lote 2 - Contrato nº 016/2020)	1.285.998,70	723.374,00	-	Projeto executivo finalizado	0%	94%	100%	100%	100%
5.0 - Remanescente do Trecho 2 - Contrato nº 15/2021	10.503.219,00	1326.436,00	-	Obra finalizada	0%	44%	67%	100%	100%
5.1 - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - Contrato nº 17/2022	4.039.902,00	45.725.325,00	Execução de obra	Obra em andamento	0%	0%	2%	16%	35%
5.2 - Trecho 3 - Lote 1 - Contrato nº 22/2022	19.212.240,00	60.046.321,00	Execução de obra	Obra em andamento	0%	0%	1,8%	34%	78%
5.3 - Trecho 3 - Lote 2 - Contrato nº 23/2022	11.024.956,00	53.146.923,00	Execução de obra	Obra em andamento	0%	0%	0,65%	13%	80%
6.0 - Construção de 678 Unidades Habitacionais - UH	43.130.170,00	11.658.176	Meta executada pela Codhab	Concluídas - 678 UHS	76%	82%	100%	100%	100%
6.1 - Construção de 420 Unidades Habitacionais - UH	54.776.605,00	35.654.827,00	Meta executada pela Codhab	Contrato de 420 UHS em execução	0%	0%	0%	54%	78%
7 - Trabalho Técnico Social TTS - Contrato nº 17/2022	3.171.699,00	2.052.323,00	Meta executada pela Codhab	Em licitação pela Codhab	0%	0%	0%	31%	76%
<b>Total Investimento</b>	<b>208.960.870,00</b>	<b>275.733.569,00</b>	<b>% Total da Execução Financeira</b>		<b>41%</b>	<b>44%</b>	<b>46%</b>	<b>62%</b>	<b>80%</b>
<b>Total FIN+GDF</b>	<b>484.694.439,00</b>								

**1.3.2. Pró-Moradia II - Mestre D'Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.232-26/2009**

As Metas vinculadas a esta operação de crédito tiveram conclusão em 2010, à exceção de alguns trechos, que, por problemas fundiários e ambientais ficaram prejudicados.

A partir de 2021, com a celebração de contratação destinada à revisão e readequação de projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas, foi dado início à efetiva ação de programação de retomada das intervenções que restam incompletas, no que se refere às metas desta operação de crédito, tendo em vista que a contratação formalizada visa complementar os projetos de infraestrutura para a conclusão do empreendimento planejado, possibilitando atendimento às condições urbanísticas e ambientais que irão promover a regularização definitiva da área, objetivando também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas.

Em 2024, o Contrato nº 21/2021 teve andamento normal, não obstante o setor de projetos tenha relatado dificuldades com relação à morosidade de análise e aprovação dos produtos desenvolvidos por intermédio da referida contratação, havendo expectativa de conclusão dos projetos executivos e de orçamento, no primeiro semestre de 2025, de forma a possibilitar dar início aos procedimentos licitatórios, visando à execução das obras de detenção e reservatório que darão funcionalidade ao objeto definido no Contrato de Financiamento.

Em relação as metas de Regularização Fundiária e de Trabalho Técnico Social da região do Mestre D'Armas, estas se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério, e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação em 2025, cabendo registrar, que a regularização fundiária é condição fundamental para o avanço das obras previstas. Os responsáveis principais, atuantes no processo de regularização são a Codhab, a Sedhu e a PGDF.

**1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009**

Assim como mencionado em relatórios anteriores, em relação a esta contratação, destaca-se que a tratativa envidada em 2020, formalizada com a GIGOV/Caixa, por meio do Ofício nº 1574 - SODF/GAB/ASSESP, que pleiteava o encerramento das metas ainda não realizadas e o respectivo encerramento contratual, restou indeferida, tendo em vista que em 2021 houve pronunciamento da GIGOV/Caixa, indicando como obrigatória a realização da meta referente ao Trabalho Técnico Social - TTS.

Esta Secretaria realizou as devidas tratativas com as equipes da Codhab e da SUCAP/SEEC mediante instruções no âmbito do processo nº 00110-00002448/2021-17, em que solicita ações para a verificação da viabilidade na realização do TTS na região.

Cabe ressaltar, também, que em outubro de 2024, a Caixa formalizou notificação ao Governo do Distrito Federal acerca do encerramento do Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009 - Pró-Moradia, mediante o vencimento antecipado da dívida, conforme os termos do Ofício nº 96/2024/GIGOV/BR (155164569), cuja cópia se encontra acostada no âmbito do Processo nº 00110-00001815/2024-54.

No final do exercício de 2024 procedeu-se agendamento de reuniões técnicas a serem realizadas no início de 2025, com a participação de equipes do GDF e da Caixa, no intuito de possibilitar a continuidade de tratativas objetivando a adoção da melhor alternativa possível a ser envidada.

**2. Contratos de Repasse - Emendas Parlamentares Federais (Orçamento Geral da União - OGU)**

Em 2024 manteve-se a atuação na gestão de contratos de repasses firmados a partir de recursos financeiros provenientes de Emendas Parlamentares Federais consignadas no Orçamento Geral da União - OGU, procedendo-se à devida operação no atual Sistema "Transferegov.br".

No Quadro 06, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse e as principais informações desses instrumentos:

Contratos de Repasse - OGU (Valores em R\$)					
Item	Contrato de Repasse nº	Fase do Contrato	Objeto	Status e Andamento em 2024	Valor Previsto no Contrato de Repasse (R\$)

1	973.504/2024	Cláusula Suspensiva	Implantação de Espaço para Lazer Urbano no DF - (PEC'S).	Proposta aprovada e contrato de repasse assinado, aguardando publicação do extrato no Diário Oficial da União	2.393.677,00
2	939.758/2022	Em Licitação	Pavimentação no DF - Etapa 1 da EPPN (DF-009).	1. Os recursos serão utilizados para a restauração/recuperação de pavimento em trecho da Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte (Etapa 1 - Segmentos 1, 2 e 13). 2. Em 12/7/2024 foi concluída a análise da documentação técnica pela Caixa, sendo emitido Laudo de Análise do Empreendimento - LAE e o Aceite Licitatório. 3. Processo licitatório em andamento (00110-00002400/2024-51).	3.782.788,32
3	922.919/2021	Em execução	Pavimentação no DF - Etapa 2 da EPPN (DF-009).	1. Os recursos serão utilizados para a restauração/recuperação de pavimento em trecho da Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte (Etapa 2 - Segmentos 3 e 12). 2. Em 15/3/2024 foi concluída a análise da documentação técnica pela Caixa, sendo emitido o Laudo de Análise do Empreendimento - LAE e o Aceite Licitatório. 3. Em 18/10/2024 foi concluída a licitação, o que possibilitou a formalização do Contrato nº 9/2024, que obteve a autorização de início das obras pela Caixa em 28/11/2024.	2.955.136,23
4	922.411/2021	Em Licitação	Pavimentação no DF - Etapa 3 da EPPN (DF-009).	1. Os recursos serão utilizados para a recuperação de pavimento da Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF (Etapa 3 - Segmentos 3b e 4). 2. Em 25/10/2024 foi enviada à Caixa a documentação técnica (projeto, orçamento e titularidade), com vistas à análise e aprovação, visando à retirada de Cláusula Suspensiva, sendo emitido pela Caixa, em 29/11/2024, o Laudo de Análise do Empreendimento - LAE e Aceite Licitatório, estando em trâmites a assinatura de Termo Aditivo de alteração do valor de contrapartida, para início do certame.	4.050.096,34
5	922.902/2021	Em Licitação	Pavimentação no DF - Etapa 4 da EPPN (DF-009).	1. Os recursos serão utilizados para a restauração/recuperação de pavimento em trecho da Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte (Etapa 4 - Segmentos 10 e 11). 2. Em 30/10/2024 foi enviada à Caixa a documentação técnica (projeto, orçamento e titularidade), com vistas à análise e aprovação, visando à retirada de Cláusula Suspensiva, sendo emitido pela Caixa, em 28/11/2024, o Laudo de Análise do Empreendimento - LAE e Aceite Licitatório, estando em trâmites a assinatura de Termo Aditivo de alteração do valor de contrapartida, para início do certame.	3.238.258,06
6	906.560/2020	Em execução	Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante.	Obra em execução por intermédio do Contrato nº 23/2023, estando consolidadas no Quadro 6a, as informações detalhadas acerca da situação dos desembolsos do contrato de repasse.	12.051.297,18
7	903.915/2020	Cláusula Suspensiva	Construção da Primeira Etapa do Museu da Bíblia.	1. Em 14/10/2024 a Secretaria de Cultura do DF, realizou a homologação do Resultado Final do Concurso Público Nacional de Projeto Legal de Arquitetura do Museu da Bíblia, que indica a classificação de dois projetos, conforme publicação no DODF de 15/10/2024. 2. Em 14/11/2024 a Secretaria de Cultura do DF, apresentou a SODF documentação do projeto escolhido, por meio de Parecer SEI-GDF N.º 3/2024 - SECEC/SUPAC (156227712) e Ofício N.º 2182/2024 - SECEC/GAB (156228404). 3. Visando cumprir o prazo de entrega da documentação técnica para retirada de Cláusula Suspensiva, e objetivando dar celeridade nos ritos necessários para a execução do objeto pactuado, houve definição em reunião realizada com representantes da SECEC, SODF, SEDUH, SERINS e SEGOV, que esta SODF realizasse a avaliação do projeto, com vistas à elaboração de instrução técnica para a realização de licitação na modalidade de contratação integrada (antigo RDCI). 4. Em 29/11/2024 foi concluída a elaboração da documentação destinada à Contratação Integrada e submetida à Caixa, estando tais elementos técnicos em fase de análise para obtenção de aprovação, de forma a dar cumprimento à Cláusula Suspensiva. 5. Ressalta-se a prorrogação do prazo de cumprimento de Cláusula Suspensiva do contrato de repasse até a data de 30/10/2025, conforme a Carta Reversal N.º 097/2024/GIGOV/BR (158397226).	14.291.250,00
<b>Total (R\$)</b>					<b>42.762.503,13</b>

O Quadro 6a, abaixo, apresenta as informações dos contratos de repasse com objetos em execução:

Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Nº do Contrato de Obra	Repasse (R\$)	Valor (R\$)		Saldo Contratual	Avanço Financeiro
					Contratado	Pago		
906.560/2020	Em execução	Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante	23/2023	12.051.297,18	10.127.299,57	4.825.144,97	5.302.154,60	47,64%
922.919/2021	Em execução	Pavimentação no Distrito Federal (restauração/recuperação de pavimento em trecho na Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte (Etapa 2 - Segmentos 3 e 12).	9/2024	2.955.136,23	2.279.999,11	0,00	2.279.999,11	0,00%

Conforme os dados dos Quadros 6 e 6a, acima, constata-se sete Contratos de Repasse provenientes de Emendas Parlamentares consignadas no Orçamento Geral da



União, sob a gestão desta SODF, cujo montante equivale a R\$ 42.762.503,13.

Salienta-se que, não obstante todos os esforços envidados por esta Pasta, a ausência de uma denominada "prateleira" de projetos de engenharia compatível com os objetos das emendas parlamentares tem limitado a capacidade de formalização de novos contratos de repasse por esta Secretaria, tornando-se necessário reiterar, também, as dificuldades, a seguir relacionadas, decorrentes, em geral, da não observância de determinados fatores antes da definição dos objetos das emendas parlamentares, que impactam em avanços na captação e na execução dos contratos de repasse celebrados:

- Apesar dos constantes alertas aos órgãos superiores centrais (Serins/GDF), esta Secretaria continua a receber recursos subdimensionados para a execução dos projetos propostos e projetos inexequíveis, pertinentes à classificação funcional programática disponibilizada;
- Implantação de novo módulo no Sistema "Transferegov.br" que requer a inserção manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade e retrabalho;
- Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para investimentos em obras públicas, cujos normativos restritivos não abrangem e/ou não são capazes de sintetizar a realidade da necessidade de execução de obras públicas para o Distrito Federal, quando em conjunção com os baixos valores de investimentos disponibilizados por parlamentares deste ente federativo;
- Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação em nível federal e, na adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União no DF, não obstante haver demandas com potencial de atendimento mediante esses recursos;
- Morosidade na liberação de recursos financeiros com o Ministério concedente, para o pagamento das medições vinculadas aos contratos de repasse em execução.

Apesar das adversidades encontradas, destaca-se, que no exercício de 2024, esta SODF, por meio de sua área técnica, realizou o cumprimento de cláusula suspensivas em 4 contratos de repasse, bem com o cadastro de 21 projetos para captação de recursos no âmbito do Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, sendo: 19 projetos incluídos no Caderno de Sugestões de Emendas Federais para o ano de 2025 e, ainda, 7 projetos para captação de recursos no Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares – SISCAP, dos quais 6 foram inseridos no Caderno de Sugestões Emendas Distritais 2024, para a captação de recursos a ser incluída na LOA 2025.

### 3. Modelo de Governança e Gestão – Gestaopublica.gov.br, Instrumento de Maturidade da Gestão – IMG 100 pontos

O Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr, foi substituído em 2023 pelo Modelo de Governança e Gestão Pública – Gestaopublicagov.br, que objetiva tornar-se o modelo referencial para a avaliação e aprimoramento da governança e gestão dos órgãos e entidades que operacionalizam as transferências e parcerias da União mediante a Plataforma Transferegov.br.

Nesse sentido, o setor de gerenciamento de recursos externos, coordenou, em conjunto com o Gabinete/SODF, as atividades relacionadas à implantação do IMGG 100 PONTOS, Instrumento de Maturidade de Gestão no ambiente do Sistema do Modelo de Governança e Gestão.

Com relação às atividades pertinentes à implantação do IMGG 100 PONTOS, em 2024 o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos conferiu a esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal o nível da maturidade da governança e da gestão categoria Bronze 3, pontuação de 54,08, consistindo da segunda melhor certificação, o que indica avanço no aperfeiçoamento das ações deste Órgão quanto à gestão dos recursos externos.

### 4. Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER

Assim como exposto em relatórios anteriores, o Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, desenvolvido pela Subsecretaria de Captação de Recursos, em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento, foi instituído pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por intermédio da Portaria nº 05, de 11 de janeiro de 2021.

O Banco de Projetos é um módulo do SIGER com a finalidade de cadastramento de projetos que demonstrem a maturidade e a viabilidade de execução por parte dos órgãos, notadamente dos projetos que apresentem maiores chances de serem executados pelos Órgãos do DF, quer seja mediante recursos de Operações de Créditos, (Caderno de Operações), de recursos provenientes de Transferências Voluntárias – União (Caderno de Emendas) ou de recursos abertos (onerosos e não onerosos).

Em 2024 o setor de gerenciamento de recursos externos coordenou as ações para o preenchimento das informações solicitadas nas Fichas de Projetos de interesse da SODF, que superam o valor de R\$ 294.089.858,55, distribuídos nas seguintes obras públicas:

Item	Obras/Serviços propostos pela SODF, inseridos no Banco de Projetos	Valor (R\$)
1	Execução de Obra de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Mestre D'armas Lotes 01 e 02.	43.297.158,55
2	Contratação de consultoria especializada para apoiar na revisão, complementação e atualização do PDSB e do PDGIRS.	10.010.000,00
3	Contratação de Empresa para execução de monitoramento de ruídos nas obras de Infraestrutura Urbana.	300.300,00
4	Contratação de Empresa para elaboração de projetos de Infraestrutura de requalificação urbana no Taguacenter - RA de Taguatinga/DF.	2.402.400,00
5	Contratação de empresa para elaboração de projetos de Viaduto localizado, entre a L2 Norte e Via EN3, na Região Administrativa do Plano Piloto-DF.	7.007.000,00
6	Contratação de empresa para elaboração dos projetos das Estações do VLT na W3 Sul e W3 Norte.	500.500,00
7	Contratação de empresa para elaboração de Projetos de Requalificação Urbana nos Setores Hoteleiros Sul e Norte.	5.005.000,00
8	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de Requalificação Urbana no Setor Hospitalar Local Norte.	1.501.500,00
9	Contratação de empresa para elaboração de Projetos de Implantação de Calçadas e Ciclovias nas Quadras 800 e 900 da Asa Sul e Quadras 900 da Asa Norte.	2.002.000,00
10	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto para Implantação de Viaduto na intersecção DF-459 e Avenida Elmo Serejo.	4.004.000,00
11	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos para Implantação de Viaduto na intersecção do Hospital Regional de Samambaia.	4.004.000,00
12	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de Viaduto localizado na Epia entre o SIA e o Cruzeiro.	4.004.000,00
13	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto para reconstrução do Viaduto Guará – EPTG.	4.004.000,00
14	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos para Implantação de 4ª Ponte no Lago Sul.	7.007.000,00
15	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos para Implantação de Infraestrutura Urbana na Região do Morro da Cruz.	13.013.000,00
16	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos para Implantação de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Nova Colina Dorothy Stang.	8.008.000,00
17	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos para Implantação de Rodovia Urbana/Ecológica na DF 140 - Região do Park Way.	2.502.500,00
18	Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos para implantação de Infraestrutura Urbana na QSE/QSF Taguatinga e Duplicação da Via Boca da Mata.	10.510.500,00
19	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de Requalificação Urbana na via W3 Norte.	7.007.000,00
20	Urbanização e regularização de assentamentos precários -Pró Moradia- Obras de infraestrutura no Lote 02/Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente.	58.000.000,00

21	Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros denominado EIXO OESTE - Programa Pró-Transporte - Etapa 3 Hélio Prates.	100.000.000,00
<b>Total (R\$)</b>		<b>294.089.858,55</b>

## 5. Apoio Técnico Para Captação e Execução de Recursos Externos

### 5.1 Operação de Crédito Externa - Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - Infra-DF

Em seguimento às tratativas visando à celebração de Operação de Crédito Externa no valor estimado de US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares americanos) em parceria com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata - Fonplata, que objetiva financiar a execução de obras estratégicas para a população do DF, o fortalecimento institucional desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal e a implantação de um projeto técnico social nas áreas mais carentes da intervenção, constata-se ao longo de 2024, importantes providências que resultaram na efetiva formalização do financiamento pretendido, assinado em 30/12/2024, dentre as quais:

- 1º Semestre - Realização de análise, aprovação, pré-negociação e negociação do contrato de empréstimo entre os órgãos do Distrito Federal e os órgãos do Governo Federal, sendo formalizado na Secretaria do Tesouro Nacional - STN o Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVL).
- No mês de setembro - A Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios da STN emitiu o Parecer SEI Nº 3374/2024/MF favorável ao PVL e condições necessárias à contratação de operação de crédito com o Fonplata, e de pedido de concessão de garantia da União.
- Em outubro - Emitido o Parecer nº 3915/2024/MF pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional favorável ao pleito de contratação da operação de crédito, sendo tal documento enviado ao Ministério da Fazenda, para elaboração de Exposição de Motivos e remessa à Casa Civil. No âmbito do Distrito Federal, esta Secretaria editou a Portaria nº 147, que instituiu a Unidade e Gestão do Programa (UGPINFRA), com o objetivo geral de coordenar e supervisionar a execução do Programa, oriundo da pretensa operação de crédito externo com o Fonplata.
- Em outubro - Emitido o Parecer nº 3915/2024/MF pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional favorável ao pleito de contratação da operação de crédito, sendo tal documento enviado ao Ministério da Fazenda, para elaboração de Exposição de Motivos e remessa à Casa Civil. No âmbito do Distrito Federal, esta Secretaria editou a Portaria nº 147, que instituiu a Unidade e Gestão do Programa (UGPINFRA), com o objetivo geral de coordenar e supervisionar a execução do Programa, oriundo da pretensa operação de crédito externo com o Fonplata.
- Em dezembro de 2024, foi submetida ao Senado Federal a Mensagem nº 1.580, com vistas à obtenção de autorização da contratação da operação de crédito externo em comento, sendo tal matéria apreciada e aprovada na 66ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 10 de dezembro, e, posteriormente aprovada pelo plenário da referida Casa Legislativa, conforme a Resolução nº 41 (publicada em 13/12/2024), que autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito externo, com garantia da União com o Fonplata, no valor de até US\$ 60.000.000,00.
- Em 30/12/2024 foi assinado o Contrato de Empréstimo nº BRA-46/2024.

Portanto, encerra-se o exercício, com a excelente notícia da contratação da operação de crédito, o que representa um avanço significativo para a execução das ações que dependem desses recursos. Para 2025, a expectativa é de que todos os trâmites decorrentes da assinatura do contrato de empréstimo sejam concluídos e que a missão de arranque com o órgão financiador ocorra conforme planejado. Com isso, a meta é iniciar a execução das ações já no primeiro semestre do próximo ano. Isso certamente trará muitos benefícios à população do Distrito Federal.

### 5.2. FUNDURB - Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal

Em 2024, a Secretaria se empenhou em expandir as ações com recursos do FUNDURB, formalizando propostas que visam a revitalização de espaços públicos e a melhoria da infraestrutura urbana. Essas iniciativas foram essenciais não apenas para atender às novas demandas, mas também para apoiar ações já em andamento, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira mais eficaz.

As propostas submetidas ao FUNDURB e suas respectivas Resoluções vigentes constam no Quadro abaixo:

Obra	Resolução Vigente	Valor Acatado Fundurb - R\$	Valor Executado Fundurb - R\$	% 2023	% 2024	Saldo Fundurb - R\$
Praça do Relógio Lote 1	nº 02/2023	4.729.829,64	3.463.124,72	0%	73%	1.266.704,92
Praça do Relógio Lote 2	nº 02/2023	832.003,63	257.921,12	0%	31%	574.082,51
Q. 05 Setor Comercial Sul	nº 03/2023	3.170.936,62	3.170.936,62	99%	100%	-
Readequação Viária da Estrada Parque Indústria Gráficas - EPIG - Etapa 1	nº 01/2024	5.000.000,00	5.000.000,00	0%	100%	-
Praça 21 de abril	nº 02/2024	50.000,00	-	0%	0%	50.000,00
Sol Nascente - Trecho 1 e 3	nº 03/2024	3.000.000,00	2.401.906,94	0%	80%	598.093,06
Readequação Viária da Estrada Parque Indústria Gráficas - EPIG - Etapa 2	nº 06/2024	2.600.000,00	2.600.000,00	0%	100%	-
<b>Total</b>		<b>19.382.769,89</b>	<b>16.893.889,40</b>			<b>2.488.880,49</b>

### 5.3. Contrato de Financiamento nº 22.2.0123.1 - BNDES X GDF

Em 2024, manteve-se apoio técnico aos procedimentos administrativos relacionados aos desembolsos da operação de crédito interno, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES, no valor de R\$ 217.003.108,00, no âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE e do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT assinada em 29/06/2022.

No que se refere a esta Secretaria os recursos provenientes da referida operação de crédito se destinaram à denominada Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, intervenção integrante da implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste, estando a realização financeira especificada no Quadro abaixo:

Obra	Valor acatado BNDES (R\$)	Valores Executados (R\$)	Saldo do Financiamento (R\$)	(%) Execução
Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022	37.972.246,00	22.880.238,82	15.092.007,18	60%

Destaca-se ainda em 2024 a finalização de tratativas para a segunda fase do Contrato de Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES. Há previsão de que esta SODF seja contemplada com recursos na ordem de R\$ 120 milhões. A concretização deste financiamento irá fortalecer a execução de importantes ações, sendo:

- Hélio Prates Etapa 3 - R\$ 100 milhões; e
- Sol Nascente Trecho 3 Lote 2 - R\$ 20 milhões.

### 5.4. Contrato de Financiamento nº 40/00003-6 - Banco do Brasil x GDF (Banco do Brasil 1)

Considerando que esta Secretaria possui intervenções custeadas por recursos oriundos da operação de crédito nacional com o Banco do Brasil - BB, no âmbito do BB Financiamento do Setor Público, procedeu-se à continuidade das ações de apoio técnico relacionado da operação de crédito em tela, firmado pelo Distrito Federal no montante de R\$ 495.000.000,00 (Contrato de Empréstimo nº 40/00003-6).

A participação da SODF é relativa às obras contratadas por esta Pasta, inseridas nessa operação de crédito, que incluem as intervenções integrantes da implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste, conforme a situação de desembolso exposta no Quadro a seguir:

Banco do Brasil - Contrato de Financiamento nº 40/00003-6					
Obra	Valor do Financiamento Inicial (R\$)	Valor do Financiamento Atualizado (R\$)	Valores Executados (R\$)	Saldo do Financiamento (R\$)	Execução (%)
Túnel de Taguatinga - Contrato nº 4/2016	60.000.000,00	56.478.695,01	56.478.695,01	0,00	100%

Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021	23.783.295,33	21.318.247,54	21.318.247,54	0,00	100%
Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM - Contrato nº 22/2021	58.651.583,46	58.651.583,46	57.148.401,90	1.503.181,56	97%
Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 14/2021	13.328.500,00	12.915.057,90	12.915.057,90	0,00	100%
<b>Total (R\$)</b>	<b>155.763.378,79</b>	<b>149.363.583,91</b>	<b>147.860.402,35</b>	<b>1.503.181,56</b>	<b>99%</b>

#### 5.5. Contrato de Financiamento nº 40/00004-4 - Banco do Brasil x GDF (Banco do Brasil 2)

Com a celebração da operação de crédito nacional firmada pelo Distrito Federal com o Banco do Brasil - BB, no âmbito do BB Financiamento do Setor Público no montante de R\$ 505.000.000,00 (Contrato de Empréstimo nº 40/00004-4), esta Secretaria obteve aporte financeiro para a continuidade de importantes intervenções, inseridas no escopo desse financiamento.

Segue abaixo a situação das respectivas obras custeadas a partir de recursos dessa operação de crédito:

Banco do Brasil - Contrato de Financiamento nº40/00004-4					
Obra	Valor do Financiamento Inicial (R\$)	Valor do Financiamento Atualizado (R\$)	Valores Executados (R\$)	Saldo do Financiamento (R\$)	Execução (%)
Implantação e ampliação de sistema de drenagem pluvial do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul	32.000.000,00	32.000.000,00	18.221.757,60	13.778.242,40	57%
Regularização de Núcleo Urbano Informal, Setor de Habitacional Sol Nascente - Lote 1 - Trecho 3 - Ceilândia	23.000.000,00	32.000.000,00	31.634.238,71	365.761,29	99%
Regularização de Núcleo Urbano Informal, Setor de Habitacional Sol Nascente - Lote 2 - Trecho 3 - Ceilândia	15.000.000,00	23.000.000,00	22.992.187,42	7.812,58	100%
<b>Tota (R\$)</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>72.848.183,73</b>	<b>14.151.816,27</b>	<b>84%</b>

#### A.3 - CONSIDERAÇÕES

Em 2024, houve foco na melhoria do desempenho da Carteira de Contratos de Investimentos da Secretaria, com a implementação de iniciativas do Planejamento Estratégico Institucional da SODF. Isso levou a avanços relevantes nos desembolsos, cumprindo as metas estabelecidas o que resultou na execução de cerca de R\$ 280 milhões em obras e projetos.

Não obstante os avanços mencionados, cabe destacar a celebração de aditivos de reequilíbrios econômico-financeiros contratuais, cujo impacto nos valores inicialmente alocados para as obras em andamento e também para as novas licitações planejadas, torna necessário realizar procedimentos administrativos objetivando assegurar novas fontes de financiamento, consistindo de providência fundamental para garantir o fluxo de caixa adequado para os investimentos previstos para os próximos anos, sobretudo, diante do aumento substancial do aporte obrigatório de contrapartidas a cargo do Distrito Federal, em face dos empreendimentos contemplados por recursos externos.

Ressalta-se ainda a inclusão de diversas demandas prioritárias para esta Pasta no Caderno de Emendas elaborado pelo GDF, como sugestão para a obtenção de recursos procedentes de Emendas Parlamentares. Essa ação tem como objetivo apoiar as captações de recursos que são de interesse desta Secretaria, contribuindo para o fortalecimento das iniciativas e projetos em andamento.

Outro ponto importante a ser destacado, em 2024, é a conclusão e a assinatura do Contrato de Empréstimo Internacional, firmado com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Baía do Prata - Fonplata que visa financiar as ações do Programa INFRA-DF. Essa iniciativa representa um passo significativo para o avanço das obras e projetos previstos, contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura no Distrito Federal, bem como para o fortalecimento institucional desta Secretaria.

#### B - PROJETOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

1. Panorama detalhado da situação de Projetos/Orçamentos/Termos de Referência elaborados ou em elaboração em 2024 (que não resultaram em processo de licitação):

Item	Obra/Serviço	Situação
1	Contratação de obras de drenagem das Quadras QMS, no Setor de Mansões em Sobradinho II.	A Casa Civil informou que há necessidade de elaboração de Decreto que declare o interesse público quanto à programação de obras na área de intervenção, com fundamento na legislação afeta à matéria. A continuidade requer instrução de unidade técnica da Seobras. (156081351).

2	Contratação das obras de infraestrutura urbana do sistema de drenagem nos intitulados Lotes 01 e 02, do Setor Habitacional Mestre D'Ármas, Bacias 01, 02, 03, 04, 05 e 06, em poligonal de área aproximada de 260 ha.	Para renovação da Licença foi requisitado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Plano de Controle Ambiental que exigiu a necessidade de aditivo contratual que tramita no processo 00110-00002953/2021-61.
3	Contratação de projeto para implantação da Via de Ligação Viária entre a DF 001 (Estrada Parque Contorno) nas proximidades do entroncamento com a BR 251 e a região do Park Way.	O empreendimento em questão se encontra inserido na Zona de Preservação da Vida Silvestre - ZPVS da APA do Planalto Central, sendo recomendado que a SODF encaminhe questionamento ao ICMBio, estando as consultas em trâmites pelo Gabinete/SODF.
	Elaboração de especificação técnica para os serviços de remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica, aéreas, primárias na classe de 15kv e/ou secundárias, na classe de 1kv, com fornecimento de materiais	Em tratativas da Agip/Suaf/Seobras.
5	Contratação dos projetos e execução das obras do Museu Nacional da Bíblia, a ser localizado no Eixo Monumental Oeste - EMO, lote 05, na Região Administrativa do Plano Piloto.	Documentação técnica encaminhada ao setor de gerenciamento de recursos externos para gestão com a Caixa para viabilização Contrato de Repasse nº 903.915/2020/MTUR/CAIXA (157021708) referente à Construção da Primeira Etapa do Museu da Bíblia.
6	Execução de obras de requalificação de Av. Hélio Prates - Etapa 3, compreende o Trecho da Via MN 1 (Av. Hélio Prates) entre a Via M1 (Ceilândia) e as Quadras QNH 1 e QI 10 (Taguatinga).	Determinada a reformulação com mudança de concepção (146736550)
7	contratação dos serviços de topografia e geotecnia e dos projetos executivos de geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial e sinalização para requalificação dos setores hoteleiros sul e norte.	Autorização para prosseguimento dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP.
8	Pavimentação no DF, tendo como foco a restauração/recuperação de pavimento na Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF - Etapa 3.	Documentação técnica encaminhada ao setor de gerenciamento de recursos externos para gestão com a Caixa para viabilização do Contrato de Repasse nº 922411/2021/MDR/CAIXA (136024697).
9	Pavimentação no DF, tendo como foco a restauração/recuperação de pavimento na Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF - Etapa 4.	Documentação técnica encaminhada ao setor de gerenciamento de recursos externos para gestão junto à Caixa para viabilização do Contrato de Repasse nº 922902/2021/MDR/CAIXA (150737058).
10	Serviço de consultoria especializada para apoiar a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico do DF - PDSB e o Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos- PDGIRS, que deverão complementar, atualizar, revisar e adequar os planos distritais anteriores conforme a demanda recente da população urbana, conforme projeto básico.	Elaborado o orçamento para contratação, contudo o processo retornou da ADASA para aprimoramento das especificações técnicas de contratação.

## 2. Perspectivas para 2025:

Item	Obra/Serviço	Descrição dos Projetos e Atividades a serem desenvolvidas
1	Túnel de Taguatinga	Medidas mitigadoras - Túnel de Taguatinga - Elaboração de projetos
2	Drenar Taguatinga	Drenagem pluvial - Taguatinga - Implantação do Programa Drenar/DF
3	Infraestrutura no Pôr do Sol	Infraestrutura no Pôr do Sol - Urbanização no Sol Nascente / Pôr do sol
4	Implantação de ciclovias no DF	Implantação de ciclovias no DF
5	QSE/QSF e duplicação da Boca da Mata e na Av. de Ligação do Setor Primavera à Via Setor L Norte em Samambaia	Contratação de projetos de infraestrutura para região de Taguatinga/DF
6	Taguatinga - QNG/QNH	Contratação de projetos de infraestrutura para região de Taguatinga/DF
7	Avenida Hélio Prates - Etapa 1 e 3	Contratação das obras do Corredor BRT das Etapas 1 e 3 da Av. Hélio Prates.
8	Avenida Hélio Prates - Etapa 1 e 3	Ripa Av. Hélio Prates.
9	Museu da Bíblia	Implantação do Museu da Bíblia no Eixo Monumental (obras de edificações).
10	Manutenção Predial	Manutenção do prédio da SODF.
11	Taguacenter	Contratação de projetos de infraestrutura de requalificação urbana no Taguacenter.
12	Requalificação da W3 Norte	Contratação de projetos executivos de requalificação urbana W3 Norte.
13	Estações BRT - Corredor Eixo Oeste	Contratação das obras de implantação das Estação do BRT no Corredor Eixo Oeste
14	Bernardo Sayão Lote 5 (obras de infra estrutura)	Contratação das obras de infraestrutura no Bernardo Sayão.
15	SAF SUL	Contratação das obras de infraestrutura no Setor SAF SUL.
16	Elaboração de projetos de pontes	Contratação de projetos para elaboração da Ponte do Lago Norte.
17	Elaboração de projetos de infraestrutura em áreas de regularização fundiária	Elaboração de projetos de infraestrutura urbana em áreas de regularização fundiária (ARIS Morro da Cruz, ARINE Mansões Sobradinho e ARIS Nova Colina I e II e Doroty Stang.
18	Contrato de topografia	Contratação dos serviços de topografia.
19	Contrato de geotecnia	Contratação dos serviços de geotecnia.
20	VLT W3 Sul e Norte	Contratação dos projetos para elaboração das estações do VLT W3 Sul e Norte.
21	Praça 21 de Abril	Contratação das obras da Praça 21 de Abril.
22	Supervisora/gerenciadora das obras do Pôr do Sol	Contratação dos serviços especializados para supervisão/gerenciamento das obras do Pôr do Sol.
23	Rotas acessíveis na região ESPM/TAS	Contratação das obras das rotas acessíveis (calçadas) entre a ESPM e o TAS.
24	Setor Hoteleiro Norte e Sul	Contratação de empresa para elaboração de projetos e requalificação urbana no Setor Hoteleiro Norte e Sul.
25	Setor Hospitalar Norte	Contratação de empresa para elaboração de projetos e requalificação urbana no Setor Hospitalar Norte.

26	Implantação de calçadas e cicloviárias nas Quadras 800 e 900 da Asa Sul e Quadras 900 da Asa Norte.	Contratação de empresa para elaboração de projetos para Implantação de calçadas e cicloviárias nas Quadras 800 e 900 da Asa Sul e Quadras 900 da Asa Norte.
27	Implantação da Estrada Verde.	Contratação dos projetos para elaboração de projeto para Implantação da Estrada Verde, ligação Park Way e o Tororó.
28	Duplicação da Via SCE Quadra 29 - Gama	Elaboração de projeto.
29	Elaboração de projetos de Viaduto de ligação Via no Núcleo Bandeirante.	Contratação dos projetos para implantação do viaduto e duplicação da Via Núcleo Bandeirante (SMPW 06).
30	Viaduto em Samambaia	Elaboração de projetos para implantação do Viaduto na interseção DF-459 e Av Elmo Serejo.
31	Viaduto em Samambaia	Elaboração de projetos para implantação do Viaduto na interseção do Hospital Regional de Samambaia.
32	Via de ligação Morro da Cruz e comunidade Santa Cruz	Contratação para elaboração de projeto para implantação de sistema viário de conexão entre a ARIS Morro da Cruz e Comunidade Santa Cruz.
33	Estudo de expansão da linha do Metrô	Contratação para elaboração de estudos de concepção para expansão da Linha do Metrô.
34	Consultoria técnica da SODF	Prestação de serviços técnicos de apoio e assessoramento em engenharia consultiva para atuação nas áreas de elaboração de projetos, orçamentos, acompanhamento e planejamento de obras e gestão das demandas da SODF.
35	Consultoria BIM	Contratação de consultoria BIM no desenvolvimento e contratação de projetos.
36	Infraestrutura de TI para o BIM	Contratação para implantação de infraestrutura de TI para o BIM.

#### 4. Implantação do Building Information Modelling (BIM)

Considerando que não houve a assinatura da sub-rogação do Contrato nº 042.458/2020 - Aquisição de BIM, compreendendo a solução de software de ferramenta BIM, transferência de conhecimento e consultoria, o prazo para renovação das atividades de aprimoramento das soluções BIM foi perdido, assim, restou prejudicado o cumprimento das metas estabelecidas, de implementação do sistema BIM na SODF, uma vez que para o exercício de 2024 que estava previsto o módulo de planejamento em BIM e o início da fiscalização também no âmbito da plataforma.

Encontra-se em fase de estudos nova contratação de solução integrada de fiscalização e gestão em BIM de acordo com a Portaria nº 145, de 1º de outubro de 2024.

#### 6. Apresenta-se quantificado a seguir, o resultado das atividades realizadas pelo setor de projetos desta Secretaria no exercício de 2024:

Atividades desenvolvidas em 2024	Quantidade
Estudos de Viabilidade	21
Estudo Técnico Preliminar	23
Orçamentos	24
Adequação/Análise de Projetos e Orçamento em fase de Obras	312
Projetos/Serviços/Obras elevados à licitação	11
Relatórios de Auditoria	146
Ouvidoria e LAI	4
Execuções de contrato	32
Análises de solicitações de reequilíbrios econômico-financeiros contratuais	10
Respostas técnicas/processos tramitados	1426

#### C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SODF

Em 2024, a Comissão Permanente de Licitação deu continuidade à condução dos 6 processos licitatórios iniciados no ano de 2023. Na tabela abaixo, se encontram listados todos os procedimentos licitatórios que tiveram ações no exercício:

- Licitações realizadas em 2024:

Resultado da Comissão Permanente de Licitação					
Item	Modalidade	Certame	Processo	Valor (R\$)	Situação
1	Pregão Eletrônico nº 08/2023	Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para execução dos serviços topográficos cadastrais e de mapeamento aerofotogramétrico com a utilização de drone, amarrações com RTK, uso de Laser (com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.	00110-00000903/2023-10	23.135.363,50	Concluída
2	Concorrência nº 08/2023	Prestação dos serviços de elaboração/rea adequação de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana, na RA do Sol Nascente/Pôr do Sol - RA SOL, especificamente em poligonal do Pôr do Sol.	00110-00001440/2023-03	3.571.044,17	Concluída
3	Concorrência nº 02/2023	Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana, especificamente nas Poligonais do denominado Drenar Taguatinga - Ceilândia, nas Quadras QSD, QSE, QSF, na Via de Ligação Boca da Mata e na Av. Via de ligação do Setor Primavera à Via Setor L Norte, conforme poligonais (Lotes 1 e 2).	00110-00001440/2023-03	16.369.346,57	Devolvido à SUPOP para adequação a Lei nº 14.133/2021
4	Concorrência nº 03/2023	Elaboração de Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana, especificamente na poligonal delimitada nas quadras QNG/QNH.	00110-00001440/2023-03	4.023.402,95	Devolvido à SUPOP para adequação a Lei nº 14.133/2021
5	Concorrência nº 01/2024	Execução de Obra de Infraestrutura Urbana, nos intitulados Lotes 1 e 2 do Setor Habitacional Mestre D'Armas-DF, em poligonal de área aproximada de 260ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de dissipação e lançamento direto), conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, DNIT.	00110-00001440/2023-03	43.253.904,55	Encaminhado à SUPOP para atendimento à Nota Jurídica da PGDF.

6	Dispensa de Licitação - 90001/2024	Aquisição de 28 (vinte e oito) baterias estacionárias para o Nobreak, livre de manutenção, seladas, reguladas por válvula (VRLA), tensão nominal 12V - 200Ah, incluindo serviços de troca, instalação, inspeção, configuração, atualização de software e teste do sistema, bem como, o descarte ambientalmente adequado das baterias substituídas.	00110-00003791/2023-41	50.369,20	Concluída
7	Dispensa de Licitação - 90002/2024	Aquisição de insumo do gênero de alimentício (café torrado), para suprir o abastecimento de estoque do Almoxarifado, propiciando o bom andamento das atividades internas e atendimento aos visitantes.	00110-00000196/2024-34	3.480,00	Concluída
8	Dispensa de Licitação - 90003/2024	Aquisição de painéis de divisórias, tipo naval com as respectivas esquadrias em aço.	00110-00001012/2024-53	30.400,00	Concluída
9	Dispensa de Licitação - 90004/2024	Aquisição de livros didáticos impressos que versam sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLCC - Lei nº 14.133/2021, escritos por autores renomados, em suas edições mais atualizadas, visando atender a necessidade de capacitação, atualização e aprimoramento do conhecimento jurídico desta Secretaria.	00110-00000733/2024-46	1.035,09	Concluída
10	Dispensa de Licitação - 90005/2024	Contratação de serviços, fornecimento e montagem de sistema construtivo em drywall, com chapas de gesso acartonado, forro em gesso com tabicas, portas, luminárias, spots direcionáveis e serviços correlatos para a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura (SODF).	00110-00001937/2024-02	11.700,00	Concluída
11	Dispensa de Licitação - 90006/2024	Aquisição de molduras em madeira, na cor preta, para exposição de fotografias das principais obras executadas e em execução na sala do Secretário de Estado, bem como na sala de espera do Gabinete.	00110-00001618/2024-99	1.499,60	Concluída
12	Dispensa de Licitação - 90007/2024	Aquisição de logotipos da Secretaria de Obras e Infraestrutura Distrito Federal - SODF, e brasões oficiais do Distrito Federal para identidade visual da sala do Secretário de Estado e sala de espera do Gabinete.	00110-00001611/2024-77	4.368,00	Concluída
13	Dispensa de Licitação - 90008/2024	Aquisição de fragmentadoras de papéis.	00110-00002494/2024-69	4.806,60	Concluída
14	Dispensa de Licitação - 90010/2024	Aquisição de 02 (dois) fogões tipo piso, com forno, quatro queimadores, novos, de primeiro uso.	00110-00002541/2024-74	2.345,34	Concluída
15	Dispensa de Licitação - 90011/2024	Contratação de licenças de uso do software de Business Intelligence (BI), consultoria para transferência de conhecimento e suporte técnico, com finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.	0110-00001754/2024-89	52.260,00	Concluída
16	Dispensa de Licitação - 90012/2024	Aquisição de 01 (um) televisor de 98 polegadas e 02 tablets, com garantia e assistência técnica on-site para atender as demandas das Áreas do Órgão que realizam atividades da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.	00110-00002943/2024-79	23.608,59	Concluída
16	Dispensa de Licitação - 90013/2024	Aquisição de ferramentas e equipamentos operacionais (furadeira/parafusadeira de impacto, serra circular e escadas).	00110-00002230/2024-13	3.051,72	Concluída
18	Dispensa de Licitação - 90014/2024	Aquisição de mobiliários, novos e em primeiro uso (mesas, carrinho de distribuição chá e café e do banco tipo jardim) que são necessários para garantir condições adequadas de trabalho.	00110-00002850/2024-44	11.150,00	Concluída
19	Dispensa de Licitação - 90015/2024	Aquisição de mobiliários, novos e em primeiro uso (mesa).	00110-00003279/2024-85	2.220,00	Concluída
20	Dispensa de Licitação - 90016/2024	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento e a instalação de peças de reposição, dos equipamentos de auxílio de acesso, na Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura (SODF). As atividades compreendem inspeção, avaliação, manutenção corretiva com substituição de peças, manutenção preventiva com ajustes, limpeza e lubrificação, e testes de funcionamento do motor XH30 433 MHz da marca Rossi e do sistema de automação em equipamentos das portas automáticas em vidro da marca Garen.	00110-00003228/2024-53	14.964,00	Concluída

#### D - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, CONSELHOS e GRUPOS DE TRABALHO (GT)

- Câmara Julgadora de Autos de Infração – CJAI.
- Comissão Técnica de Revisão e Atualização do PDSB e PDGIRS.
- Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - CPA / EIV,
- Comissão Interna de Apoio Técnico - CIAT.
- Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal – CDZEE/DF.
- Comissão do Plano de Prevenção e Enfrentamento às Ações Danosas decorrentes de Eventos Climáticos no Distrito Federal.
- Comissão Técnica de Revisão e Atualização do PDSB e PDGIRS.
- Comissão PDOT – Estratégias de Regularização e Habitação.
- Comissão Técnica para realização de procedimentos visando a contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos com o objetivo de realocação do Centro de Progressão Penitenciária.
- Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF.
- Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação – CETI.
- Comitê de Mobilidade Urbana.
- Grupo de Trabalho (GT) Águas Parasitárias (Conam/DF).
- GT Regulamentação de Uso de Agregados Recicladoss em Obas Públicas (CORC/DF).
- GT para a Institucionalização do Serviço Público de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no Distrito Federal.
- GT de Monitoramento de Qualidade da Água, vinculado à participação no Conselho de Recursos Hídricos – CRH.
- GT de Elaboração e Articulação do Plano Distrital de Acessibilidade.
- GT de transporte público coletivo do DF.
- Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência - Codedd.
- Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano do Jardim Botânico.
- Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – Consab/DF.
- Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - Conam.
- Conselho de Recursos Hídricos – CRH.
- Conselho Deliberativo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

#### E - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO

##### 1. Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) e Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PDGIRS)

No ano de 2024, realizaram-se reuniões da Comissão Técnica, visando ao levantamento dos programas e indicadores que ainda não foram cumpridos, os principais gargalos, as dificuldades de atendimento das metas e consequentemente, a necessidade de atualização das metas, no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; e prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Essas reuniões da Comissão Técnica, também, tiveram por objetivo discutir o conteúdo do texto base que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, de forma a atualizar o Termo de Referência para futura contratação de consultoria especializada para a revisão dos Planos.

Cabe salientar a Lei Federal nº 14.026/2020, que atualiza o marco legal do Saneamento Básico, alterou a previsão de revisão para até 10 anos.

Durante o ano de 2024, houve a finalização e aprovação do Termo de Referência pela Comissão Técnica, o início dos procedimentos licitatórios está previsto para o próximo ano.

## 2. Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal (Consab)

Em 2024, realizou-se seis reuniões ordinárias, que trataram de assuntos relacionados aos seguintes temas: saneamento básico nas áreas urbana e rural, diagnóstico de problemas relacionados aos vertentes do saneamento, resultado dos trabalhos de outras instituições na temática, prospecção de futuras ações dos entes, orçamentos e legislações dentre outros assuntos relevantes; e por fim, as atividades realizadas no ano de 2024 quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Ainda em 2024, foi criado 1 GT- Grupo de Trabalho no âmbito do Conselho, sendo eles: para analisar a proposta da ABES/DF e UNB para avaliar a necessidade, oportunidade e conveniência de alterar a natureza jurídica do Conselho, de Articulador e Consultivo para Deliberativo.

## 3. Acompanhamento Ambiental de Obras

Esta Secretaria, no ano de 2024, realizou a gestão e o acompanhamento ambiental de diversos empreendimentos dentro do território do Distrito Federal e atuou em inúmeros procedimentos para a obtenção de autorizações e licenças ambientais de interesse desta Pasta e de outros Órgãos, cujas obras têm sido acompanhadas de forma a auxiliar na clara execução das atividades em conformidade com a legislação ambiental. Na tabela abaixo, estão relacionadas todas as Licenças e Autorizações recebidas/renovadas durante o ano de 2024, entre os meses de janeiro e dezembro:

Tipo	Empreendimento	Interessada	Atividade Licenciada
ASV 2053.8.2024.45574	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	SODF	Supressão de vegetação obra de drenagem no Parque Ecológico do Cortado.
ASV 2053.8.2024.46611	Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1	SODF	Supressão de vegetação para instalação de bacia de drenagem pluvial - Lançamento Lagoa 2 no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1.
ASV 2053.8.2024.46497	Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 3	SODF	Supressão de vegetação para instalação de bacia de drenagem pluvial - Lançamento Direto no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3.
ASV 2053.4.2024.43412	Corredor Eixo Oeste - EPIG	SODF	Supressão de vegetação para obras dos Trechos 5 e 6 da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).
ASV 2053.4.2024.47589	Corredor Eixo Oeste - EPIG	SODF	Supressão de vegetação para obras do Trecho 4 da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).
ASV 2053.4.2024.47343	Corredor Eixo Oeste - EPIG	SODF	Supressão de vegetação para obras do Trecho 2 da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).
ASV 2053.8.2024.41833	Setor Habitacional Vicente Pires	Terracap	Supressão Vegetal para obras remanescentes do Lote 2 de Vicente Pires e OAE 3.
ASV 2053.4.2024.44225	Setor de Oficinas Sul - SOF SUL	SODF	Supressão de vegetação para instalação e ampliação do sistema de drenagem pluvial do Setor de Oficinas Sul - SOF SUL.
ASV 2053.8.2024.31979	Via de Ligação Guará/Núcleo Bandeirante	SODF	Supressão de vegetação para as obras de arte e duplicação da ligação entre o Guará II e o Núcleo Bandeirante, inclusive passagens superiores sobre a estrada de ferro no acesso à vila EPVT.
AUC 06/2024	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	SODF	Implantação de projeto de bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado.
LI 03/2024	Setor Habitacional Vicente Pires	Terracap	Parcelamento de Solo Urbano no Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 3.
LI 63/2024	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1	CODHAB	Regularização de parcelamento de solo urbano - Trecho 1 - Etapa 1 e 2 (ARIS Sol Nascente).
LAS 07/2024	Setor de Inflamáveis	SODF	Implantação e operação de sistema viário urbano.

Ademais, também atuou na manutenção das licenças ambientais vigentes, requerendo renovação ao Órgão competente dentro dos prazos legais e apresentando as informações técnicas necessárias à instrução dos processos.

Em 2024, outro instrumento bastante relevante para as ações desta Secretaria foi a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA, que libera automaticamente os empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal. Na tabela abaixo, seguem as intervenções alcançadas pela aplicação da Dispensa de Licenciamento Ambiental:

Data	Objeto da intervenção alcançada pela DLA
26/2/2024	Requalificação da Quadra 6 do Setor Comercial Sul.
2/8/2024	Requalificação dos Setores Hoteleiros Sul e Norte.
1/10/2024	Desenvolvimento de Projeto de Sistema Viário - SIV na QNO 4 Conjunto N, em Ceilândia.

Para a obtenção dos instrumentos elencados acima, a SODF atuou direta e indiretamente com os interessados e os órgãos reguladores, de forma a instruir corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o monitoramento das atividades na esfera ambiental de acordo com as disposições previstas nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições. Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SODF, quanto à temática ambiental:

a) Setor Habitacional Vicente Pires - Em 2024, esta Secretaria, por meio de sua área técnica ambiental, atuou com a Terracap e o Ibram para renovação das 3 licenças ambientais do parcelamento em regularização. As licenças ambientais do parcelamento se encontram vigentes, com manifestação de renovação tácita, apenas para Licença de Instalação nº 21/2016 que alcança as Glebas 2 e 4, conforme Declaração - IBRAM/PRESI/SULAM. Cabe ressaltar que o Ibram por meio da Manifestação nº 11285 emitiu parecer pela dispensa de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) permitindo a supressão de indivíduos arbóreos até a conclusão das obras. Salienta-se que

foi solicitado análise da Terracap para as obras remanescentes do Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires e da Obra de Arte Especial 3, em virtude de mudanças pontuais dessas obras, as quais foram evidentemente apreciadas e aprovadas pelo órgão ambiental, ainda, considerando que houve necessidade de supressão de indivíduos arbóreos em área não abarcada pela Manifestação 11285, foi emitida a Autorização de Supressão Vegetal – ASV.

b) Setor Habitacional Bernardo Sayão - Realizou-se gestão com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, visando à adequada destinação dos resíduos da construção civil. Em relação às obras de escavação da bacia 8 ocorreram intercorrências e os trabalhos precisaram ser interrompidos.

c) Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1, 2 e 3 - Esta Secretaria realizou diversas vistorias no Setor Habitacional Sol Nascente, no ano de 2024, com o objetivo de acompanhamento das condicionantes das licenças ambientais emitidas para fins de parcelamento do solo e execução de obras de infraestrutura nos Trechos 1, 2 e 3. Em 2024, também, foram realizadas vistorias com o objetivo de elaboração de Inventário Florístico para fins de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV pelo Ibram e elaboração de Relatórios de Acompanhamento de Fauna. Cabe salientar que após a supressão das árvores, mediante ASV emitida pelo Ibram, foi possível a continuidade das obras de drenagem de águas pluviais no lançamento no corpo hídrico da Lagoa 2 (Trecho 1); lançamento no corpo hídrico da Lagoa 2 (Trecho 3); Obra de Arte Especial – OAE que liga o Trecho 1 ao Trecho 2, respectiva canalização do corpo hídrico e recuperação de erosão na margem do córrego. Esta Secretaria atuou com a Codhab e o Ibram, visando a unificação das Licenças do Trecho 1 - Etapas 1 e 2, para fins de melhoria nos acompanhamentos das condicionantes. Destaca-se que o órgão ambiental se manifestou favoravelmente à união, sendo emitida nova licença ambiental. Ademais realizou-se gestão com a empresa executora de obras visando à apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC para os três trechos em obra, sendo apresentados à Codhab para fins de conhecimento do órgão ambiental competente.

d) Corredor Oeste - ESPM (Estrada Parque Setor Policial Militar) – Em 2024, esta Secretaria atuou na gestão para emissão de Autorização de Supressão Vegetal - ASV, inventário florestal e de fauna do empreendimento, principalmente na obra da edificação da bacia de retenção e qualidade referente à parte de drenagem da obra. Em relação as obras da lagoa de drenagem do T16 não foram identificadas necessidade de mais supressões. Em junho de 2024, foi realizada poda drástica e supressão vegetal com a Novacap, além da revisão do inventário e todo acompanhamento de obra, inclusive a retomada do viaduto próximo à entrada da W3 Sul.

e) Corredor Oeste - Túnel Rei Pelé – Em 2024, acompanhou-se as atividades do Túnel de Taguatinga, por meio da análise dos relatórios, bem como de vistorias periódicas, sempre no intuito de atender as condicionantes da Licença Ambiental. O relatório de monitoramento ambiental final está em elaboração, tendo em vista que as obras do túnel foram finalizadas, restando apenas o término das obras de drenagem, inclusive a lagoa de retenção da drenagem do túnel, que está sendo edificada às margens do rio Melchior.

f) Corredor Oeste - Avenida Hélio Prates (Etapa 2) - Durante o ano de 2024, foi realizado o acompanhamento das atividades referentes à Licença Ambiental Simplificada que autoriza a implantação da faixa adicional na Avenida Hélio Prates – Etapa 2, respectivas ASVs e Autorizações em Unidades de Conservação (AUCs). Salienta-se a existência da Autorização de Supressão Vegetal, referente ao empreendimento como um todo, a Autorização de Corte de Árvore Isolada, referente às bacias dentro do Parque do Cortado e a Autorização de Supressão Vegetal, referente à supressão necessária para viabilizar a recuperação da erosão do talude da cachoeira do Parque do Cortado. Destaca-se, ainda, o acompanhamento do Contrato referente ao monitoramento de ruídos gerados nas obras.

g) Corredor Oeste – Viaduto EPIG – Esta Secretaria, por meio de sua área técnica ambiental, realizou o monitoramento ambiental das obras, esclarecimentos e, também, subsidiou a emissão de autorizações de supressão de vegetação na modalidade de Corte de Árvores Isoladas (CAI) para o correto andamento da obra.

h) Drenagem no SOF Sul – Durante o ano de 2024, ocorreu grande avanço da obra do sistema de drenagem e edificação de 4 lagoas de retenção e qualidade localizadas no Parque Ezequias Heringer, com a escavação das bacias prontas e a rede de drenagem do setor em estágio avançado de instalação. Em agosto de 2024, foram realizadas novas tratativas para emissão de uma nova ASV em trecho complementar.

i) Pavimentação no CAUB I/CAUB II – A obra de pavimentação foi entregue para a população no ano de 2023. Esta Secretaria repassou o bem público (sistema de drenagem) para a gestão da NOVACAP. Após a celebração do recebimento, a área ambiental desta pasta irá realizar as tratativas com o Ibram, para a alteração da titularidade da Licença Ambiental para a Novacap.

j) Via de Ligação Guará e Núcleo Bandeirante – Esta Secretaria realizou diversas vistorias, visando ao acompanhamento ambiental das obras, conforme condicionantes apresentadas na Licença Ambiental e a elaboração de Inventário Florístico, para fins de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV pelo Ibram e Acompanhamento de Fauna.

#### **4 - Gestão Ambiental**

a) Sistema E-RCC/SLU: O sistema E-RCC possibilita o gerenciamento, monitoramento e rastreabilidade de forma eletrônica de toda a movimentação de resíduos da construção civil. Em 2024, esta Secretaria, por meio de sua área técnica, executou o gerenciamento de informações de obras contratadas por esta pasta para emissão de Controle de Transporte de Resíduos – E-RCC/SLU.

b) Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor: Em 2024, esta Secretaria cadastrou 8 projetos com o Sinaflor, contendo os dados florestais levantados e analisados pelo responsável técnico do setor, para obtenção da Autorização de Supressão Vegetal – ASV das obras em que a Secretaria é a titular da Licença Ambiental. Cabe ressaltar que das 8 obras cadastradas 6 dispõem das respectivas Autorizações de Supressão Vegetal, destacando-se as obras: Lançamento de Drenagem Parque Cortado, ESPM T16, Bacias 6A e 6B, Sol Nascente, EPIG e SOF SUL.

c) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS – Digital: Em uma iniciativa inovadora, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do DF (SEMA) disponibiliza o Sistema Eletrônico de Registro, Controle, Monitoramento e Fiscalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS – Digital) para os profissionais habilitados apresentarem o Plano ao órgão ambiental do DF, mediante endereço eletrônico <https://app.pgrsdigital.com.br/app/cidade>, instituído mediante o Decreto nº 46.520, de 13 de novembro de 2024. O objetivo do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) é apresentar o fluxo de gerenciamento dos resíduos da construção civil produzidos nas obras, ou seja, o fluxograma da geração, manejo e destinação dos resíduos, considerando especialmente o tipo de resíduo, tais como: resíduos de demolição, de escavação, de pavimentação, de limpeza superficial, o tipo de transporte ou coleta, o responsável pelo transporte e a destinação final. A área ambiental desta Secretaria promoveu dois treinamentos para servidores da Supop e Suaf, áreas técnicas desta pasta, bem como para servidores da Novacap, SLU, Caesb, DER e CEB, visando ao acompanhamento adequado das informações no Sistema.

d) Sistema de Gestão de Solo de Escavação – SGSE: Em 2024, destaca-se o volume excedente previsto no projeto que compõe o Sistema. O objetivo principal é que o excedente da obra seja reutilizado em outras demandas no âmbito do DF, visando custos de deposição na URE e minimizar os gastos com compra desse material pelos entes públicos. Outro aspecto de relevância, é que menos solo destinado à URE interfere no aumento de sua vida útil, entretanto, o Sistema precisa de melhorias para atendimento das demandas e controle para melhor operacionalização do Sistema.

e) Cascalheira: As buscas realizadas pela área técnica ambiental desta pasta foram realizadas por meio do Sistema de processos Urutau e encaminhadas para outras áreas técnicas da Secretaria, conforme demanda.

#### **F - PRINCIPAIS SITUAÇÕES QUE REQUERERAM AVALIAÇÃO DA ACESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA**

No que tange às atividades jurídicas, tramitou-se 856 processos, sendo gerados 1.369 processos no período de 1/1/2024 a 20/12/2024. Ao final do exercício constata-se na unidade, 836 processos concluídos, 22 processos com andamento aberto e 97 documentos externos.

#### **G - GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO**

##### **– Gestão de Riscos**

Durante o exercício de 2024, realizaram-se: capacitação em Gestão de Riscos com a Controladoria Geral do DF; Gerenciamento dos controles definidos pelas áreas; Gerenciamento dos riscos mapeados; Mapeamento dos principais riscos e respectivas causas que possam ocorrer no âmbito de Projetos; Desenvolvimento e Homologação do Plano de Gerenciamento de Riscos, que contempla a metodologia utilizada para o Gerenciamento dos Riscos definidos a partir do Sistema SaeWeb.

Cumpru-se as normas de Gestão de Riscos desta Secretaria, houve aperfeiçoamento contínuo no processo de Gestão de Riscos e maturidade na identificação e no gerenciamento dos Riscos.

##### **– Painel de Obras**

Em 2024, foi atualizado o Painel de Obras pelas Subsecretarias e Chefias desta Secretaria. Houve, também, a consolidação e elaboração do Painel, com a inclusão da Unidade de Controle Interno – UCI, desta pasta, no Painel das áreas de suporte.

##### **– Gestão de Integridade Institucional**

Em 2024, realizou-se reuniões com a Controladoria Geral do DF, Comissão de Ética, Ouvidoria e Assessoria de Correição para continuidade e aperfeiçoamento do Programa de Integridade desta Secretaria.

Destaca-se a continuidade da disseminação do Programa de Integridade entre os servidores; envolvimento das áreas de Comissão de Ética, Ouvidoria e Assessoria de Correição, com objetivo de definição dos responsáveis por prevenção de riscos de integridade, detecção e saneamento de problemas de integridade. A Comissão de Ética, visando empreender ações de capacitação em seu próprio local de trabalho, bem como atender ao disposto no Plano de Direcionamento Estratégico-



Operacional, promoveu aos servidores desta Secretaria as seguintes palestras: Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho (8/4/2024); Inteligência Emocional - Um Caminho para a Integridade (8/7/2024) e Segurança e Defesa das Mulheres (25/11/2024). Cumpre registrar ainda, que os membros da Comissão participaram do Curso sobre Normas de funcionamento e de rito processual no âmbito das Comissões de Ética, promovido pela Casa Civil/DF.

#### - Gestão de Integridade de Empresas

Verificou-se maior controle e visibilidade da situação de conformidade das empresas contratadas no que se refere ao Programa de Integridade de Empresas. Os novos contratos firmados por esta pasta se encontram monitorados pela Controladoria Geral do DF.

#### - Mapeamento de Processos

Em 2024, houve a continuidade no mapeamento dos processos finalísticos e os processos de suporte desta pasta, alcançando a padronização dos processos mapeados e implantados.

#### - Modelo de Governança e Gestão - MGG

Em 2024, foram apresentadas as boas práticas de gestão às áreas técnicas desta pasta, quais sejam, às Subsecretarias de Acompanhamento e Fiscalização e de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras, visando ao aprimoramento organizacional, o aperfeiçoamento dos fluxos e práticas, à maximização dos níveis de eficiência e efetividade e ao aumento da capacidade de geração de valor, também foram mapeados alguns processos com vistas à melhoria dos resultados finalísticos.

Destaca-se que no exercício de 2022, esta Secretaria obteve o Certificado de Nível de Maturidade da Governança e da Gestão - Categoria - Bronze 3, referente à 2ª Aplicação do (IMG 100 Pontos) do Modelo de Governança e Gestão - Gestão.gov.br, com validade até abril/2026.

#### - Comitê Interno de Governança

Em 2024, realizou-se 4 reuniões ordinárias do Comitê Interno de Governança Pública - CIG, conforme periodicidade definida na Portaria nº 71 de 15 de junho de 2022, informando aos membros sobre os trabalhos realizados. Também ocorreu a inclusão dos temas: Conformidade, Controle Interno, Transparência Ativa e Ouvidoria nas atribuições de Governança.

#### - Planejamento Estratégico - PEDF (2023 - 2026)

Em 2024, houve atualização constante do Sistema Gestão DF e o cumprimento das obrigações referente ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI com a Suppe/SEEC.

#### - Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2023.2026

Em 2024, realizou-se Reuniões com as áreas para definição das metas do PEI 2023.2026, Revisão das iniciativas do PEI 2023 e a elaboração e homologação do Plano Estratégico 2023.2026, cumprindo as obrigações, referentes ao PEI, com a Suppe/SEEC.

#### - Programa qualidade de Vida

Em 2024, foi editada a Portaria nº 154, de 15 de outubro de 2024, que instituiu a Política de Qualidade de Vida da SODF para servidores e colaboradores e a Semana de Qualidade de Vida com ações de cuidados com a saúde do servidor.

#### - Trabalhos das Comissões Permanentes (CPS e CPTCE) e de PIP

Esta Secretaria, por meio de suas Comissões Permanentes, atuou em observância à sistematização e à padronização dos procedimentos das ações de Correição Administrativa no âmbito do Distrito Federal. Ressaltam-se, abaixo, as atividades referentes a cada comissão:

- Apuração de responsabilidades do gestor contratual e do fornecedor do Contrato nº 12/2016-Sinesp, em razão dos serviços executados sem cobertura contratual, do valor retido sobre a fatura da 6ª medição, relativamente à Nota Fiscal 0349/2018-81 (emitida em 09/04/2018), noticiados por meio dos autos do processo nº 00110-00002000/2023-65.
- Apuração acerca do pedido do Consórcio contratado de reconhecimento de dívida dos itens de carga, transporte e descarga de aduelas no Contrato nº 22/2021, referente às obras de Reformulação do Sistema Viário na ESPM, noticiados por meio dos autos nº 00110-00003020/2023-53, com fundamento no art. 212, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e nos moldes da Instrução Normativa nº 03, art. 4º, de 19 de outubro de 2021 da CGDF. A investigação preliminar será apurada por meio de processo sigiloso.
- Apuração de responsabilidades pelas irregularidades sobre a execução de despesas sem cobertura contratual decorrente das obras de construção da Praça da Juventude de Ceilândia - Contrato nº 2/2018-Sinesp.
- Apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano causado ao erário, pelo suposto prejuízo ao DF, em decorrência da prática de ato econômico de que resultou danos ao Erário, quanto aos atos administrativos relacionados à consecução e execução considerando-se o Primeiro e Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 2/2015-Sinesp, (0112-005426/2015 e nº 0112-000016/2017), respectivamente, referentes às despesas medidas e pagas em relação ao transporte indevido de material escavado em rodovia pavimentada e não pavimentada nas Bacias de Detenção (4A, 4B, 4C, e 4D) das obras do Trecho 2 no Setor Habitacional do Sol Nascente, nos termos do Item 6. Recomendações, R5, Subtópico 3.1.1.3 do Relatório de Auditoria Operacional nº 01/2019 - DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF, páginas 35 e 36, em apuração no âmbito de processo específico.

## H - COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DE MEDIÇÕES - COACM/SUAF

A Coordenação de Análise e Conferência de Medições - COACM foi extinta em 06/08/2024, com a edição de nova reestruturação da Secretaria, passando as atribuições da então Coordenação para a Unidade Especial de Execução de Obras - Uneobras. Assim, compete atualmente também à referida Unidade, coordenar, analisar e conferir as documentações inerentes às medições dos Contratos vigentes, gerir planilhas técnicas e administrativas de controle das medições, emitir Atestados de Execução, autuar processos eletrônicos de pagamentos, promover levantamentos técnicos dos quantitativos dos serviços medidos e realizar análise da vantajosidade dos Contratos vigentes.

Relacionam-se, a seguir os apontamentos mais recorrentes, inclusive em anos anteriores, por ocasião das análises das medições e que poderiam impactar nos valores das respectivas medições:

- Itens sem cobertura contratual constatados no Boletim de Medição;
- Memórias de Cálculo equivocadas;
- Medição de serviços não executados na obra;
- Alteração do critério de medição estabelecido no orçamento paradigma, sem formalização de aditivo contratual prévio ou justificativa técnica;
- Ajustes nas medidas apresentadas pelas contratadas, quando estas divergem das medidas aferidas, in loco, por empresa de acompanhamento topográfico contratada pela SODF, ou ainda, das medidas contratuais previstas;
- Ausência de comprovação do Controle de Transporte de Resíduos - CTR com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU;
- Medição de serviços sem laudos aferidos referentes ao período de execução da medição;
- Medição de serviços sem projetos aprovados previamente;
- Medição de itens em duplicidade ou com sobreposição de serviços;
- Medição retroativa de serviços executados sem cobertura contratual; e
- Apresentação incompleta de documentação solicitada. Em 2024, foram emitidos 220 Atestados de Execução.

## I - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO E INSTITUCIONAL

Ao longo de 2024, foram efetivados 487 atendimentos aos veículos de comunicação. Nas redes sociais, o perfil desta Secretaria no Instagram teve 407 novas publicações. O número de seguidores saltou de 4.815 para 10.200, aumento de 211,8%.

No Quadro a seguir, mostra o resumo das atividades empreendidas em 2024:

Atividades	Quantidade
Atendimento à imprensa	487

Matérias	206
Site	113
Intranet	182
Whatsapp	276
Publicações (Redes Sociais)	407
Seguidores (Instagram)	10.200

#### J - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Cumpra registrar que em 02/09/2024 restou publicada a aposentadoria da então Chefe da Unidade de Controle Interno desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, conforme a Ordem de Serviço nº 87, de 30/08/2024, publicada no DODF nº 168. Assim, até a referida data deu-se continuidade à determinação da Portaria nº 141/2020-SODF, de 18 de dezembro de 2020, publicada no DODF nº 244, de 29 de dezembro de 2020 quanto à verificação por parte da UCI da conformidade da instrução de todos os processos de pagamentos e aditivos contratuais relativos à execução de obras a cargo desta SODF, além das contratações acima de 3 milhões de reais.

Por conseguinte, o relatório que evidencia os trabalhos desenvolvidos pela UCI em 2024, foi elaborado de forma parcial e reflete a situação constatada até o mês de agosto/2024 (149363149), indicando quantitativo de 322 notas técnicas emitidas.

Torna-se importante ressaltar, ainda, que a solicitação de indicação de um nome para assumir a citada função, de modo a garantir a continuidade das atividades de controle interno nesta Secretaria, fora apresentada à Controladoria Geral do Distrito Federal, em 02/09/2024, tendo em vista que o referido cargo é privativo de integrante da carreira de Auditoria de Controle interno. Diante do atendimento da indicação em 18/11/2024, para que as importantes atividades desenvolvidas por essa unidade sejam retomadas, esta SODF aguarda a cessão oficial de servidor nomeado em 29/11/2024, como Chefe da Unidade de Controle Interno.

#### K - OUVIDORIA

Quanto às declarações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, registradas pelos Canais de Atendimento Sistema OUV-DF e Sistema e-SIC, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, estas totalizaram 593 demandas destinadas a esta Secretaria, sendo: 528 Reclamações, 48 Solicitações, 1 Elogio, 6 Sugestões, 8 Informações e 1 Denúncia. As Regiões Administrativas que mais demandaram foram: Plano Piloto 178; Vicente Pires 120; Sol Nascente 86; Taguatinga 63; Sudoeste/Octogonal 48; Guarã 37; Ceilândia 21; Park Way 14; Paranoá 9 e Samambaia 3.

Entre os assuntos mais abordados estão: Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 124; Execução de Obras Públicas 95; Pavimentação Urbana - Asfalto 58; Fiscalização das Obras Públicas na Área Regular 48; Galeria de Águas Pluviais 29; Execução de Obras Públicas na Área de Infraestrutura Urbana 28; Fiscalização das Obras Públicas na Área de Infraestrutura Urbana 23; Tapa Buraco - Vias Públicas 15; Manutenção de Calçadas (irregulares ou danificadas) 15 e Fiscalização em Obra em Área Pública Residencial 14.

Ressalta-se que das 593 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SODF, o cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, que obteve a seguinte classificação: 74% respondidas; 16% não resolvidas; 1% não resolvidas após a resposta complementar; 8,4% resolvidas; 0,5% foram avaliadas como resolvidas após a resposta complementar e 0,2% se encontram em análise.

Em relação ao indicador de cumprimento do prazo de resposta para as demandas do cidadão, obteve-se o resultado de 98,5%, com o prazo médio de resposta em 15 dias.

Em obediência à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, foram direcionados a esta Secretaria 137 pedidos no ano de 2024, sendo impetrados 13 recursos.

Registra-se, ainda, que este Órgão tem sido premiado por apresentar 100% de pontuação no Índice de Transparência Ativa (ITA), em 2024, pela 9ª edição consecutiva.

## 4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

### Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

#### 4.1 Panorama da Execução Orçamentária e Financeira


A Lei Orçamentária Anual de 2024 (Lei nº 7.377, de 29 de dezembro de 2023 - DODF Edição Extra nº 89-B, de 29/12/2023) consignou para esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF dotação orçamentária no valor total de R\$ 799.085.930,00, distribuídos da seguinte forma:

#### Quadro 01 - Alocação orçamentária inicial oriunda da LOA 2024 - Posição 01/01/2024:

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte de Recursos	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Percentual aproximado por Grupo de Despesa	Percentual da Fonte de Recursos no Grupo de Despesas
Pessoal e Encargos Sociais	1	100	Ordinário não Vinculado	24.765.975,00	3,10%	100,00%
		<b>Subtotal Grupo 1</b>		<b>24.765.975,00</b>		
Outras Despesas Correntes	3	100	Ordinário não Vinculado	9.919.739,00	38,60%	3,22%
			Emendas Parlamentares Individuais	4.310.000,00		1,40%
		111	Taxa de Expediente	282,00		0,00%
		120	Diretamente Arrecadados	15.375,00		0,00%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	273.525.855,00		88,68%
		136	Operações de Crédito Externas (Fonplata)	14.496.080,00		4,70%
		161	Recursos de Dividendos	6.158.400,00		2,00%
<b>Subtotal Grupo 3</b>		<b>308.425.731,00</b>	<b>100,00%</b>			
Investimentos	4	100	Ordinário não Vinculado	2.955.776,00	58,30%	0,63%
			Emendas Parlamentares Individuais	4.000.000,00		0,86%
		131	Convênios com Órgãos do GDF	50.586.140,00		10,86%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	14.000.000,00		3,00%
		135	Operações de Crédito Internas	279.625.288,00		60,02%
		136	Operações de Crédito Externas (Fonplata)	63.760.420,00		13,69%

161	Recursos de Dividendos	13.841.600,00	2,97%
732	Convênios Com a União – Emendas Individuais – EPI	37.125.000,00	7,97%
<b>Subtotal Grupo 4</b>		<b>465.894.224,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total</b>		<b>799.085.930,00</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO.

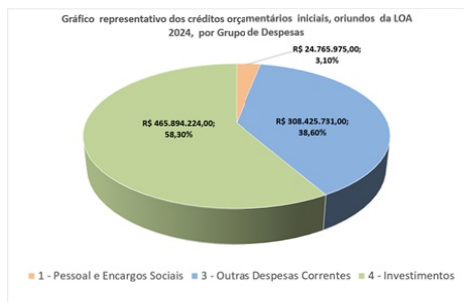

Pode-se observar na representação gráfica acima, que, 58,30% dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD desta SODF foram alocados no Grupo 4 – Investimentos, o que corresponde a R\$ 465.894.224,00, e no Grupo 3 – Outras Despesas Correntes obteve-se 38,60%, equivalente a R\$ 308.425.731,00 do Orçamento da Pasta.

Constata-se no Grupo 4 – Investimentos, que, 60% dos recursos orçamentários alocados neste Grupo de Despesas vinculavam-se a recursos previstos decorrentes de operações de crédito celebradas e previstas a serem formalizadas entre o Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (fonte 135), 10% eram referentes à previsão de repasses oriundos de convênios com a Terracap (fonte 131) e 7% se vinculavam aos recursos previstos em contratos de repasses celebrados por intermédio de Emendas Federais (fonte 732).

Há que se considerar, também, ter havido consignação orçamentária no Grupo 4, em parte da fonte 135 e na fonte 136, relativa a operações de crédito, que se encontravam em tratativas, portanto, ainda não asseguradas com o BNDES (financiamento denominado BNDES 2) e o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonprata.

Não obstante o desempenho relativo aos desembolsos dos recursos vinculados a operações de crédito, convênios e contratos de repasses, seja tratado em partes específicas deste Relatório, notadamente nas Realizações por Programa (parte 2) e nas Informações Complementares (parte 3 - A-2), de acordo com dados de executores/comissões executoras de contratos e do setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos, que procede às estimativas anuais desses recursos no Orçamento da Pasta, cabe ressaltar que persistem dificuldades intrínsecas à execução das obras previstas nos diversos instrumentos pactuados, dentre as quais: reordenamento territorial, necessidade de atualizações de projetos, ajustes em cronogramas físico-financeiros de execução, regularizações fundiárias, dependência de definições de outros órgãos como por exemplo, o atraso recorrente na conclusão de análises e aprovação de projetos, que impactam diretamente no ritmo de obras, impedindo a liberação de maiores frentes de serviços, bem como demais entraves técnicos.

De outro modo, em seguimento à trajetória de crescimento favorável demonstrada nos últimos exercícios, depreende-se do Quadro 02, avanço positivo na execução orçamentária verificada em 2024, decorrente da utilização desses recursos vinculados:

**Quadro 02 - Valor Liquidado - Fontes Externas - SODF (Por Unidade Gestora - UG):**

Grupo de Despesas	Fonte	Descrição da Fonte	Empenho Liquidado 2023	Empenho Liquidado 2024
4 - Investimentos	131	Convênios Outros Órgãos do GDF	18.511.582,43	24.665.514,97
	135	Operações de Créditos Internas	97.475.965,22	130.561.701,16
	321	Aplicações Financeiras Vinculadas	1.320.015,93	1.362.925,35
	335	Operações de Créditos Internas	86.644.792,37	105.824.985,20
	732	Convênios com a União – Emendas Individuais – EPI	0,00	4.443.217,58
<b>Total</b>			<b>203.952.355,95</b>	<b>266.858.344,26</b>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária – Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora – UG.

Em relação aos créditos orçamentários iniciais consignados no Grupo 4 nas fontes desvinculadas (100 e 161), estes totalizaram R\$ 20.797.376,00, ou seja, 4,46% desse grupo de despesas. E, com base no modo Unidade Gestora, após acréscimos/reduções/descentralizações, os recursos desvinculados resultaram em Despesa Autorizada na ordem de R\$ 61.105.049,00 (fontes 100, 161, 183, 168 e 169), dos quais R\$ 42.633.686,63 foram liquidados, o que representa aproximadamente 69,77% dos créditos utilizados.

Quanto à aplicação dos recursos do Grupo de Despesas 4, ressalta-se o aporte orçamentário utilizado para a liquidação de despesas relativas às Subfunções 451 – Infraestrutura Urbana e 782 – Transporte Rodoviário:

Subfunção	Valor Liquidado (R\$)	Obras Principais
451 – Infraestrutura Urbana	189.647.362,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urbanização Sol Nascente.</li> <li>- Urbanização Vicente Pires.</li> <li>- Requalificação Urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF SUL.</li> <li>- Restauração do pavimento da Avenida W3 Sul.</li> <li>- Duplicação da Via de Ligação Guará – Núcleo Bandeirante.</li> <li>- Urbanização Bernardo Sayão.</li> <li>- Requalificação da Praça do Relógio em Taguatinga.</li> <li>- Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF.</li> </ul>
782 – Transporte Rodoviário	121.246.051,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervenções integrantes do Corredor de Transporte Eixo Oeste:</li> <li>- Readequação da Rodovia DF-011 – EPIG.</li> <li>- Reformulação do sistema viário na ESPM.</li> <li>- Acesso ao Terminal Asa Sul – TAS.</li> <li>- Requalificação da Etapa 2 da Avenida Hélio Prates e</li> <li>- Túnel de Taguatinga (sistema de automação, controle e transmissão de dados, reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial, calçadas e rampas de acessibilidade, na Avenida Central e Boulevard).</li> </ul>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária – Gerencial (Por Subfunção, Categoria e Programa de Trabalho), por Unidade Gestora – UG.

No que se refere às alocações iniciais do Grupo de Despesas 3 – Outras Despesas Correntes, estas corresponderam a R\$ 308.425.731,00, cabendo destacar a consignação orçamentária de R\$ 273.525.855,00 relativa à fonte de recursos 134 – Contribuição para Iluminação Pública – CIP, consistindo de 88% dos créditos alocados nesta categoria de gasto, cuja execução orçamentária aponta o total de R\$ 206.811.479,43 de recursos liquidados ao longo do exercício.

Quanto as fontes desvinculadas (100 e 161), pertencentes ao Grupo 3, estas apresentaram alocações iniciais no montante de R\$ 20.388.139,00, equivalente a 6,61%, e, levando-se em conta o modo Unidade Gestora, após acréscimos/reduções/descentralizações, os recursos desvinculados do Grupo 3 resultaram em Despesa Autorizada na ordem de R\$ 81.723.205,00 (fontes 100, 161 e 183), sendo liquidados R\$ 46.029.174,46, aproximadamente 56%.

No que tange à aplicação dos recursos do Grupo de Despesas 3, os aportes orçamentários mais relevantes foram efetivados na liquidação de despesas relativas às Subfunções 752 – Energia Elétrica e 451 – Infraestrutura Urbana:

Subfunção	Valor Liquidado (R\$)	Serviços Principais
752 – Energia Elétrica	240.767.135,94	- Fornecimento de energia elétrica para o Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal. - Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal.
451 – Infraestrutura Urbana	8.236.954,35	- Serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga/DF. - Supervisão das Obras de Readequação da Rodovia DF-011 – EPIG. - Prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK).

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária – Gerencial (Por Subfunção, Categoria e Programa de Trabalho), por Unidade Gestora – UG.

Com referência às despesas principais do Grupo 3, os custos de manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal alcançaram o montante de R\$ 240.767.135,94, sendo: R\$ 178.659.850,56, destinados ao gastos com os serviços de fornecimento de energia elétrica e a utilização de postes para uso exclusivo do Sistema de Iluminação Pública do DF, prestados por intermédio do Contrato nº 6/2023 e R\$ 62.107.285,38, referentes aos serviços de manutenção, compreendendo: gestão dos serviços, consultoria técnica-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, objeto dos Contratos nº 4/2018 e nº 1/2024 - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública do Distrito Federal, conforme dados constantes do Quadro 03:

**Quadro 03 – Custos mensais referentes às despesas com o Parque de Iluminação Pública do DF:**

Competência da Despesa (mês/ano)	CT 004/2018 - Manutenção de Iluminação Pública (R\$)	CT 006/2023 - Fornecimento de Energia Elétrica (R\$)	CT 1/2024 - Contrato de Concessão (R\$)	Total (R\$)
Exercício de 2020 (*)	1.262.826,24	0,00	0,00	1.262.826,24
Dezembro/2023 (*)	5.350.566,04	18.568.501,45	0,00	23.919.067,49
Janeiro/2024	2.923.842,34	15.818.050,65	0,00	18.741.892,99
Fevereiro/2024	4.694.932,47	16.221.197,65	0,00	20.916.130,12
Março/2024	7.796.363,59	15.853.240,63	1.078.727,30	24.728.331,52
Abril/2024	0,00	13.220.195,00	4.777.220,89	17.997.415,89
Maió/2024	0,00	14.056.743,16	4.777.220,89	18.833.964,05
Junho/2024	0,00	13.373.132,96	4.777.220,89	18.150.353,85
Julho/2024	0,00	13.967.428,25	4.928.276,62	18.895.704,87
Agosto/2024	0,00	13.398.760,31	4.928.276,62	18.327.036,93
Setembro/2024	0,00	14.671.738,41	4.866.239,57	19.537.977,98
Outubro/2024	0,00	16.086.608,76	4.972.785,96	21.059.394,72
Novembro/2024	0,00	13.424.253,33	4.972.785,96	18.397.039,29
Dezembro/2024 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.028.530,68</b>	<b>178.659.850,56</b>	<b>40.078.754,70</b>	<b>240.767.135,94</b>

(\*) Houve liquidação de despesas de exercícios anteriores mediante reconhecimento de dívida do CT nº 4/2018 (exercício de 2020) e do CT nº 6/2023 (exercício de 2023).

(\*\*) As despesas do mês de dezembro/2024 serão liquidadas em 2025 com a utilização de saldo de empenho inscrito em Restos a Pagar Não Processados.

Fonte: Dados extraídos de medições compatibilizados com liquidações constadas no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo.

As consignações provenientes de Emendas Parlamentares Distritais constam no Quadro 04 abaixo, que evidencia que estas alocações equivaleram, após anulações/acrécimos/descentralizações, a R\$ 9.155.000,00, sendo empenhados R\$ 7.055.000,00 para custear as ações definidas pelos parlamentares, autores desses créditos, dos quais R\$ 1.000.000,00 foram descentralizados por esta Secretaria para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap e R\$ 2.000.000,00 foram obtidos mediante descentralizações recebidas das Administrações Regionais do Gama, de Planaltina e do Recanto das Emas. Salienta-se que a maior parte dos créditos oriundos de emendas parlamentares foi destinada à ampliação de iluminação pública no Distrito Federal, o que requereu proceder apostilamento ao Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública do Distrito Federal, por intermédio do qual foram programadas as execuções das intervenções indicadas pelos Parlamentares.

**Quadro 04 – Emendas Parlamentares Distritais:**

Programa de Trabalho	Autoria da Emenda Parlamentar	Finalidade	Valor total que restou consignado	Valor mantido bloqueado	Valor Empenhado	Valor Disponível	Observação
15.451.6209.1836.0014 - (EPI) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - 2024 - Distrito Federal.	Robério Negreiros	Ampliação de Iluminação Pública na Via principal entre a QNQ e o Sol Nascente, Trecho 3, Região Administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol.	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	-
15.451.6208.1968.0019 - (EPI) Elaboração de Projetos - de Drenagem, Urbanização e Infraestrutura no Setor de Mansões - Sobradinho II.	Ricardo Vale	Elaboração de projetos de drenagem, urbanização e infraestrutura no Setor de Mansões Sobradinho II.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	De acordo com a Seobras/SODF, devido à constatação de óbices técnicos não foi possível dar seguimento à programação de certame.

3	15.752.6209.1836.0012 - (EPI) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública em prol da Comunidade do Distrito Federal.	Eduardo Pedrosa	Implantação de Iluminação Pública no Núcleo Rural Olhos D'água, Região Administrativa do Gama.			430.000,00	0,00	
			Implantação de Iluminação Pública nas seguintes localidades: - Campo Sintético da QS 20 do Riacho Fundo II - (R\$ 140.000,00); - Rua da Rádio CAUB II até CAUB I - (R\$ 340.000,00); e - Quadra 216 Sul - Asa Sul - (R\$ 200.000,00).	1.110.000,00	0,00	680.000,00	0,00	-
4	15.752.6209.1836.0125 - (EPI) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - Distrito Federal.	Hermeto	Implantação de Iluminação Pública na Via NB-01, trecho entre a EPNB até a Av. Contorno, na ponte entre a Vila Cauhy e Núcleo Bandeirante, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante e no viaduto sobre a EPIA Sul, trecho do Setor de postos e motéis, Região Administrativa da Candangolândia.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-
5	15.752.6209.3205.0003 - (EPI) Remanejamento de Rede - Readequação/Implantação de Infraestrutura de Energia Elétrica - Distrito Federal.	Pastor Daniel de Castro	Execução de obra de infraestrutura urbana de Implantação de rede elétrica de média e baixa tensão e mitigação de riscos na Rua 1 e na Rua principal do Assentamento 26 de Setembro, objeto do Pregão Eletrônico nº 027/2024 - DECOMP/DA.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Intervenção contratada (CT nº 013/2024 - SODF). Valor Total do contrato: R\$ 2.220.000,00.
6	15.752.6209.8507.6586 - (EPI) Apoio a Manutenção e Eficientização do Sistema de Iluminação Pública.	Wellington Luiz	Não houve indicação de finalidade dos recursos por parte do parlamentar.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Não houve emissão de Ofício Eletrônico pelo Sisconep com requisição de desbloqueio de créditos.
7	15.812.6209.1079.0013 - (EPI) Construção de Espaços Esportivos - Distrito Federal.	Chico Vigilante	Construção de campos de grama sintética: na QNP 36, do Setor P Sul (R\$ 400.000,00), e na EQNN 01/03 da Ceilândia Sul (R\$ 600.000,00).	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Recursos descentralizados à Novacap, mediante a Portaria Conjunta nº 08, de 27/11/2024 (DODF nº 228, de 29/11/2024).
8	25.752.6209.1836.0124 - (EPI) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - Praça da Quadra 103, Residencial Oeste, São Sebastião - Distrito Federal.	Rogério Morro da Cruz	Iluminação Pública na praça da Quadra 103, Residencial Oeste, São Sebastião.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-
9	25.752.6209.1836.7108 - (EPI) Ampliação da Iluminação Pública - Ponte Alta Norte/Casa Grande e Regiões - RA-II (Gama).	Rogério Morro da Cruz	Implantação de Iluminação Pública na Rua das Hortênsias, Rua MA 05, Rua sábia, Rua MA 08 e Ruas MA 15 e 1, na Ponte Alta Norte/Casa Grande.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Recursos obtidos mediante descentralização da Administração Regional do Gama (Portaria Conjunta nº 1, de 13/09/2024).

10	15.752.6209.1836.7109 - (EPI) Promover Iluminação Pública e Rede de Energia Elétrica - Planaltina - DF.	Pepa	Implantação da Rede de Iluminação Pública no Bairro Total Ville.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Recursos obtidos mediante descentralização da Administração Regional de Planaltina (Portaria Conjunta nº 01, de 16/10/2024).
11	25.752.6209.1836.7114 - (EPI) Ampliação de Pontos de Iluminação Pública em Água Quente - RA - XXXV.	Jorge Vianna	Implantação de Iluminação Pública no Residencial Dom Francisco, Região Administrativa de Água Quente - RA/AQ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Recursos obtidos mediante descentralização da Administração Regional do Recanto das Emas (Portaria Conjunta nº 121, de 24/06/2024).
<b>Total</b>				<b>9.155.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo Web/Módulo AFC - Administração Financeira e Contábil/Orçamentário/02 - QDD por UG/Gestão/190.101 - SODF.

Relativamente às descentralizações orçamentárias formalizadas ao longo do exercício financeiro de 2024, o Quadro 05, indica o montante de R\$ 20.367.169,83 descentralizados por esta Secretaria, sendo R\$ 20.355.569,19 transferidos para a gestão da Novacap, R\$ 11.600,64 para a gestão do DER/DF e o montante de R\$ 19.488.226,28, descentralizados a esta SODF, dos quais R\$ 17.164.226,28 são procedentes do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e R\$ 2.324.000,00, das Administrações Regionais: da Fercal, do Gama, de Planaltina e do Recanto das Emas.

**Quadro 05 - Descentralizações de Créditos Orçamentários 2024 - SODF (Concedidas e Recebidas)**

Descentralizações Concedidas (SODF para outros Órgãos)							
Unidade Gestora Executante - UGE (destinatário do crédito)	Portaria Conjunta	Finalidade	Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	ND	Valor (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF. (UO 200.202)	nº 03, de 26.07.2024 (DODF nº 143, de 29.07.2024)	Despesas de passagens aéreas nacionais para os servidores da SODF, referente ao Congresso 26º ENACOR - Encontro Nacional de Conservação Rodoviária.	04.122.8209.8517.0091	100	33.90.93	11.600,64	11.600,64
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap. (UO 22.201)	nº 04, de 05.08.2024 (DODF nº 149, de 06.08.2024)	Aquisição de materiais, fornecimento de mistura asfáltica, implantação de estacionamento no SIA e recomposição paisagística do viaduto da EPIG/Parque da Cidade.	15.451.6209.1110.0147	183	33.90.30 44.90.51	9.927.381,78	9.597.477,31
	nº 06, de 04.10.2024 (DODF nº 194, de 09.10.2024)	Aquisição de materiais, fornecimento de mistura asfáltica, implantação de paisagismo, implantação de meios-fios e implantação de calçadas (ciclovias), a serem aplicados pela Novacap em obras pontuais de infraestrutura urbana no DF.	15.451.6209.1110.0147	183/120	33.90.30 44.90.51	5.780.000,00	5.780.000,00
	nº 07, de 11.11.2024 (DODF nº 219, de 14.11.2024)	Aquisição de materiais/insumos diversos a serem aplicados pela Novacap em obras pontuais de infraestrutura urbana no Distrito Federal.	15.451.6209.1110.0147	100	33.90.30	2.500.000,00	2.500.000,00
	nº 08, de 27.11.2024 (DODF nº 228, de 29.11.2024)	Construção de campos de grama sintética na EQNN 01/03 da Ceilândia Sul e na QNP 36 do P Sul. Obs.: (créditos orçamentários oriundos de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Distrital Chico Vigilante).	15.812.6206.1079.0013	100	44.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00

	nº 09, de 28.11.2024 (DODF nº 229, de 02.12.2024)	Implantação de arborização, gramado e paisagismo em toda a extensão do viaduto e trincheira na entrada do Riacho Fundo I, na Rodovia DF-075 (EPNB) - trecho entre a DF-079 e a DF-001 (EPCT) - Pistão Sul.	15.451.6209.1110.0147	100	44.90.51	1.148.187,41	1.148.187,41	
<b>Total</b>						<b>20.367.169,83</b>	<b>20.037.265,36</b>	
Descentralizações recebidas de outros Órgãos								
Unidade Gestora Concedente do Crédito - UGC	Portaria Conjunta	Finalidade	Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	ND	Valor (R\$)	Valor Empenhado(R\$)	
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - Fundurb. (UO 28.901)	nº 01, de 17.01.2024 (DODF nº 15, de 22.01.2024)	Requalificação da Praça do Relógio (CT nº 31/2023 e CT nº 32/2023).	15.451.6208.3089.0001	169	44.90.51	100.000,00	100.000,00	
	nº 02, de 17.01.2024 (DODF nº 15, de 22.01.2024)	Requalificação urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF - (CT nº 20/2022).	15.451.6208.3089.0001	169	44.90.51	250.000,00	250.000,00	
	nº 03, de 12.03.2024 (DODF nº 52, de 15.03.2024)	Requalificação urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF - (CT nº 20/2022).	15.451.6208.3089.0001	169	44.90.51	702.394,54	702.394,54	
	nº 04, de 12.03.2024 (DODF nº 52, de 15.03.2024)	Requalificação da Praça do Relógio (CT nº 31/2023 e CT nº 32/2023).	15.451.6208.3089.0001	169	44.90.51	5.461.831,74	5.423.097,17	
	nº 06, de 28.08.2024 (DODF nº 103, de 03.06.2024)	Readequação viária da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG - (CT nº 21/2022).	15.451.6208.3089.0001	183	44.90.51	5.000.000,00	5.000.000,00	
	nº 07, de 10.09.2024 (DODF nº 175, de 12.09.2024)	Infraestrutura Urbana Remanescentes no Trecho 01 e Parte do Trecho 03 do Sol Nascente - (CT nº 17/2022).	15.451.6208.3089.0001	168	44.90.51	3.000.000,00	3.000.000,00	
	nº 08, de 10.09.2024 (DODF nº 175, de 12.09.2024)	Revitalização da Praça 21 de Abril, localizada no SHIGS 707/708 - RA-I.	15.451.6208.3089.0001	168	44.90.51	50.000,00	0,00	
Administração Regional do Recanto das Emas (UO 09.117)	nº 01, de 24.06.2024 (DODF nº 121, de 27.06.2024)	Readequação viária da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG - (CT nº 21/2022).	15.451.6208.3089.0001	168 169 183	44.90.51	2.600.000,00	2.600.000,00	
	nº 01, de 24.06.2024 (DODF nº 121, de 27.06.2024)	Ampliação de pontos de iluminação pública na Região Administrativa de Água Quente (Residenciais Rócio, Nova Betânia II, Dom Francisco, Galiléia I, São Jorge, Antiga Chácara 10 no Galiléia, em toda extensão da DF 280, passando pela Mansão Vila Verde).	25.752.6209.1836.7114	EPI - Deputado Jorge Viana	100	44.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00
	nº 01, de 13.09.2024 (DODF nº 182, de 23.09.2024)	Ampliação da Iluminação Pública em Ponte Alta Norte/Casa Grande, na Região Administrativa do Gama.	25.752.6209.1836.7108	EPI - Rogério Morro da Cruz.	100	44.90.51	500.000,00	500.000,00
	nº 02, de 15.10.2024 (DODF nº 201, de 18.10.2024)	Expansão e Melhoria de Iluminação Pública na Região Administrativa da Fercal.	15.752.6209.1836.0003		100	44.90.51	324.000,00	324.000,00
Administração Regional de Planaltina (UO 09.108)	nº 01, de 16.10.2024 (DODF nº 204, de 23.10.2024)	Iluminação Pública e rede de energia elétrica na Região Administrativa de Planaltina.	15.752.6209.1836.7109	EPI - Pedro Paulo de Oliveira - Pepa	100	44.90.51	500.000,00	500.000,00
<b>Total</b>						<b>19.488.226,28</b>	<b>19.399.491,71</b>	

Fontes: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo Web/Módulo AFC - Administração Financeira e Contábil/Orçamentário; QDD por UG/Gestão/200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF, página 1; QDD por UG/Gestão/190.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, páginas 18 e 28; QDD por UG/Gestão/190.101 - Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, páginas 3, 7 e 10.

Cumpra registrar, conforme demonstrado no Quadro 06, a seguir, que, em 2024 ocorreram diversos cancelamentos de créditos orçamentários então alocados nesta Secretaria, no montante aproximado de R\$ 33.000.000,00, que restaram remanejados para sanar déficits de outros Órgãos do Governo do Distrito Federal:

**Quadro 06 – Perdas Orçamentárias**

Mês	Instrumento Legal	Valor (R\$)	Fonte/ID	Finalidade
FEV	Decreto nº 45.515, de 21/02/2024 (DODF Edição Extra nº 13-B, de 21/02/2024). (Republicado no DODF Edição Extra nº 104-A, de 31/12/2024)	541.285,00	161/0	Execução dos Serviços de Sinalização viária no emboque e desemboque do Túnel de Taguatinga. (00110-00003403/2023-21).
ABR	Decreto nº 45.665, de 03/04/2024 (DODF nº 64, DE 04/04/2024).	1.500.000,00	161/0	Recursos destinados à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.
JUL	Decreto nº 46.046, de 19/07/2024 (DODF nº 138, de 22/07/2024).	5.000.000,00	161/0	Recursos destinados à Novacap para aquisição de misturas asfálticas e elementos pré-moldados em concreto (drenagem pluvial DF).
AGO	Decreto nº 46.095, de 02/08/2024 (DODF nº 148, de 05/08/2024).	950.000,00	183/0	Recursos destinados à Novacap para execução de obras/serviços contratados por aquela Companhia.
NOV	Decreto nº 46.558, de 22/11/2024 (DODF nº 224, de 25/11/2024).	2.800.000,00	100/0	Atender demandas pontuais do DER/DF.
	Decreto nº 46.575, de 27/11/2024 (DODF nº 227, de 28/11/2024).	181.639,00	100/3 100/0	Necessidade de recomposição de parcelamento da Dívida Pública do Distrito Federal para 2024.
	Decreto nº 46.583, de 28/11/2024 (DODF nº 228, de 29/11/2024).	69.522,00	100/0	Custear despesas com pagamento de obrigações patronais das folhas de pagamento, nos meses de novembro e dezembro de 2024 da Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB.
	Decreto nº 46.596, de 29/11/2024 (DODF Edição Extra nº 90-A, de 02/12/2024).	484.914,00	100/0	Atender às demandas do Fundo de Assistência Social do DF.
DEZ	Decreto nº 46.613, de 05/12/2024 (DODF nº 233, de 06/12/2024).	310.000,00	100/0	Realização do projeto super copa Brasil de Handebol.
	Lei nº 7.604, de 12/12/2024 (DODF Edição Extra nº 94-A, de 12/12/2024).	750.000,00	161/0	Atender demandas do DER/DF.
	Lei nº 7.604, de 12/12/2024 (DODF Edição Extra nº 94-A, de 12/12/2024).	1.500.000,00	100/0	Atender demandas da Novacap, DER/DF e SLU/DF.
	Decreto nº 46.641, de 13/12/2024 (DODF Edição Extra nº 95-A, de 13/12/2024).	338.068,00	183/0 100/0	Viabilizar o pagamento do subsídio mensal ao Plano de Assistência Suplementar à Saúde referente ao percentual de 1,5% folha de pagamento do mês de novembro/2024 - SEEC.
	Decreto nº 46.669, de 23/12/2024 (DODF Edição Extra nº 99-A de 23/12/2024).	12.831.025,00	183/0	Atender contratos vigentes da SEEC. Manutenção de Bens Imóveis do GDF - Vigilância - Distrito Federal.
	Decreto nº 46.694, de 27/12/2024 (DODF Edição Extra nº 102-A, de 27/12/2024).	2.168.975,00	183/0	Atender contratos vigentes da SEEC.
	Decreto nº 46.702, de 27/12/2024 - DODF Edição Extra nº 102-B, de 27/12/2024.	119.029,00	100/0	Atender despesas com o encerramento de exercício.
	Decreto nº 46.691, de 27/12/2024 - DODF Edição Extra nº 102-A, de 27/12/2024.	2.438.000,00	183/0	Atender demandas pontuais do DER/DF.
Decreto nº 46.709, de 30/12/2024 - DODF Edição Extra nº 103-A, de 30/12/2024.	207.539,00	100/0	Recomposição de parcelamento da Dívida Pública do Distrito Federal para 2024.	
<b>Total</b>		<b>32.189.996,00</b>		

Por fim, verifica-se no Quadro 07, que apresenta o detalhamento da execução orçamentária e financeira por Grupo de Despesas e por Fontes de Recursos, que do total empenhado de R\$ 649.401.149,27 houve a liquidação de 91%, ou seja R\$ 591.223.326,84, sendo relevante como citado anteriormente no Grupo 4 – Investimentos, o desempenho orçamentário das fontes de recursos 135/335 – Operações de Crédito Internas (R\$ 236.386.686,36) e no Grupo 3 – Outras Despesas Correntes, as Fontes de Recursos 134 relativa à Contribuição para Iluminação Pública – CIP (R\$ 206.811.479,43) e 183 referente à Desvinculação da Receita do DF - EC 93/2016 (R\$ 33.955.656,51), utilizadas para custear a manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal.


**Quadro 07 - Execução Orçamentária e Financeira - 2024 (Por Categoria e Fontes de Recursos):**

Grupo de Despesas	Dotação Inicial	DESPESAS CORRENTES			Percentual Aproximado (%)	
		Despesa			Liquidadado/ Empenhado	Liquidadado/ Autorizado
		Autorizada	Empenhada	Liquidada		
<b>1. Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>24.765.975,00</b>	<b>25.784.498,00</b>	<b>25.343.283,47</b>	<b>25.112.133,47</b>	<b>99,09%</b>	<b>97,39%</b>
Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado	24.765.975,00	25.784.498,00	25.343.283,47	25.112.133,47	99,09%	97,39%
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>	<b>308.425.731,00</b>	<b>310.049.052,00</b>	<b>278.133.385,32</b>	<b>253.315.937,61</b>	<b>91,08%</b>	<b>81,70%</b>
Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado	14.229.739,00	15.906.308,00	10.776.498,33	8.952.005,96	83,07%	56,28%
Fonte 111 - Taxa de Expediente	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 120 - Diretamente Arrecadados	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 131 - Convênios com Órgãos do GDF	0,00	140.038,00	140.037,51	140.037,51	100,00%	100,00%



Fonte 134 - Contribuição para Iluminação Pública - CIP	273.525.855,00	212.775.967,00	212.727.713,73	206.811.479,43	97,22%	97,20%
Fonte 135 - Operações de Crédito Internas	0,00	898.105,00	505.246,11	335.246,21	66,35%	37,33%
Fonte 136 - Operações de Crédito Externas	14.496.080,00	14.496.080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 161 - Recursos de Dividendos	6.158.400,00	5.009.159,00	4.893.379,49	3.121.511,99	63,79%	62,32%
Fonte 183 - Desvinculação da Receita do DF - EC 93/2016	0,00	60.807.738,00	49.090.510,15	33.955.656,51	69,17%	55,84%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Grupo de Despesas	Dotação Inicial	Despesa			Percentual Aproximado (%)	
		Autorizada	Empenhada	Liquidada	Liquidado/Empenhado	Liquidado/Autorizado
<b>4. Investimentos</b>	<b>465.894.224,00</b>	<b>618.376.437,00</b>	<b>345.924.480,48</b>	<b>312.795.255,76</b>	<b>90,42%</b>	<b>50,58%</b>
Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado	6.955.776,00	27.925.001,00	26.516.872,27	19.475.590,29	73,45%	69,74%
Fonte 120 - Diretamente Arrecadados	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 131 - Convênios com Órgãos do GDF	50.586.140,00	50.446.102,00	29.256.201,98	24.665.514,97	84,31%	48,89%
Fonte 134 - Contribuição para Iluminação Pública - CIP	14.000.000,00	363.612,00	363.611,33	69.322,05	19,06%	19,06%
Fonte 135 - Operações de Crédito Internas	279.625.288,00	278.727.183,00	139.275.473,46	130.561.701,16	93,74%	46,84%
Fonte 136 - Operações de Crédito Externas	63.760.420,00	63.760.420,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 161 - Recursos de Dividendos	13.841.600,00	7.199.556,00	7.105.552,79	6.284.038,10	88,44%	87,28%
Fonte 168 - Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODIR	0,00	4.487.281,00	4.437.281,00	4.329.539,94	97,57%	96,48%
Fonte 169 - Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT	0,00	6.397.899,00	5.545.368,71	4.678.389,79	84,37%	73,12%
Fonte 183 - Desvinculação da Receita do DF - EC 93/2016	0,00	15.095.312,00	8.569.741,80	7.866.128,51	91,79%	52,11%
Fonte 321 - Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	1.362.926,00	1.362.925,35	1.362.925,35	100,00%	100,00%
Fonte 335 - Operações de Crédito Internas	0,00	121.452.241,00	110.009.275,04	105.824.985,20	96,20%	87,13%
Fonte 390 - Contrapartida de Convênio - Tesouro	0,00	3.233.904,00	3.233.902,82	3.233.902,82	100,00%	100,00%
Fonte 732 - Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	37.125.000,00	37.125.000,00	10.248.273,93	4.443.217,58	43,36%	11,97%
<b>Total: Grupos 1, 3 e 4</b>	<b>799.085.930,00</b>	<b>954.209.987,00</b>	<b>649.401.149,27</b>	<b>591.223.326,84</b>	<b>91,04%</b>	<b>61,96%</b>

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG

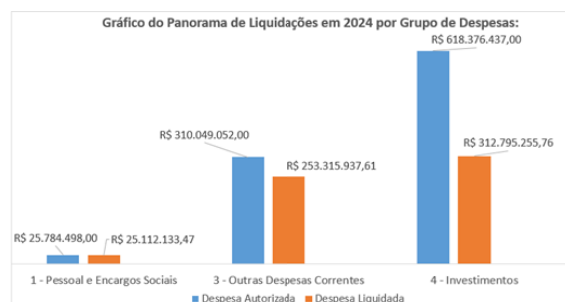

Em síntese, ao se comparar o percentual da Despesa Liquidada perante a Despesa Autorizada, a execução orçamentária de 2024 desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura transcorreu positivamente, mesmo em relação ao Grupo 4 – Investimentos, que obteve o menor percentual de execução, uma vez que, igualmente aos últimos exercícios financeiros, o resultado deste grupo de despesas tem sido bastante impactado pela perspectiva e a efetiva execução de intervenções previstas em operações de crédito, contratos de repasse e convênios.

#### **4.2 Diagnóstico da Unidade:**

Em 2024, com a designação de novo titular, esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal identificou a necessidade de ajustes na estrutura administrativa, com o objetivo de promover o fortalecimento institucional, sendo criadas as Secretarias Executivas de Gestão Administrativa e Estratégica e de Obras e Infraestrutura.

Já se observa que a alteração na estrutura tem contribuído para uma dinâmica institucional mais eficiente e tecnicamente mais adequada, impactando no aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas.

Esta nova gestão tem buscado priorizar a conclusão de importantes obras de infraestrutura, constatando-se em 2024 avanços consideráveis nas intervenções conduzidas por esta Secretaria:

- Intervenções Concluídas:

- Infraestrutura em Vicente Pires (Lote 10) - Contrato nº 21/2016;
- Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 04 - Contrato nº 28/2022;
- Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Contrato nº 20/2022;
- Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante no emboque do túnel de Taguatinga - Contrato nº 7/2023;
- Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste - Contrato nº 11/2023;
- Execução de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 18/2023;
- Reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 24/2023;
- Construção de Campo de Futebol Society de grama sintética no Pôr do Sol - Contrato nº 28/2023.

- Principais contratações de obras e serviços que terão prosseguimento em 2025:

- Infraestrutura em Vicente Pires - Contrato nº 19/2021;
- Implantação de Obra de Arte Especial - OAE 3 - Vicente Pires - Contrato nº 14/2023;
- Infraestrutura em Vicente Pires (intitulado Lote 2) - Contrato nº 29/2023;
- Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 1 e parte 3 - Contrato nº 17/2022;
- Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 1 - Contrato nº 22/2022;
- Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 2 - Contrato nº 23/2022;
- Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4 - Contrato nº 1/2023;
- Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 1 - Contrato nº 5/2023;
- Reformulação do Sistema Viário ESPM - Contrato nº 22/2021;
- Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022;
- Readequação da EPIG - Contrato nº 21/2022;
- Instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 15/2023;
- Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 30/2023;
- Pavimento rígido na W 3 Sul - Contrato nº 16/2022;
- Requalificação do SOF Sul - Contrato nº 24/2022;
- Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante - Contrato nº 23/2023;
- Requalificação da Praça do Relógio - Lote 1 - Contrato nº 31/2023;
- Requalificação da Praça do Relógio - Lote 2 - Contrato nº 32/2023;
- Infraestrutura para implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS - Contrato nº 2/2024;
- Restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3A e 12 da rodovia D F-009, Lago Norte - Contrato nº 9/2024;
- Infraestrutura urbana de implantação de rede elétrica no assentamento 26 de setembro - Contrato nº 13/2024;
- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Mestre D'Armas - Contrato nº 21/2021;
- Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 1 - Contrato nº 3/2022;
- Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 2 - Contrato nº 4/2022; e
- Elaboração/readequação de projeto executivo de infraestrutura urbana no Pôr do Sol - Contrato nº 17/2024.

No que concerne à estratégia de governança, esta nova gestão tem como foco agregar as áreas de infraestrutura do Distrito Federal, de forma a privilegiar ações integradas favorecendo um melhor alcance de resultados, com atuação compartilhada, principalmente com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, que desde 23/08/2024, passou a integrar novamente o rol de órgãos vinculados a esta Secretaria.

Cumpre destacar, dentre outras providências e ações em parceria com os órgãos vinculados, as obras diretas executadas em 2024 com a contribuição das equipes da Novacap e do DER/DF, relativas à complementação da Revitalização da Avenida Hélio Prates - Etapa 2 e os serviços de manutenções provisórias destinados a assegurar a trafegabilidade de vias no Sol Nascente, no Pôr do Sol, na Avenida Misericórdia - Vicente Pires, em Arapoanga - Planaltina, no Condomínio Dorothy Stang - Sobradinho e no Assentamento 26 de Setembro.

Essas cooperações entre os órgãos demandaram aportes orçamentários efetivados por esta Secretaria mediante descentralizações de créditos, ou a partir de proposições de remanejamentos ao Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo.

Em relação às ações de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga, é importante ressaltar que, devido às competências exclusivas do DER/DF, que englobam todas as atividades de planejamento, expansão, manutenção, operação, fiscalização e monitoramento do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF), a nova gestão desta Secretaria criou um Grupo de Trabalho Multidisciplinar.

Esse grupo, formado por técnicos do DER/DF e da SODF, teve como objetivo avaliar a viabilidade da transferência da responsabilidade pelos serviços de operação do Túnel de Taguatinga para o DER/DF. Inicialmente, essa responsabilidade foi atribuída à SODF por meio do Decreto nº 44.431, de 17 de abril de 2023, no entanto, após a conclusão dos trabalhos foi editado o Decreto nº 46.415, de 18 de outubro de 2024, cujos efeitos transfere a responsabilidade para o DER. Atualmente, está em andamento o processo de formalização da sub-rogação de contratação afeta aos serviços de operação do Túnel, que ainda permanece sob a titularidade desta Secretaria.

A partir de março de 2024, as ações de manutenção da Iluminação Pública no Distrito Federal passaram a ser realizadas diretamente pela CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. - CEB IPES, conforme o Contrato de Concessão firmado em 2023. Essa operação está em conformidade com a Lei Distrital nº 7.275 e o Decreto Distrital nº 45.033, além de seguir as diretrizes e especificações estabelecidas no contrato e seus anexos. A Secretaria é responsável por realizar os repasses mensais à Concessionária, referentes à contraprestação prevista no contrato. Quanto aos custos mensais relacionados ao fornecimento de energia elétrica para o Parque de Iluminação Pública, esses continuarão sob a gestão da Secretaria, que mantém um contrato vigente com a Neoenergia. Essas medidas visam garantir a eficiência e a continuidade dos serviços de iluminação pública, assegurando que a infraestrutura atenda às necessidades da população.

Igualmente aos últimos exercícios financeiros, esta Secretaria enfrentou novamente restrições quanto aos recursos próprios consignados no Orçamento da Pasta para a programação de novas ações, no entanto, houve o devido aporte necessário, providenciado pela Secretaria de Estado de Economia, para a continuidade das obras e serviços de engenharia a cargo deste órgão, mediante o atendimento de solicitações de incrementos orçamentários pontuais, conforme tratativas ao longo do exercício.

As suplementações orçamentárias obtidas foram direcionadas principalmente para resolver déficits nas alocações iniciais da Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente, que dificultavam o custeio das despesas decorrentes de reajustes relacionados à execução das obras de readequação da Rodovia DF-011 - EPIG e da infraestrutura urbana no Sol Nascente (Trecho 1 e parte do Trecho 3). Além disso, parte dos recursos adicionais foi utilizada para garantir a cobertura orçamentária dos serviços essenciais, incluindo a operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga.

Em 2024, os esforços para apresentar propostas ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Fundurb) foram ampliados, com o intuito de garantir que importantes intervenções em andamento pudessem ser financiadas por esses recursos, especialmente diante das restrições orçamentárias relacionadas aos recursos desvinculados. Essas iniciativas foram bem-sucedidas, conforme as Resoluções nº 1, nº 3 e nº 6/2024, que alocaram recursos para as obras de readequação da Rodovia DF-011 - EPIG e para a infraestrutura urbana no Sol Nascente.

Adicionalmente, a Resolução nº 2/2024 do Fundurb destinou recursos para a licitação das obras de revitalização da Praça 21 de Abril, situada no Plano Piloto. Também foram mantidos os aportes orçamentários previstos em Resoluções vigentes, firmadas no exercício anterior (nº 2 e nº 3/2023), para custear as obras de requalificação da Quadra 5 do Setor Comercial Sul e a revitalização da Praça do Relógio em Taguatinga. Portanto, manteve-se em 2024 a relevante parceria entre esta Secretaria e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), órgão gestor do Fundurb.

Importa registrar o aspecto de estrita continuidade a ser envidado às grandes ações previstas, a serem executadas sob a gestão deste órgão, que em sua maior parte são custeadas a partir de recursos vinculados a operações de crédito, contratos de repasse e convênios.

De outro modo, em relação a esses recursos vinculados, observa-se em 2024 o mesmo crescimento favorável demonstrado nos últimos anos, quanto ao desembolso pelos órgãos financiadores, com respectivo avanço na execução orçamentária, apesar das dificuldades inerentes à implementação das obras previstas nos diversos instrumentos firmados. Entre os desafios, destacam-se, questões de reordenamento territorial, necessidade de atualização de projetos, ajustes nos cronogramas físico-financeiros, regularizações fundiárias e a dependência de decisões de outros órgãos. Um exemplo disso é o atraso recorrente na análise e aprovação de projetos, o que impacta diretamente no ritmo das obras e dificulta a liberação de maiores frentes de serviços, além de outros obstáculos técnicos, que vem sendo constatados.

Toma-se necessário destacar, também que em 2024, houve a conclusão e a assinatura do Contrato de Empréstimo Internacional, firmado no montante de 60 milhões de

dólares americanos, com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata, que visa financiar as ações do denominado Programa INFRA-DF, se tratando de excelente conquista desta Pasta, diante da relevância dos empreendimentos e serviços a serem custeados por esses recursos, que contribuirão para o desenvolvimento da infraestrutura no Distrito Federal, bem como para o fortalecimento institucional desta Secretaria.

Outra iniciativa bastante relevante para esta nova gestão é priorizar ações que promovam a qualidade de vida dos servidores, sendo implementada em 2024 a Política de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) e instituído o Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito desta Secretaria, cabendo destacar a realização de Eventos, de Palestras e da Semana Especial de Comemoração do Dia Servidor, que serão programados anualmente para fortalecer o engajamento e a satisfação no ambiente de trabalho, beneficiando os servidores e colaboradores e contribuindo para um ambiente mais produtivo e harmonioso.

Ainda no aspecto administrativo, não obstante esta Secretaria não disponha de Sede própria, o que demanda constantes ajustes nos espaços físicos para acomodar todos os servidores, ressalta-se os esforços para melhorar a organização do ambiente de trabalho e para a aquisição de equipamentos eletrônicos, visando proporcionar maior conforto e facilitar as atividades diárias das equipes.

Em 2024, a SODF registrou um aumento em seu Quadro Permanente de Pessoal, com a posse de 7 novos servidores da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, além da nomeação de 10 Auditores Fiscais de Atividades Urbanas, ocorrida em 26/12/2024, o que gera expectativa otimista em relação à redução da defasagem de servidores efetivos, que ainda é uma preocupação, uma vez que a força de trabalho do órgão continua dependendo significativamente de servidores comissionados, que não possuem vínculo permanente com a administração pública. Portanto, é fundamental priorizar a reestruturação do quadro permanente de servidores, especialmente por meio das nomeações decorrentes dos concursos vigentes, realizados em 2023, com ênfase na área fim.

Por fim, os resultados positivos alcançados em 2024 refletem o comprometimento da equipe desta Secretaria em expandir as ações da Pasta. Esses esforços visam assegurar à população do Distrito Federal melhorias e inovações na infraestrutura urbana, além de garantir o acesso a serviços públicos de qualidade.

#### **Identificação dos Responsáveis**

##### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: LUCIANA DA SILVA MONTON

Telefone: (61)99967-6100 e-mail de contato: luciana.monton@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

##### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: SILVIA CRISTINA SARDINHA MAIA

Telefone: (61)99553-0360 e-mail de contato: silvia.maia@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

##### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: THAIS FERREIRA SILVA

Telefone: (61)3306-5035 e-mail de contato: thais.silva@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

##### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: MARIA EUNICE DOS SANTOS FREIRE

Telefone: (61)99685-9978 e-mail de contato: maria.freire@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

##### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: VANESSA TRIGO BAPTISTA

Telefone: (61) 9999-48281 e-mail de contato: vanessa.baptista@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

##### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: LEONARDO ALVES SILVA

Telefone: (61)3306-5066 e-mail de contato: leonardo.silva@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Telefone: (61) 3306-5000 e-mail de contato: gabinete@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE

Telefone: (61)3306-6501 e-mail de contato: hildevan.cavalcante@so.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_
